

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

PMBOK 7



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Coordenadora Pedagógica: Élica Lopes

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

250205552011



PATRÍCIA QUINTÃO

Mestre em Engenharia de Sistemas e computação pela COPPE/UFRJ, Especialista em Gerência de Informática e Bacharel em Informática pela UFV. Atualmente é professora no Gran Cursos Online; Analista Legislativo (Área de Governança de TI), na Assembleia Legislativa de MG; Escritora e Personal & Professional Coach. Atua como professora de Cursinhos e Faculdades, na área de Tecnologia da Informação, desde 2008. É membro: da Sociedade Brasileira de Coaching, do PMI, da ISACA, da Comissão de Estudo de Técnicas de Segurança (CE-21:027.00) da ABNT, responsável pela elaboração das normas brasileiras sobre gestão da Segurança da Informação. Autora dos livros: Informática FCC – Questões comentadas e organizadas por assunto, 3ª. edição e 1001 questões comentadas de informática (Cespe/UnB), 2ª. edição, pela Editora Gen/Método. Foi aprovada nos seguintes concursos: Analista Legislativo, na especialidade de Administração de Rede, na Assembleia Legislativa do Estado de MG; Professora titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Professora substituta do DCC da UFJF; Analista de TI/Suporte, PRODABEL; Analista do Ministério Público MG; Analista de Sistemas, DATAPREV, Segurança da Informação; Analista de Sistemas, INFRAERO; Analista – TIC, PRODEMGE; Analista de Sistemas, Prefeitura de Juiz de Fora; Analista de Sistemas, SERPRO; Analista Judiciário (Informática), TRF 2ª Região RJ/ES, etc.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	4
PMBOK 7	5
1. Definição de Projeto.	5
2. Projeto x Operações	7
3. Projetos x Processos	8
4. Projeto x Subprojetos	8
5. Gestão de Programas e Gestão de Portfólio de Projetos	8
6. Padrão de Gerenciamento de Projetos	12
6.1. Introdução	12
6.2. Um Sistema de Entrega de Valor	14
6.3. Princípios do Gerenciamento de Projetos	19
7. Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®).	25
7.1. Introdução	25
7.2. Domínios de Desempenho de Projetos.	26
7.3. <i>Tailoring</i>	45
7.4. Modelos, Métodos e Artefatos	47
8. Patrocinador do Projeto	65
Resumo	66
Questões Comentadas em Aula	69
Exercícios	71
Gabarito	77
Gabarito Comentado.	78
Referências	98

APRESENTAÇÃO

Olá, querido(a) amigo(a), meus cumprimentos!

Sabemos que o seu novo projeto é ousado, muitos são os que desistem e poucos os que confiam no SUCESSO. Todavia, seja **persistente**.

Então, se você **acredita** no sucesso e no resultado, o **sucesso** chegará. Para isso, estude com dedicação, trabalhe duro (quem disse que seria moleza!), faça com direção, foco, siga as dicas que fornecemos durante o curso e, com certeza, terá mais soldados a seu favor e sucesso total nesta batalha que se aproxima.

Rumo então à aula que contempla os principais tópicos relacionados a **gerenciamento de projetos**, com foco no **Guia PMBOK 7ª Edição**.

Um abraço,


PMBOK 7

1. DEFINIÇÃO DE PROJETO

De acordo com o PMBOK (7ª edição), um **projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único.**

A natureza temporária dos projetos indica um início e um fim para o trabalho do projeto ou uma fase do trabalho do projeto. Os projetos podem ser independentes ou fazer parte de um programa ou portfólio.

Esse conceito é bastante cobrado em prova, portanto atenção!

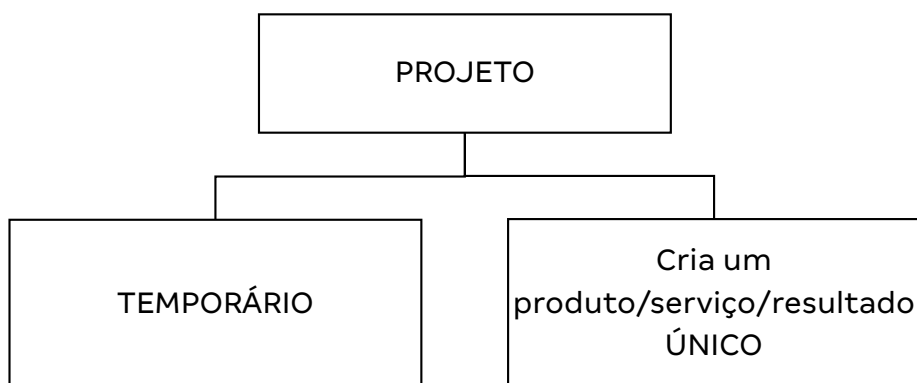

Outro conceito interessante para projeto é o citado por Vargas (2003), que destaca o **projeto** como um **empreendimento ou evento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas, dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade**”.

- Evento **NÃO REPETITIVO**: algo que não faz parte da rotina da empresa. É algo novo para as pessoas que o realizarão. Exemplo: Filme “Tempos Modernos” de Charles Chaplin;
- **SEQUÊNCIA** clara e lógica de **EVENTOS**: é composto de atividades lógicas encadeadas que permitem acompanhamento e controle durante a execução;
- Com **INÍCIO, MEIO e FIM**: possuem um ciclo de vida bem definido (se for uma atividade sem um fim definido, não é um projeto, mas uma rotina de trabalho);
- Atingir um **OBJETIVO** claro e definido: possui metas e resultados a serem atingidos em sua finalização;
- Conduzido por **PESSOAS**: sem o homem não existe projeto;
- Parâmetros pré-definidos de **TEMPO, CUSTO, RECURSOS envolvidos e QUALIDADE**: são restrições de projeto que devem ser identificadas e mapeadas no decorrer do plano de projeto.

O Governo Federal definiu como **projeto** o seguinte conceito:

instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, **limitadas no tempo**, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do Governo (Fonte: Manual de Elaboração do PPA 2008-2011, p. 48, 55).

É importante destacar que, tanto na definição do PMI – Project Management Institute (PMBOK) quanto na do Governo Federal (PPA), a estrutura básica do conceito de projetos relaciona-se com a percepção clara de um **produto a ser entregue (escopo) para um determinado esforço predefinido**.

DIRETO DO CONCURSO


001. (FCC/SABESP/TÉCNICO EM GESTÃO 01/2018) Considerando-se a definição apresentada pelo PMI (Project Management Institute), são atributos de um projeto

- a) o objetivo definido e o uso de vários recursos disponíveis para a sua consecução.
- b) o esforço único e as tarefas dependentes e repetitivas.
- c) a vida finita e a flexibilização dos objetivos em decorrência do andamento do projeto.
- d) a independência de tarefas e a variação do prazo em decorrência da necessidade dos recursos.
- e) o grau de incerteza e o esforço cíclico.



a) Certa. O guia PMBOK define **projeto** como sendo um **esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo**.

Segundo o Project Management Institute (PMI), um projeto tem um **objetivo bem definido**, um resultado ou um produto esperado, e é feito por meio de uma série de tarefas **independentes**, isto é, **não** repetitivas.

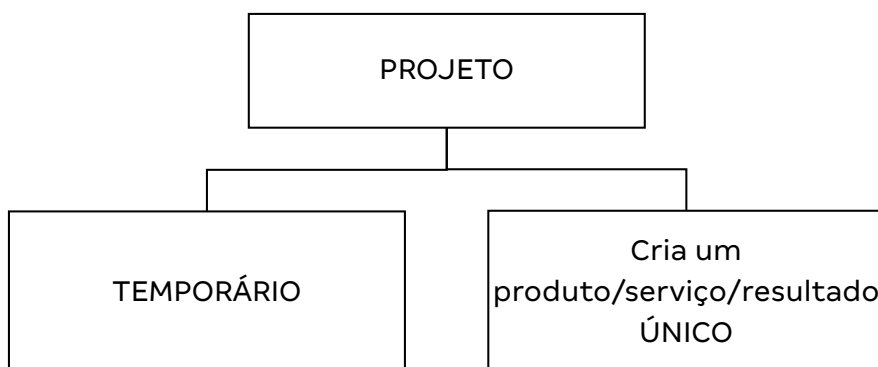

Fonte: Elaboração própria.

Sendo um **esforço**, um projeto **demandar uma série de recursos** para sua consecução. Assim, são **atributos** de um projeto **o objetivo (finalidade específica a ser atingida) definido e o uso de vários recursos disponíveis para a sua consecução**. Os recursos utilizados em um projeto podem ser diversos como pessoas, equipamentos, tempo, recursos monetários, espaço físico etc.

b) Errada. Trata-se de um esforço **TEMPORÁRIO** empreendido para criar um produto, serviço ou resultado **único**. Exemplo: desenvolvimento de um novo modelo de veículo. Nem sempre as tarefas de um projeto são dependentes e repetitivas.

c) Errada. O projeto possui uma vida finita, isso indica que tem **um início e um término definidos**. O término é alcançado quando os objetivos do projeto são atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixar de existir.

Mas, observe que **não deve haver flexibilização** do objetivo ao longo da sua execução. O objetivo deve ser perseguido até o fim do projeto, mesmo que as atividades possam sofrer alguma alteração para alcançar este objetivo.

d) Errada. As tarefas de um projeto nem sempre são independentes e pode haver a necessidade de variação do prazo em decorrência da demanda por recursos.

e) Errada. Espera-se reduzir o grau de incerteza dos projetos. e que se tenha um esforço **temporário** empreendido para criar um produto, serviço ou resultado **exclusivo**.

Letra a.

2. PROJETO X OPERAÇÕES

Um **projeto** é diferente de um trabalho operacional (**Operações**).

- **Operação:** uma função organizacional que realiza a execução **CONTÍNUA** de atividades que produzem o mesmo produto ou fornecem um serviço **repetitivo**. Exemplos: operações de produção, operações de fabricação e operações de contabilidade;

Obs.: Operação:

- Atividade repetitiva, permanente e com o final previsível;
- Realizadas com o propósito de atender necessidades funcionais.

- **Projeto:** um esforço **TEMPORÁRIO** empreendido para criar um produto, serviço ou resultado **exclusivo**. Exemplo: desenvolvimento de um novo modelo de veículo.

3. PROJETOS X PROCESSOS

- Quando uma empresa **faz sempre as mesmas tarefas** (como em uma linha de montagem de automóveis populares) ela está realizando **processos**;
- Quando uma empresa faz sempre **trabalhos diferentes, de acordo com cada pedido** (imagine uma empresa que tenha como atividade montar palco de shows) ela trabalha com **projetos**.

Desse modo, podemos estabelecer que os projetos geram produtos **ÚNICOS** e que, ao final do projeto a atividade da empresa acaba e ela parte para outro projeto, ou seja, vai fazer outro produto.

4. PROJETO X SUBPROJETOS

Os projetos podem ser divididos em **subprojetos**.

Um subprojeto pode ser tratado como um pequeno projeto. São mais facilmente gerenciáveis e estão inter-relacionados ao projeto maior. Essa relação ocorre de maneira que se um subprojeto não for cumprido, ele necessariamente afetará os outros e o projeto como um todo.

EXEMPLOS

Projeto: construção de um complexo hospitalar;

Subprojetos:


- **Construção do Prédio Principal:** inclui atividades como fundação, estrutura, e instalações básicas;
- **Instalação de Equipamentos Médicos:** planejamento e aquisição de máquinas, como aparelhos de raios-X, ressonância magnética etc.;
- **Paisagismo e Áreas Comuns:** criação de jardins, praças e áreas de convivência;
- **Desenvolvimento do Sistema de TI:** implementação de um sistema de gerenciamento hospitalar que integra prontuários e agenda de pacientes. Interdependência: se o subprojeto do sistema de TI atrasar, poderá impactar na capacidade operacional na abertura do hospital.

5. GESTÃO DE PROGRAMAS E GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS

- **Programa** é um **grupo relacionado de projetos, subprogramas e atividades de programa** gerenciados de forma **coordenada** para a obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente (PMBOK 7, 2021);

- Um projeto pode ou não ser parte de um programa, mas um programa **SEMPRE** terá projetos. Exemplo: Programa Fome Zero do Governo Brasileiro; Programa de Combate à AIDS do Governo Brasileiro;


Portfólio, programas e projetos, uma visão do mais abrangente para o mais específico

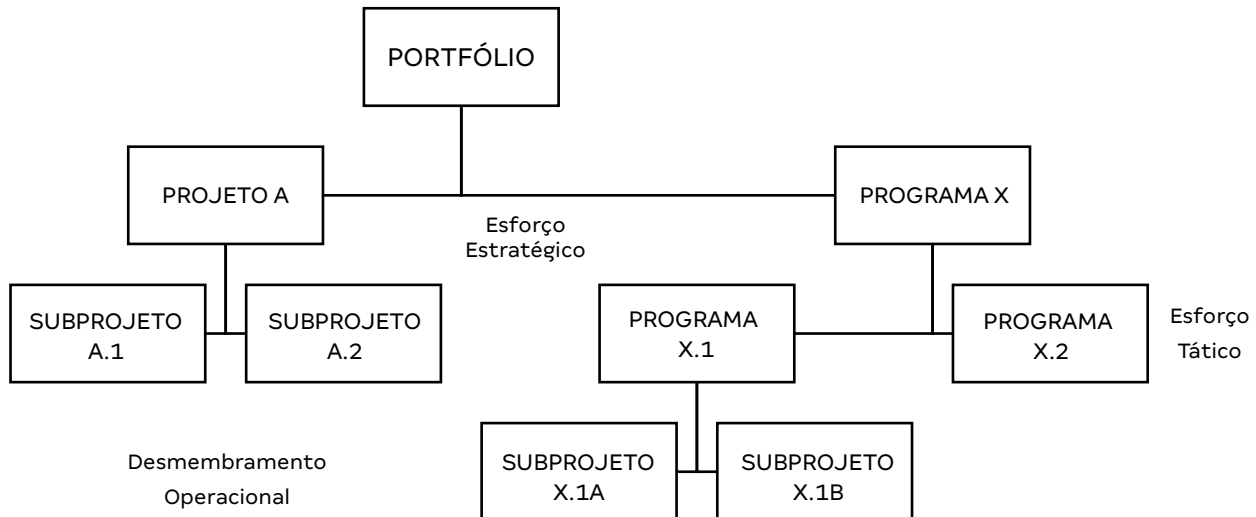

Fonte: EPP (2014).

- Um **portfólio** refere-se a **projetos, programas, subportfólios e operações gerenciadas em grupo para alcançar objetivos estratégicos** (PMBOK 7, 2021).

Portfólio

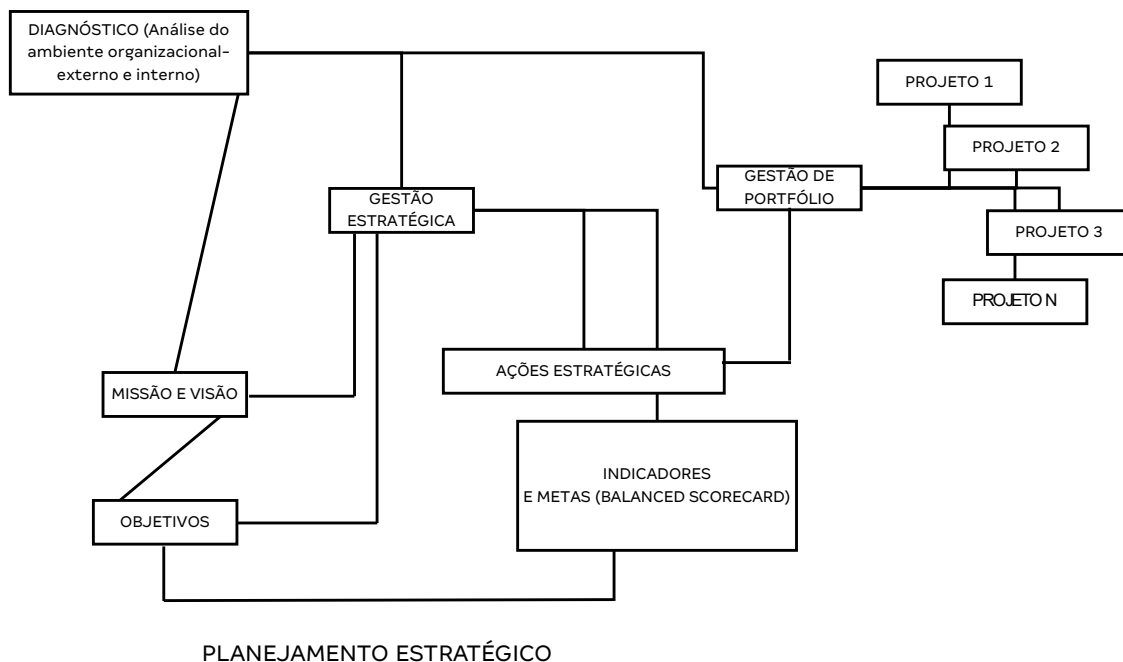

Fonte: EPP (2014).

Segundo PMBOK 7, a natureza temporária dos projetos indica um início e um fim para o trabalho do projeto ou uma fase do trabalho do projeto. Os projetos podem ser independentes ou fazer parte de um programa ou portfólio.

DIRETO DO CONCURSO

- 002.** (CESPE/TRT 7ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2017) Considere que, para atingir os objetivos estratégicos, uma organização desenvolva os seus projetos com base no guia PMBOK. Nesse caso, se o gestor pretende acessar a coleção de projetos do setor de recursos humanos (RH), ele deverá acessar
- a) o sistema de RH.
 - b) o portfólio de projetos.
 - c) os projetos.
 - d) os requisitos do projeto.



Para acessar a coleção de projetos do setor de recursos humanos (RH) dentro do contexto do guia PMBOK, o gestor precisa acessar o portfólio de projetos.

Um **portfólio** refere-se a um **conjunto de projetos ou programas e outros trabalhos, AGRUPADOS para facilitar o gerenciamento eficaz desse trabalho, a fim de atingir os objetivos estratégicos de negócios.**

No contexto do RH, o portfólio incluiria todos os projetos relacionados a esse setor, permitindo uma visão integrada das iniciativas em andamento para atender objetivos estratégicos específicos relacionados ao capital humano.

A opção correta reflete a estrutura de gerenciamento de projetos proposta pelo PMBOK, em que a gestão de portfólios é uma prática crucial para o alinhamento das iniciativas com a estratégia organizacional [Project Management Institute (PMI), 2021].

Letra b.

- 003.** (CESPE/TJ-SE/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2014/ADAPTADA) Com base no disposto no PMBOK (Project Management Body of Knowledge Guide), 7ª edição, julgue o item seguinte.


Os projetos e programas de um portfólio devem ser agrupados a fim de propiciar o alcance dos objetivos estratégicos da organização, por isso, devem estar, necessariamente, diretamente relacionados.



Um **PROGRAMA**, conforme visto, é definido como **um grupo de projetos**, subprogramas e atividades de programa **relacionados, GERENCIADOS DE MODO COORDENADO**, visando à obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente.

Um projeto pode ou não ser parte de um programa, mas um programa SEMPRE terá projetos. Exemplo: Programa Fome Zero do Governo Brasileiro; Programa de Combate à AIDS do Governo Brasileiro.


Portfólio, programas e projetos, uma visão do mais abrangente para o mais específico

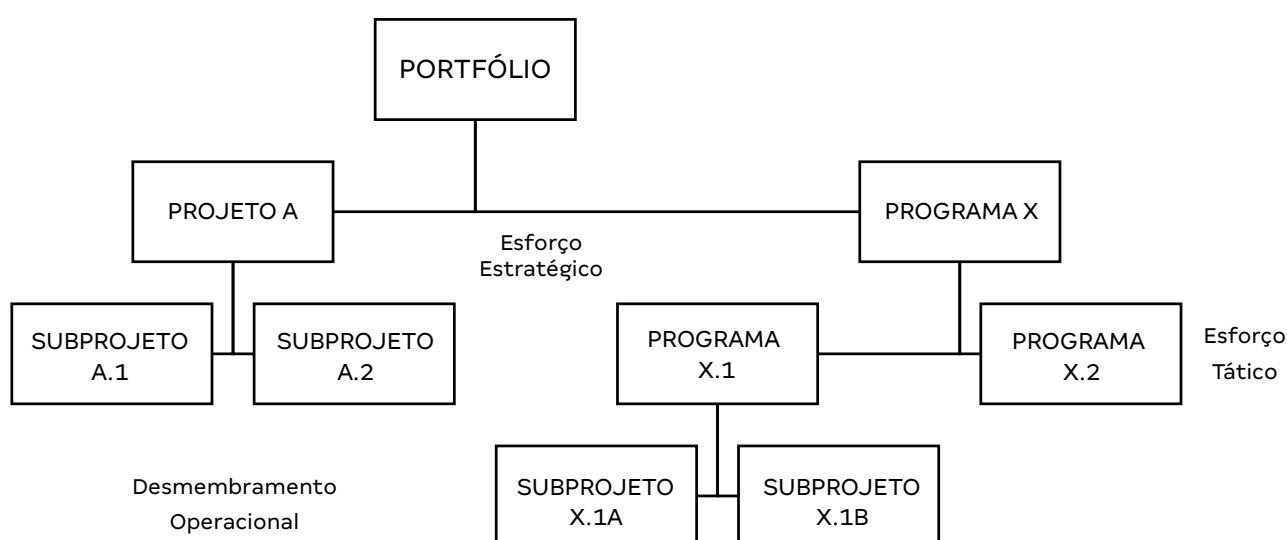

Fonte: EPP (2014).

Um **PORTFÓLIO** refere-se a um **conjunto de projetos ou programas e outros trabalhos, AGRUPADOS** para facilitar o gerenciamento eficaz desse trabalho, a fim de atingir os **objetivos estratégicos de negócios**.

Portfólio

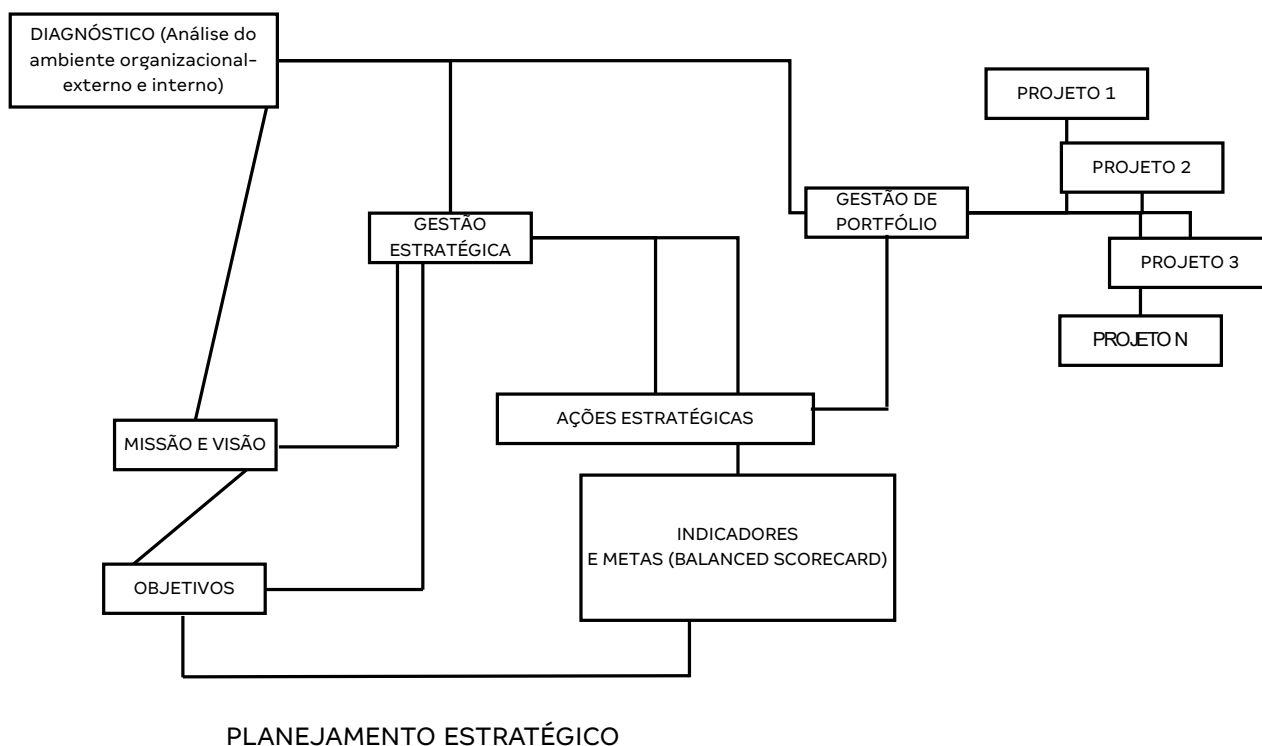

Fonte: EPP (2014).

Os projetos ou programas do portfólio podem **NÃO** ser necessariamente **INTERDEPENDENTES OU DIRETAMENTE RELACIONADOS**, e a assertiva é falsa!
Errado.

6. PADRÃO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS


6.1. INTRODUÇÃO

6.1.1. OBJETIVO DO PADRÃO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

- Base para a compreensão do gerenciamento de projetos e como ele facilita os resultados pretendidos;
- Trata-se de um padrão válido **em todos os setores, locais, tamanhos ou abordagem de entrega**, que pode ser **preditiva, híbrida ou adaptativa**;
- Descreve **o sistema em que operam os projetos**, como governança, funções possíveis, o ambiente do projeto e as considerações sobre o relacionamento entre o gerenciamento de projetos e o gerenciamento de produto.

6.1.2. TERMOS E CONCEITOS-CHAVE

- **Abordagem híbrida:** combinação de dois ou mais elementos ágeis e não ágeis, com um resultado final não ágil;
- **Abordagens de desenvolvimento:**
 - 1. **Preditiva:** o escopo, o tempo e o custo do projeto são determinados nas fases iniciais do ciclo de vida;
 - 2. **Incremental:** abordagem adaptável na qual a entrega é produzida sucessivamente pela adição de funcionalidades até que a entrega contenha a capacidade necessária e suficiente para ser considerada completa;
 - 3. **Iterativa:** focada em uma implementação inicial simplificada, e que segue pela elaboração progressiva com acréscimos ao conjunto de funcionalidades até que a entrega final esteja completa;
- A figura seguinte é bem mais interessante para ilustrar a diferença entre **incremental** e **iterativo**:
 - Incremental: são adicionados “pedacos completos”



- Iterativo: esboços ou pedacos incompletos do produto são adicionados a cada iteração



- **Ágil (Agile):** termo usado para descrever uma mentalidade de valores e princípios conforme estabelecido no Manifesto Ágil;
- **Conhecimento em gerenciamento de projetos (PMBOK) / Project Management Body of Knowledge (PMBOK):** termo que descreve o conhecimento dentro da profissão de gerenciamento de projetos;
- **DevOps:** uma coleção de práticas para criar um bom fluxo de entrega **melhorando a colaboração entre o pessoal de desenvolvimento e o de operações**;

- **Estrutura analítica do projeto (EAP) / Work Breakdown Structure (WBS):** uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar as entregas exigidas;
- **Escritório de gerenciamento de projetos (EGP)/Project Management Office (PMO):** é uma estrutura de gerenciamento que padroniza os processos de governança relacionados com o projeto e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas;
- **Gerenciamento de projetos:** a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para cumprir os requisitos definidos. Busca orientar o trabalho do projeto para entregar os resultados pretendidos. As equipes de projeto podem alcançar os resultados usando uma ampla gama de abordagens (como **preditiva, híbrida e adaptativa**);
- **Mapeamento da cadeia de valor (Value Stream Mapping):** um método enxuto de negócios usado para documentar, analisar e melhorar o fluxo de informações ou materiais necessários para gerar um produto ou serviço para um cliente;
- **Projeto:** um **esforço temporário** empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. A natureza temporária dos projetos indica um início e um fim para o trabalho do projeto ou uma fase do trabalho do projeto. Os projetos podem ser independentes ou fazer parte de um programa ou portfólio;
- **Sistema de entrega de valor:** uma coleção de atividades estratégicas de negócios destinadas a construir, sustentar e/ou promover uma organização. Portfólios, programas, projetos, produtos e operações podem fazer parte do sistema de uma organização para entrega de valor;
- **Valor:** o **benefício**, a **importância** ou a **utilidade** de algo.

6.1.3. PÚBLICO DESTE PADRÃO

Este padrão fornece referência básica para as partes interessadas que participam de um projeto.

6.2. UM SISTEMA DE ENTREGA DE VALOR

6.2.1. CRIAÇÃO DE VALOR


Esta seção descreve como os projetos operam dentro de um sistema para produzir valor para as organizações e suas partes interessadas.

6.2.1.1. COMPONENTES DA ENTREGA DE VALOR

Há vários **componentes** (Exemplos: portfólios, programas, projetos, produtos e operações), que podem ser usados para criar valor.

Quando juntos, o trabalho desses componentes compõe um **sistema de entrega de valor** alinhado à estratégia da organização.

Componentes de um exemplo de sistema de entrega de valor

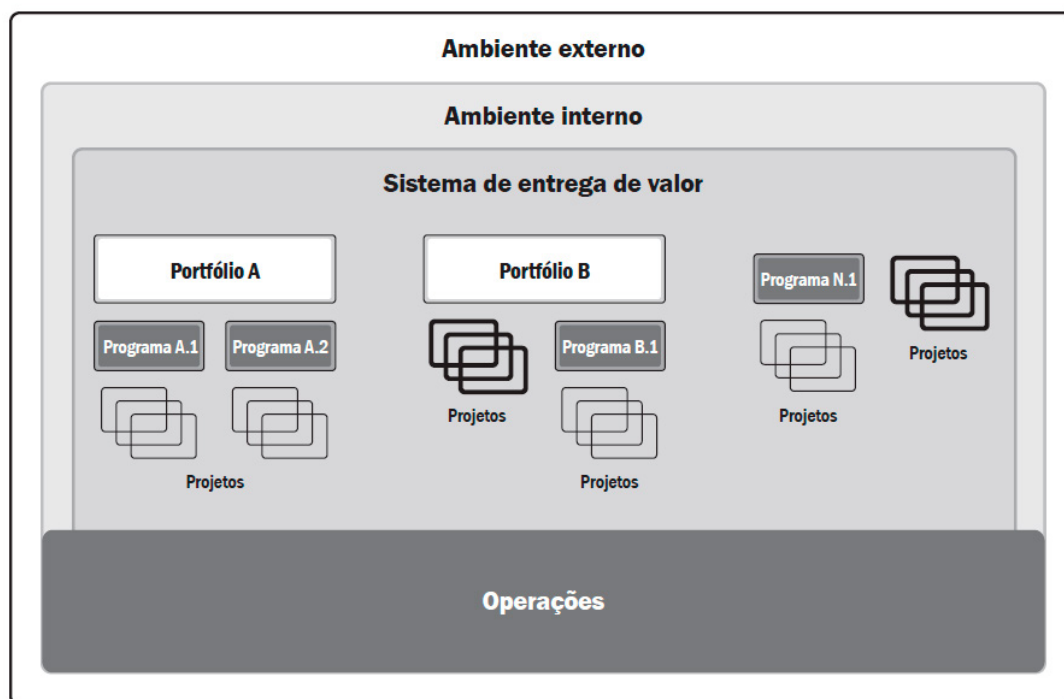

Fonte: PMBOK 7 (2021).

Os componentes de um sistema de entrega de valor criam itens para entrega usados para produzir resultados. Um **resultado** é a consequência ou o resultado final de um processo ou projeto.

O foco nos resultados, escolhas e decisões destaca o desempenho de longo prazo do projeto.


Os resultados criam **benefícios**, que são os ganhos percebidos pela organização. Por sua vez, os benefícios criam **valor**, ou seja, **a vantagem, a importância ou a utilidade de algo**.

6.2.1.2. FLUXO DE INFORMAÇÕES

Um **sistema de entrega de valor** funciona com mais eficácia se as informações e o *feedback* forem compartilhados coerentemente entre todos os componentes, mantendo o sistema alinhado com a estratégia e sintonizado com o ambiente.

6.2.2. SISTEMAS DE GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL

Sistemas de governança organizacional

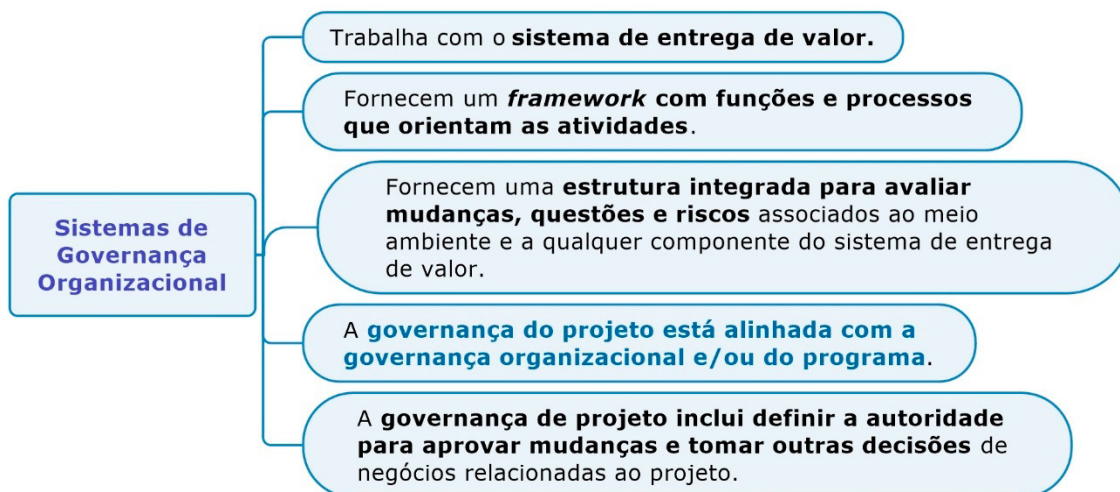

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2.3. FUNÇÕES ASSOCIADAS A PROJETOS

A seguir, tem-se **exemplos de funções** muitas vezes encontradas nos projetos. No entanto, outras funções podem ser necessárias para permitir que as entregas do projeto produzam os resultados desejados.

As **necessidades do projeto, da organização e do ambiente influenciam QUAIS** funções são usadas em um projeto e **COMO** essas funções são realizadas.

6.2.3.1. FORNECER SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO

As especificidades de como essa função é realizada no âmbito da equipe do projeto podem variar entre as organizações, mas podem incluir a liderança das atividades de planejamento, monitoramento e controle. Esta função inclui monitorar e trabalhar para melhorar a saúde, a segurança e o bem-estar geral dos membros da equipe do projeto.

6.2.3.2. OBJETIVOS E FEEDBACK ATUAIS

As pessoas nesta função contribuem com perspectivas, *insights* e orientações claras de clientes e usuários finais.

Os projetos precisam de uma orientação clara dos clientes e usuários finais sobre os requisitos, os resultados e as expectativas do projeto.

6.2.3.3. FACILITAR E APOIAR

O trabalho envolve incentivar a participação dos integrantes da equipe do projeto, a colaboração e um senso de responsabilidade compartilhado pelo resultado do trabalho.

6.2.3.4. REALIZAR O TRABALHO E CONTRIBUIR COM INSIGHTS

Esse grupo de pessoas fornece o conhecimento, as habilidades e a experiência necessários para elaborar os produtos e perceber os resultados do projeto.

Obter *insights* de integrantes da equipe multifuncional do projeto que representam diferentes partes da organização pode fornecer um *mix* de perspectivas internas, estabelecer alianças com unidades de negócios-chave e incentivar os membros da equipe do projeto a agirem como agentes de mudança em suas áreas funcionais.

6.2.3.5. APLICAR A ESPECIALIZAÇÃO

As pessoas nesta função compartilham o conhecimento, a visão e a especialização de um tema específico do projeto.

6.2.3.6. FORNECER ORIENTAÇÃO E INSIGHT COMERCIAIS

As pessoas nesta função orientam e esclarecem a direção do projeto ou resultado do produto.

Esta função envolve priorizar os requisitos ou itens de *backlog* com base no valor de negócio, nas dependências e no risco técnico ou operacional.

6.2.3.7. FORNECER RECURSOS E ORIENTAÇÕES

As pessoas nesta função promovem o projeto e comunicam a visão, as metas e as expectativas da organização à equipe do projeto e à comunidade de partes interessadas mais ampla. Elas defendem o projeto e a equipe do projeto, ajudando a garantir as decisões, os recursos e a autoridade que permitem o andamento das atividades do projeto.

6.2.3.8. MANTER A GOVERNANÇA

As pessoas que assumem uma função de governança aprovam e apoiam as recomendações feitas pela equipe do projeto e monitoram o andamento do projeto para alcançar os resultados desejados.

6.2.4. O AMBIENTE DO PROJETO

Os ambientes internos e externos podem influenciar o planejamento e outras atividades do projeto. Essas influências podem gerar um impacto favorável, desfavorável ou neutro sobre as características do projeto, partes interessadas ou equipes do projeto.

6.2.4.1. AMBIENTE INTERNO

Fatores internos da organização podem surgir da organização em si, de um portfólio, programa, outro projeto ou uma combinação destes elementos. Entre os fatores incluem-se artefatos, práticas ou conhecimento interno.

6.2.4.2. AMBIENTE EXTERNO

Os fatores externos à organização podem ser neutros, ampliar ou restringir os resultados do projeto.

6.2.5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O GERENCIAMENTO DE PRODUTO


As disciplinas do gerenciamento de portfólio, programa, projeto e produto tornam-se cada vez mais interligadas.

Um **produto** é um artefato produzido, quantificável e que pode ser um item final em si ou um item componente.

O **gerenciamento de produto** pode iniciar programas ou projetos em qualquer momento do ciclo de vida do produto para criar ou aprimorar componentes específicos, funções ou capacidades.

O produto inicial pode começar como a entrega de um programa ou projeto.

Exemplo de ciclo de vida de produto

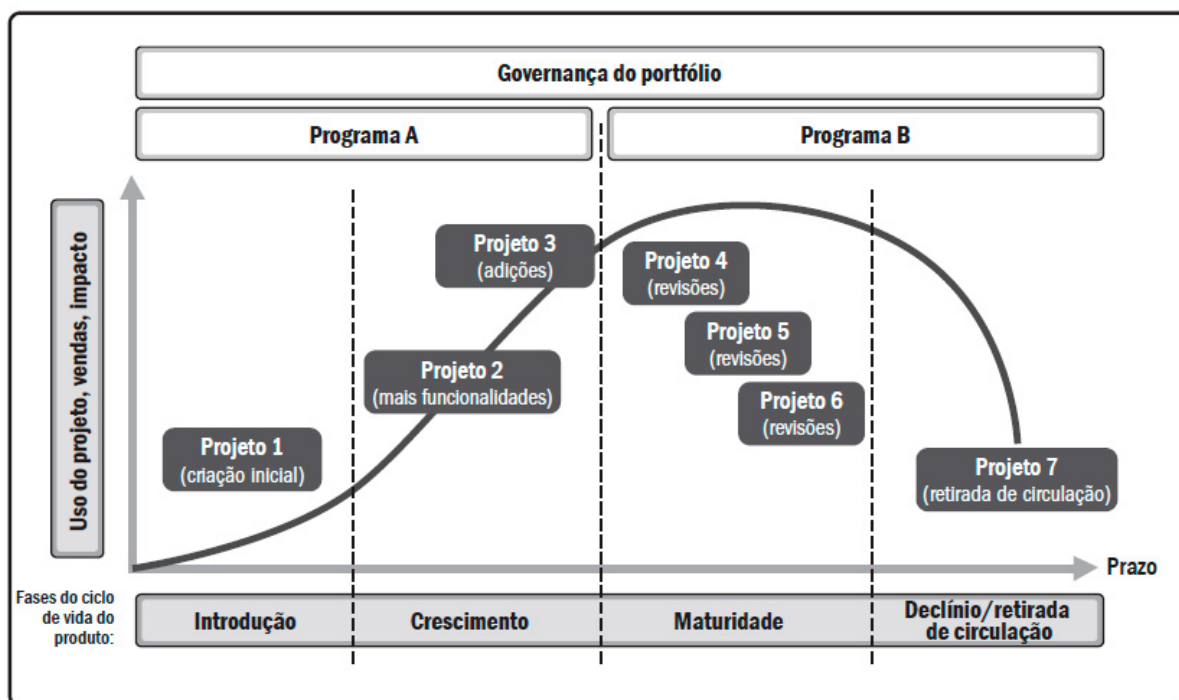

Fonte: PMBOK 7 (2021).

Durante todo o **ciclo de sua vida**, um novo programa ou projeto pode adicionar ou aprimorar componentes específicos, atributos ou capacidades que criam valor adicional para clientes e a organização patrocinadora. Em alguns casos, **o programa pode compreender todo o ciclo de vida de um produto ou serviço para gerenciar os benefícios e criar valor mais diretamente para a organização.**

O gerenciamento de produto pode existir de várias formas, incluindo entre outras:

- Gerenciamento de programas no âmbito de um ciclo de vida de produto;
- Gerenciamento de projetos no âmbito de um ciclo de vida do produto;
- Gerenciamento de produto no âmbito de um programa.

6.3. PRINCÍPIOS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS


Os **princípios** de uma profissão atuam como diretrizes fundamentais que moldam **a estratégia, a tomada de decisões e a resolução de problemas**. Com frequência, padrões e metodologias profissionais são fundamentados nesses princípios. Em certas profissões, tais princípios operam como leis ou regras, assumindo assim uma natureza prescritiva. **Já no gerenciamento de projetos, os princípios não possuem essa característica**; eles **são concebidos para orientar o comportamento das pessoas envolvidas nos projetos de maneira não prescritiva**. Tendo uma base ampla, permitem que indivíduos e organizações se alinhem de diversas maneiras.

Embora os princípios possam (mas não necessariamente) refletir a moralidade, **um código de ética está diretamente relacionado a ela**. Um código de ética profissional pode ser adotado por indivíduos ou grupos para definir expectativas de conduta moral. O Código de Ética e Conduta Profissional do gerenciamento de projetos se alicerça em quatro valores considerados primordiais para essa comunidade: **responsabilidade, respeito, equidade e honestidade**.

Os doze princípios do gerenciamento de projetos estão em consonância com os valores identificados no Código de Ética e Conduta Profissional. Embora não apresentem a mesma forma e não possam ser duplicados, eles se complementam de maneira significativa.


Esses princípios são identificados e desenvolvidos através do engajamento com uma comunidade global de profissionais de projeto. Esses profissionais representam diversos setores, origens culturais e organizações, desempenhando diferentes papéis e possuindo experiência em uma variedade de tipos de projeto. Esse processo contínuo de feedback culminou **nos doze princípios que fornecem orientação para uma gestão de projetos eficaz**.

Sobreposição dos princípios dos gerenciamentos de projetos e gerais

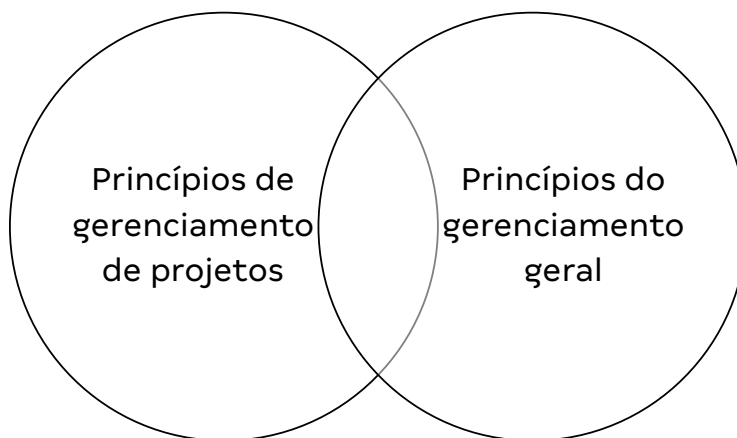

Veja então como cada um dos novos princípios pode ser aplicado, conforme PMBOK 7:

Os 12 princípios do PMBOK 7

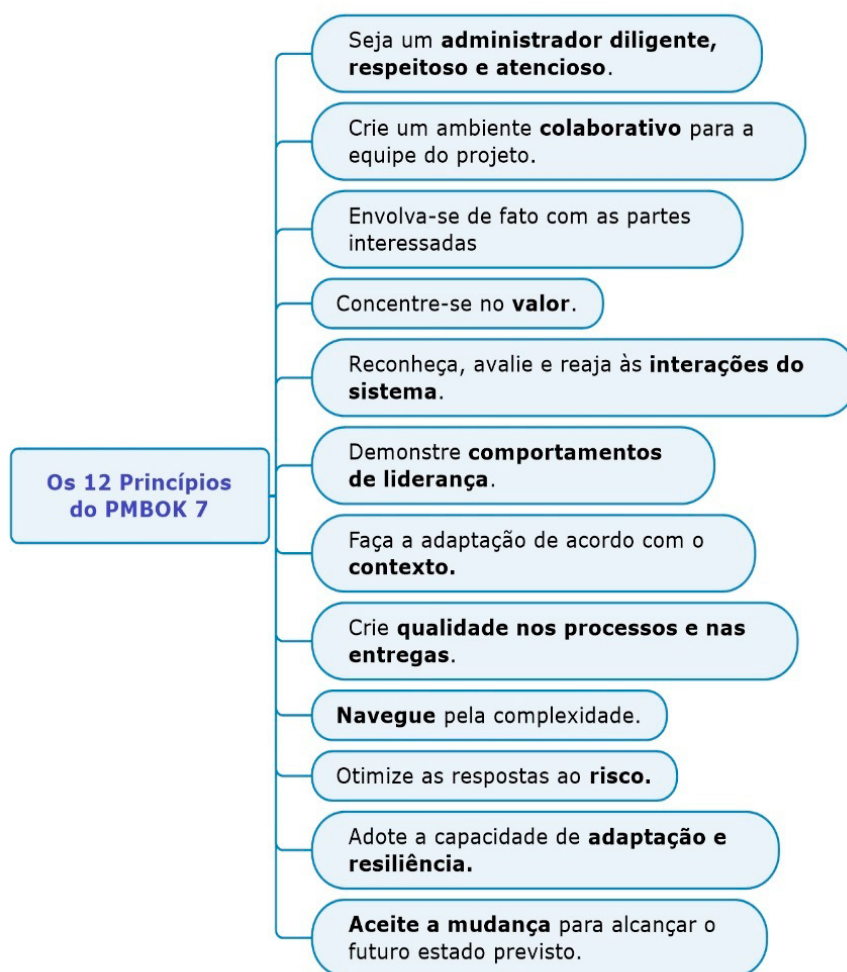

Fonte: Elaboração própria (2025).

6.3.1. SEJA UM ADMINISTRADOR DILIGENTE, RESPEITOSO E ATENCIOSO

ADMINISTRAÇÃO

Os administradores agem com responsabilidade para realizar atividades com integridade, cuidado e confiabilidade, mantendo a conformidade com as diretrizes internas e externas. Demonstram um amplo compromisso com os impactos financeiros, sociais e ambientais dos projetos que apoiam.

- ▶ A administração abrange responsabilidades internas e externas à organização.
- ▶ A administração inclui:
 - Integridade
 - Cuidado
 - Confiabilidade
 - Conformidade
- ▶ Uma visão holística da administração considera a conscientização financeira, social, técnica e ambiental.

6.3.2. CRIE UM AMBIENTE COLABORATIVO PARA A EQUIPE DO PROJETO

EQUIPE

As equipes de projeto são formadas por pessoas com diversas habilidades, conhecimentos e experiências. As equipes de projeto que trabalham de modo colaborativo podem cumprir um objetivo compartilhado da maneira mais eficaz e eficiente do que os indivíduos que trabalham por conta própria.

- ▶ Os projetos são entregues por equipes de projeto.
- ▶ As equipes de projeto trabalham no âmbito de culturas e diretrizes organizacionais e profissionais e, frequentemente, estabelecem sua própria cultura
- ▶ O ambiente de uma equipe de projeto colaborativa promove:
 - alinhamento com outras culturas e diretrizes organizacionais;
 - aprendizagem e desenvolvimento pessoal e de equipe; e
 - contribuições ideais para entregar os resultados desejados.

6.3.3. ENVOLVA-SE DE FATO COM AS PARTES INTERESSADAS

PARTES INTERESSADAS

O engajamento das partes interessadas deve ser proativo e na medida necessária que possa contribuir para o sucesso do projeto e a satisfação do cliente.

- ▶ As partes interessadas influenciam os projetos, o desempenho e os resultados.
- ▶ As equipes do projeto atendem a outras partes interessadas desde que engajadas.
- ▶ O engajamento das partes interessadas promove a entrega de valor de modo proativo.

6.3.4. ENFOQUE NO VALOR

VALOR	
Avalie e ajuste continuamente o alinhamento do projeto aos objetivos do negócio e aos benefícios e valor pretendidos.	▶ O valor é o indicador final do sucesso do projeto. ▶ O valor pode ser percebido ao longo do projeto, no final do projeto ou após a conclusão do projeto. ▶ O valor, e os benefícios que contribuem para o valor, podem ser definidos em termos quantitativos e/ou qualitativos. ▶ O foco nos resultados permite às equipes do projeto apoiar os benefícios pretendidos que levam à criação de valor. ▶ As equipes de projeto avaliam o progresso e se adaptam para maximizar o valor esperado.

6.3.5. RECONHEÇA, AVALIE E REAJA ÀS INTERAÇÕES DO SISTEMA

PENSAMENTO SISTÊMICO	
Reconhecer, avaliar e responder às circunstâncias dinâmicas no âmbito e ao redor do projeto de forma holística para influenciar positivamente o desempenho do projeto.	▶ Um projeto é um sistema de domínios de atividade interdependentes e interativos. ▶ O pensamento sistêmico implica visão holística de como as partes do projeto interagem entre si e com os sistemas externos. ▶ A mudança nos sistemas é uma constante, exige atenção uniforme às condições internas e externas. ▶ A prontidão às interações do sistema permite às equipes do projeto aproveitar os resultados positivos.

6.3.6. DEMONSTRE COMPORTAMENTOS DE LIDERANÇA

LIDERANÇA	
Demonstrar e adaptar comportamentos de liderança para apoiar as necessidades individuais e da equipe.	▶ A liderança eficaz promove o sucesso e contribui para resultados positivos do projeto. ▶ Qualquer membro da equipe do projeto pode demonstrar comportamentos de liderança. ▶ Liderança é diferente de autoridade. ▶ Os verdadeiros líderes adaptam seu estilo à situação. ▶ Os verdadeiros líderes reconhecem as diferenças de motivação entre os integrantes da equipe do projeto. ▶ Os líderes demonstram o comportamento desejado nas áreas de honestidade, integridade e conduta ética.

6.3.7. FAÇA A ADAPTAÇÃO DE ACORDO COM O CONTEXTO

TAILORING

Crie a abordagem de desenvolvimento do projeto com base no seu contexto, nos seus objetivos, nas partes interessadas, na governança e no ambiente usando o processo “apenas o suficiente” para atingir o resultado desejado, maximizando valor, gerenciando custos e aumentando a velocidade.

- ▶ Cada projeto é único.
- ▶ O sucesso do projeto baseia-se na adaptação ao contexto único do projeto para determinar os métodos mais adequados, produzindo os resultados desejados.
- ▶ O processo de *tailoring* é iterativo e, portanto, contínuo durante sua execução.

6.3.8. INCLUA QUALIDADE NOS PROCESSOS E NAS ENTREGAS

QUALIDADE

Manter o foco na qualidade para produzir entregas que cumpram os objetivos do projeto e se alinhem às necessidades, aos usos e aos requisitos de aceitação estabelecidos pelas partes interessadas relevantes.

- ▶ A qualidade do projeto implica satisfação das expectativas das partes interessadas e o cumprimento dos requisitos do projeto e do produto.
- ▶ A qualidade concentra-se em atender aos critérios de aceitação dos produtos.
- ▶ A qualidade do projeto implica garantir que os processos do projeto sejam apropriados e tão eficazes quanto possível.

6.3.9. COMPLEXIDADE

COMPLEXIDADE

Avalie e navegue continuamente a complexidade do projeto para que as abordagens e os planos permitam que a equipe do projeto navegue com sucesso pelo ciclo de vida do projeto.

- ▶ A complexidade é o resultado do comportamento humano, das interações do sistema, da incerteza e da ambiguidade.
- ▶ A complexidade pode surgir a qualquer momento durante o projeto.
- ▶ A complexidade pode ser introduzida por eventos ou condições que afetam o valor, o escopo, as comunicações, as partes interessadas, o risco e a inovação tecnológica.
- ▶ As equipes de projeto podem manter-se vigilantes na identificação de elementos de complexidade e usar vários métodos para reduzir a quantidade ou o impacto da complexidade.

6.3.10. OTIMIZE AS RESPOSTAS AOS RISCOS

RISCO	
Avalie constantemente a exposição ao risco, tanto em oportunidades quanto em ameaças, para maximizar os impactos positivos e minimizar os impactos negativos para o projeto e seus resultados.	▶ Riscos individuais e gerais podem causar impacto nos projetos. ▶ Os riscos podem ser positivos (oportunidades) ou negativos (ameaças). ▶ Os riscos são tratados continuamente ao longo do projeto. ▶ A forma de condução do risco de uma organização, o apetite ao risco e o limite do risco influenciam como o risco é tratado. ▶ As respostas ao risco devem ser: • proporcionais ao significado do risco; • econômicas; • realistas de acordo com o contexto do projeto; • consensuais entre as partes interessadas relevantes; e • sob a responsabilidade de uma pessoa.

6.3.11. ADOTE A CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA

CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA	
Crie capacidade de adaptação e resiliência nas abordagens da organização e da equipe do projeto para ajudar o projeto a acomodar mudanças, recuperar-se de contratempos e continuar com o trabalho do projeto.	▶ Capacidade de adaptação é a habilidade de reagir às condições da mudança. ▶ Resiliência é a habilidade de absorver impactos e rapidamente se recuperar de um contratempo ou falha. ▶ Manter o foco nos resultados e não nos produtos facilita a capacidade de adaptação.

6.3.12. ACEITE A MUDANÇA PARA ALCANÇAR O FUTURO ESTADO PREVISTO

MUDANÇA	
Prepare os envolvidos na mudança para que adotem e mantenham comportamentos e processos novos e diferentes, necessários na transição do estado atual para o estado futuro pretendido, criado pelos resultados do projeto.	▶ Uma abordagem estruturada de acordo com a mudança ajuda as pessoas, os grupos e a organização na transição do estado atual para o estado futuro desejado. ▶ A mudança pode surgir de influências internas ou fontes externas. ▶ Promover a mudança pode ser um desafio, pois nem todas as partes interessadas aceitam mudar. ▶ Implementar muitas mudanças em curto prazo pode resultar em fadiga e/ou resistência. ▶ O engajamento das partes interessadas e o uso de abordagens motivacionais ajudam na adoção da mudança.

Os princípios estabelecidos no PMBOK, 7ª edição, **não** apresentam pesos ou uma ordem específica.

7. GUIA DO CONHECIMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS (GUIA PMBOK®)

7.1. INTRODUÇÃO

7.1.1. VISÃO GERAL


A seguir destacamos informações importantes sobre o *Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)* – Sétima Edição, publicado pelo instituto PMI – Project Management Institute (2021), que reúne as melhores práticas na área de gerenciamento de projetos, com base em experiências de empresas de diferentes segmentos, públicas ou privadas.

O Guia PMBOK também fornece e promove um vocabulário comum para se discutir, escrever e aplicar o gerenciamento de projetos, possibilitando o intercâmbio eficiente de informações entre os profissionais de gerência de projetos.

7.1.2. RELACIONAMENTO ENTRE O GUIA PMBOK® E O PADRÃO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS


O trabalho nos domínios de desempenho de projetos é orientado pelos **princípios do gerenciamento de projetos**. Os princípios oferecem orientação para o comportamento das pessoas envolvidas em projetos, pois influenciam e moldam os domínios de desempenho para produzir os resultados pretendidos.

Relação entre os princípios de gerenciamento de projetos e os domínios de desempenho de projetos

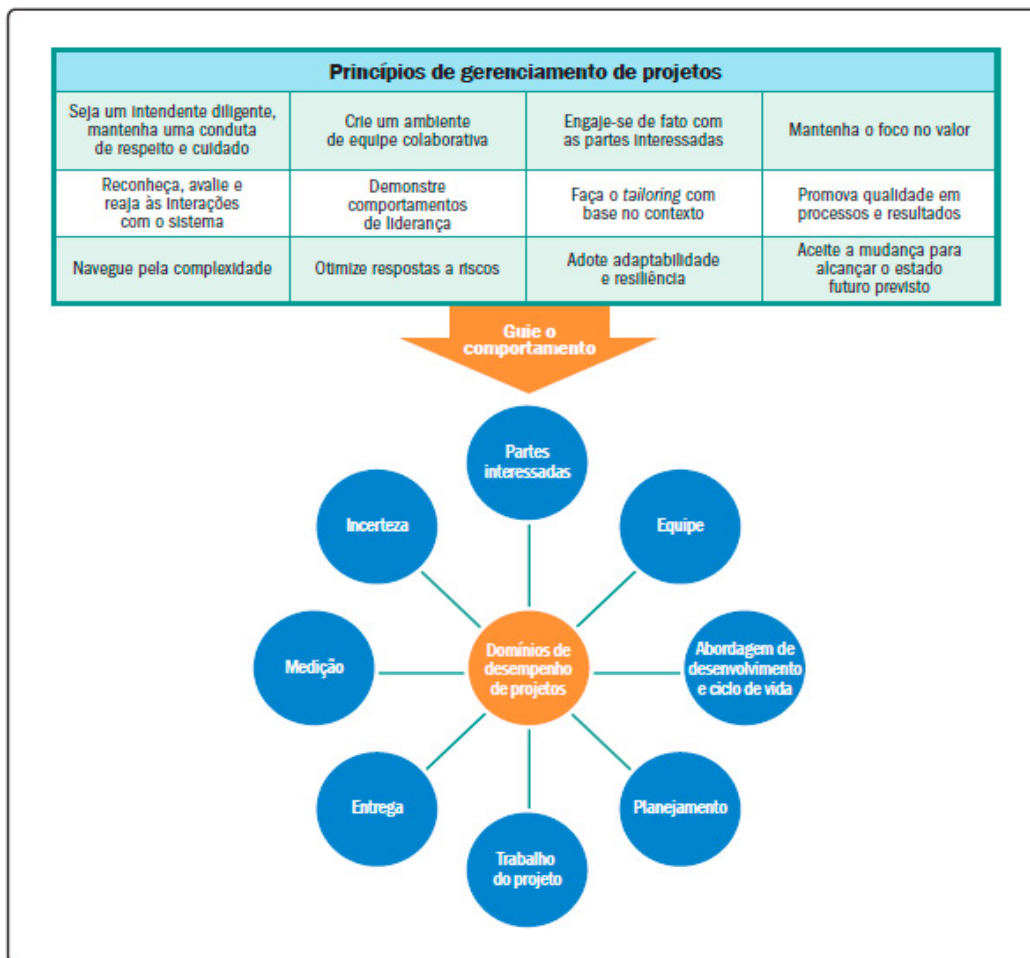

7.2. DOMÍNIOS DE DESEMPENHO DE PROJETOS

Oito domínios de desempenho de projetos

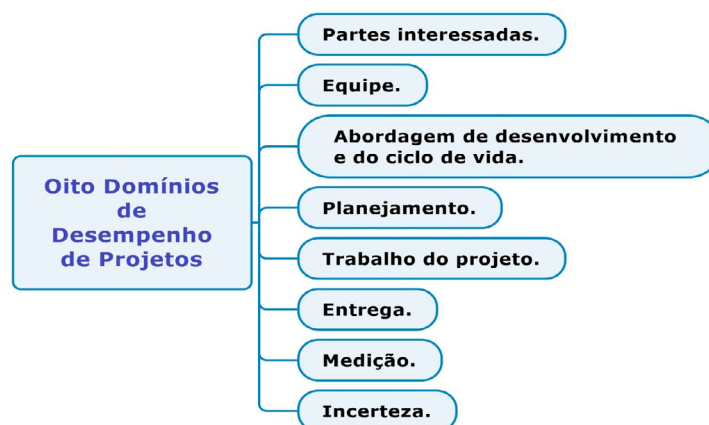

Fonte: Elaboração própria (2025).

QUESTÃO INÉDITA

004. (INÉDITA/2022) O Guia PMBOK 7 passou a abordar os sete domínios de desempenho de projetos que compõem um sistema integrado para viabilizar a entrega bem-sucedida do projeto e os resultados pretendidos.



O Guia PMBOK 7 **deixa para trás as 10 Áreas do Conhecimento**, passando a abordar os **oito domínios de desempenho de projetos** que compõem um sistema integrado para viabilizar a entrega bem-sucedida do projeto e os resultados pretendidos.

São eles:

- partes interessadas;
- equipe;
- abordagem de desenvolvimento e do ciclo de vida;
- planejamento;
- trabalho do projeto;
- entrega;
- medição, e
- incerteza.

Errado.

7.2.1. DOMÍNIO DE DESEMPENHO DAS PARTES INTERESSADAS

O domínio de desempenho das partes interessadas trata das atividades e funções associadas às partes interessadas

A execução eficaz deste domínio de desempenho resulta nos seguintes resultados desejados:

- ▶ Uma relação de trabalho produtiva com as partes interessadas ao longo do projeto.
- ▶ Acordo das partes interessadas com os objetivos do projeto.
- ▶ As partes interessadas beneficiárias do projeto apoiam e estão satisfeitas; já as partes interessadas que podem se opor ao projeto ou às suas entregas não afetam negativamente os resultados do projeto.

Um **projeto** pode ter um pequeno grupo de partes interessadas ou até mesmo milhões de partes interessadas.

Pode haver diferentes partes interessadas em diferentes fases do projeto, e a influência, o poder e os interesses das partes interessadas podem mudar à medida que o projeto se desenvolve.


7.2.1.1. ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

Inclui a implementação de estratégias e ações para promover o envolvimento produtivo delas.

As atividades de engajamento das partes interessadas começam **antes** ou no **começo** do projeto, e **continuam ao longo do projeto**.

Veja a seguir as várias etapas para engajar partes interessadas de forma eficaz.

Lidar com o engajamento efetivo das partes interessadas

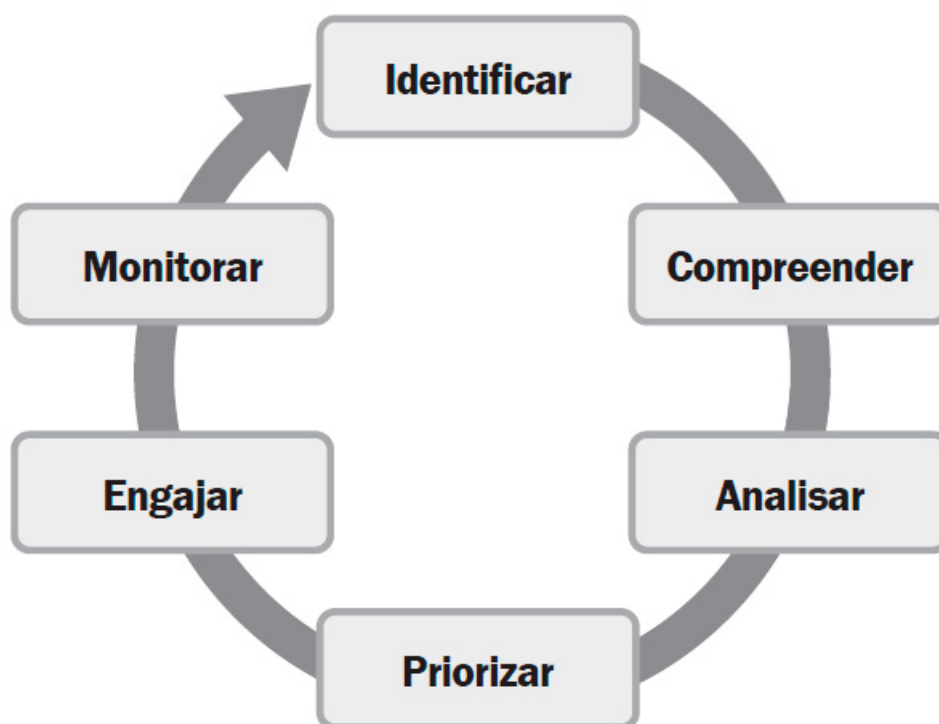

Fonte: PMBOK 7.

7.2.1.2. INTERAÇÕES COM OUTROS DOMÍNIOS DE DESEMPENHO

As partes interessadas permeiam todos os aspectos do projeto.

O domínio de desempenho das partes interessadas se integra e se entrelaça com outros domínios de desempenho, embora não incluam todas as maneiras pelas quais as preocupações das partes interessadas interagem em todos os domínios de desempenho.

7.2.1.3. VERIFICAÇÃO DE RESULTADOS

A tabela seguinte identifica os resultados à esquerda e as formas de verificá-los à direita, conforme PMBOK 7.

Resultado	Verificação
Uma relação de trabalho produtiva com as partes interessadas ao longo do projeto.	Podem ser observadas relações de trabalho produtivas com as partes interessadas. No entanto, o movimento das partes interessadas ao longo do engajamento pode indicar o nível relativo de satisfação com o projeto.
Acordo das partes interessadas com os objetivos do projeto.	Um número significativo de mudanças ou modificações no projeto, nos requisitos e no escopo do produto pode indicar que as partes interessadas talvez não estejam engajadas ou alinhadas com os objetivos do projeto.
As partes interessadas beneficiárias do projeto apoiam e estão satisfeitas; as partes interessadas que podem se opor ao projeto ou às suas entregas não afetam negativamente os resultados do projeto.	O comportamento das partes interessadas pode indicar se os beneficiários do projeto estão satisfeitos e apoiam ou se opõem ao projeto. Pesquisas, entrevistas e grupos de discussão também são maneiras eficazes de determinar se as partes interessadas estão satisfeitas e apoiam ou se opõem ao projeto e suas entregas. Uma revisão do registro de questões do projeto e do registro dos riscos pode identificar desafios associados a partes interessadas específicas.

7.2.2. DOMÍNIO DE DESEMPENHO DAS EQUIPES

O domínio de desempenho da equipe trata das atividades e funções associadas às pessoas responsáveis pela produção das entregas do projeto que atingem os resultados dos negócios.

A execução eficaz deste domínio de desempenho resulta nos seguintes resultados desejados:

- ▶ Propriedade compartilhada.
- ▶ Uma equipe de alto desempenho.
- ▶ Liderança aplicável e outras habilidades interpessoais demonstradas por todos os membros da equipe.

Envolve estabelecer a **cultura** e o **ambiente** que permitem que um grupo de diversos indivíduos evolua para uma equipe de projeto de alto desempenho.

7.2.2.1. GERENCIAMENTO E LIDERANÇA DA EQUIPE DO PROJETO

O **gerenciamento de projetos** envolve a **aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para atividades de gerenciamento e de liderança**. As atividades de gerenciamento têm como **foco os meios de atingir os objetivos do projeto**.

As **atividades de liderança** se concentram nas **pessoas**. Liderança inclui: **influenciar, motivar, ouvir, capacitar** e outras atividades relacionadas com a equipe do projeto.

Ambos são importantes para a obtenção dos resultados pretendidos.

7.2.2.2. CULTURA DA EQUIPE DO PROJETO

- **Cada equipe** de projeto desenvolve **sua própria cultura**;
- Cultura da **equipe do projeto**: pode ser estabelecida pelo desenvolvimento de normas, ou informalmente por meio dos comportamentos e ações dos seus membros. Opera dentro da cultura da organização, mas reflete as formas de trabalhar e interagir de seus membros.

7.2.2.3. EQUIPES DE PROJETO DE ALTO DESEMPENHO

Um dos objetivos da liderança eficaz é criar uma equipe de projeto de alto desempenho.

Fatores envolvidos nesse contexto:

- Comunicação aberta;
- Compreensão compartilhada;
- Propriedade compartilhada;
- Confiança;
- Colaboração;
- Adaptabilidade;
- Resiliência;
- Capacitação;
- Reconhecimento.


7.2.2.4. HABILIDADES DE LIDERANÇA

São **úteis** para todos os **membros da equipe** do projeto.

São **características** e **atividades** associadas à liderança:

- **estabelecendo e mantendo a visão** (resume o propósito do projeto de forma clara e sucinta);
- **pensamento crítico** ajuda a realizar essas atividades;
- **motivação dos membros da equipe** do projeto, para entender o que motiva o desempenho dos membros da equipe, e trabalhar com os membros da equipe de forma que permaneçam comprometidos com o projeto e seus resultados;
- **habilidades interpessoais** (como **inteligência emocional**, tomada de decisões e resolução de conflitos).

Existem vários modelos para definir e explicar a inteligência emocional. Eles convergem em quatro áreas principais:

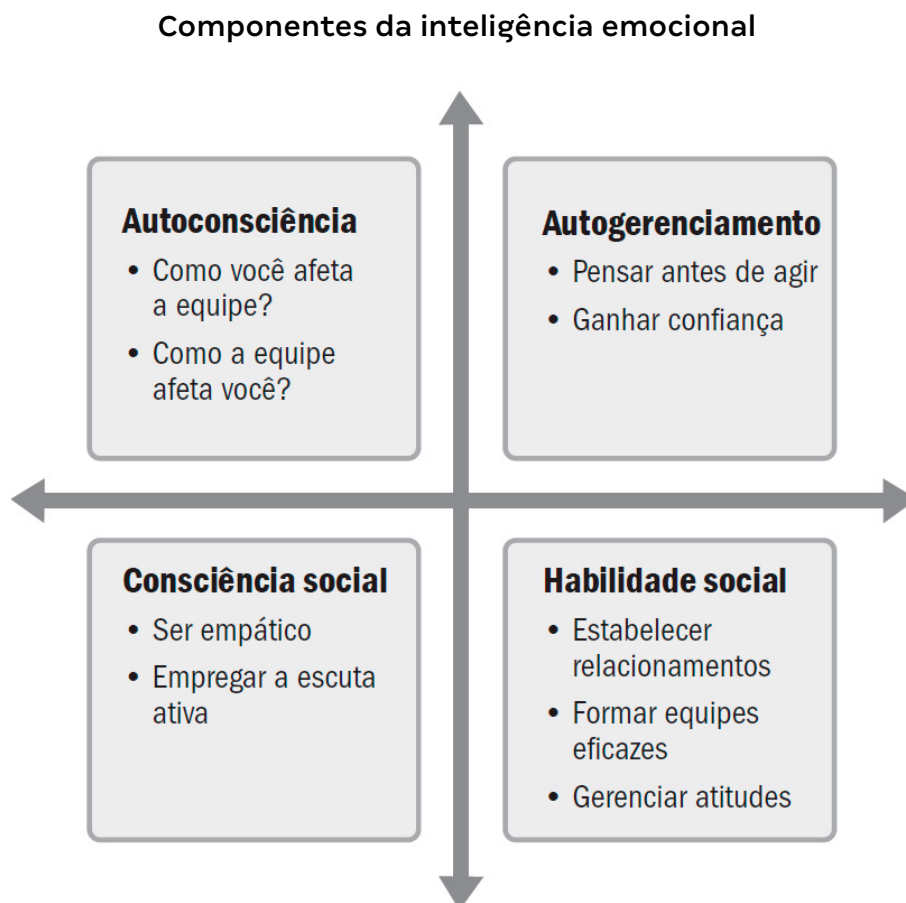

7.2.2.5. ADAPTANDO ESTILOS DE LIDERANÇA – TAILORING

Como em todos os aspectos dos projetos, os **estilos de liderança** também são **adaptados** para atender às **necessidades do projeto**, do **meio ambiente** e das **partes interessadas**.

Veja a seguir algumas das **variáveis** que influenciam a adaptação de estilos de liderança:

- experiência com o tipo de projeto;
- maturidade dos membros da equipe do projeto;
- estruturas de governança organizacional;
- equipes de projeto distribuídas.

7.2.2.6. INTERAÇÕES COM OUTROS DOMÍNIOS DE DESEMPENHO

O **domínio de desempenho da equipe** enfatiza as habilidades usadas pelos gerentes de projeto e membros da equipe do projeto durante todo o projeto. Essas habilidades estão inseridas em todos os outros aspectos do projeto.

7.2.3. DOMÍNIO DE DESEMPENHO DA ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO E DO CICLO DE VIDA

Trata das atividades e funções associadas às fases de **abordagem de desenvolvimento**, **cadência** (um ritmo de atividades realizadas ao longo do projeto) e **ciclo de vida do projeto**.

Obs.: Abordagem de desenvolvimento: um método usado para criar e desenvolver o produto, serviço ou resultado durante o ciclo de vida do projeto, como os métodos: preditivos, iterativos, incrementais, adaptativos ou híbridos.

A **execução** efetiva deste domínio de desempenho **entrega**:

- abordagens de desenvolvimento consistentes com os resultados do projeto;
- um ciclo de vida de projetos com fases que conectam a entrega de valor de negócios e partes interessadas do início ao fim do projeto e de fases que facilitam a abordagem de entrega e desenvolvimento necessárias para produzir os produtos entregues pelo projeto.

7.2.3.1. RELACIONAMENTO ENTRE DESENVOLVIMENTO, CADÊNCIA E CICLO DE VIDA

O tipo de entrega(s) do projeto determina como ele pode ser desenvolvido. O tipo de entrega(s) e a abordagem de desenvolvimento influenciam o número e a cadência das entregas do projeto.

A abordagem de entrega e a cadência de entrega desejada determinam o ciclo de vida do projeto e suas fases.

7.2.3.2. CADÊNCIA DE ENTREGA


Refere-se ao tempo e à frequência das entregas do projeto. Os projetos podem ter uma **única entrega**, **várias entregas** ou **entregas periódicas**.

7.2.3.3. ABORDAGENS DE DESENVOLVIMENTO

Abordagem de desenvolvimento é o meio usado para criar e desenvolver o produto, serviço ou resultado durante o ciclo de vida do projeto.

Três **abordagens comumente usadas** são: **preditiva**, **híbrida** e **adaptativa**.

Abordagens de desenvolvimento (PMBOK 7)

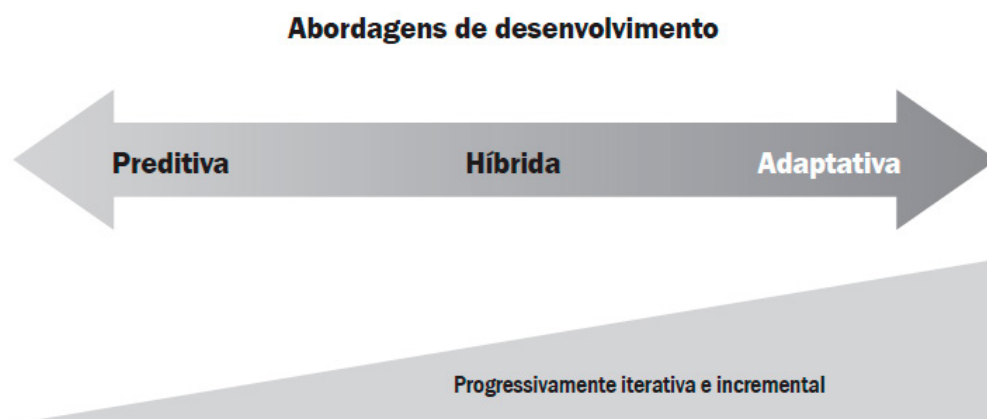

- **Abordagem preditiva:** útil quando os requisitos do projeto e do produto podem ser definidos, coletados e analisados no início do projeto. Isso também pode ser referido como abordagem em cascata;
- **Abordagem adaptativa:** úteis quando os requisitos estiverem sujeitos a um alto nível de incerteza e volatilidade, podendo mudar ao longo do projeto;
- **Abordagem híbrida:** uma combinação de abordagens adaptativas e preditivas.

7.2.3.4. CONSIDERAÇÕES PARA ESCOLHER UMA ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO

Vários elementos podem influenciar a escolha de uma abordagem de desenvolvimento. Eles podem ser divididos em categorias de **produto, serviço ou resultado**; o **projeto**; e a **organização**.

- Algumas das **variáveis** a serem consideradas ao escolher a **abordagem de desenvolvimento**: grau de inovação; certeza dos requisitos; estabilidade do escopo; facilidade de mudança; opções de entrega; risco; requisitos de segurança; regulamentações;
- As variáveis de **projeto** que influenciam a abordagem de desenvolvimento são centradas nas partes interessadas, restrições de cronograma e na disponibilidade de recursos financeiros;
- Variáveis **organizacionais** como estrutura, cultura, capacidade, tamanho da equipe do projeto e localização influenciam a abordagem de desenvolvimento.


7.2.3.5. DEFINIÇÕES DE CICLO DE VIDA E FASE

O tipo e o número de fases do projeto em um ciclo de vida do projeto dependem de muitas variáveis, principalmente da cadência de entrega e da abordagem de desenvolvimento.


Exemplos de **fases** em um **ciclo de vida**:

Viabilidade	Determina se o <i>business case</i> é válido e se a organização tem capacidade de entregar o resultado pretendido.
Design	O planejamento e a análise levam ao design da entrega do projeto que será desenvolvida.
Construção	A construção da entrega é conduzida com atividades integradas de garantia da qualidade.
Teste	A revisão final da qualidade e a inspeção das entregas são realizadas antes da transição, entrada em operação ou aceitação pelo cliente.
Implantação	As entregas do projeto são colocadas em uso e as atividades de transição necessárias para sustentação, percepção de benefícios e gerenciamento de mudanças organizacionais são concluídas.
Encerramento	O projeto é encerrado, o conhecimento e os artefatos do projeto são arquivados, os membros da equipe do projeto são liberados e os contratos são encerrados.


Exemplo de ciclo de vida preditivo

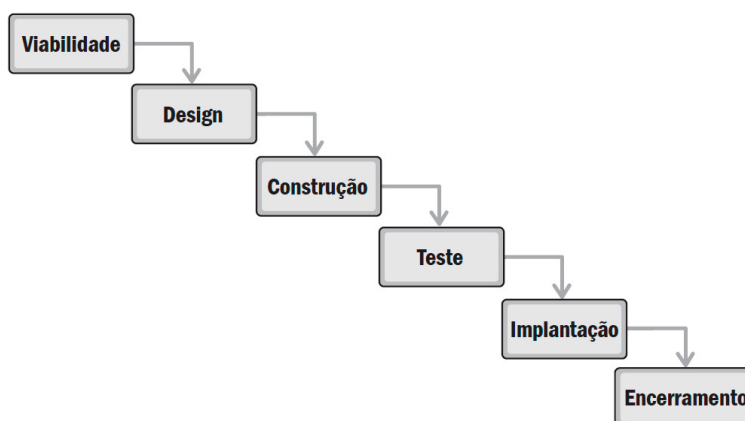

Exemplo de ciclo de vida com uma abordagem incremental

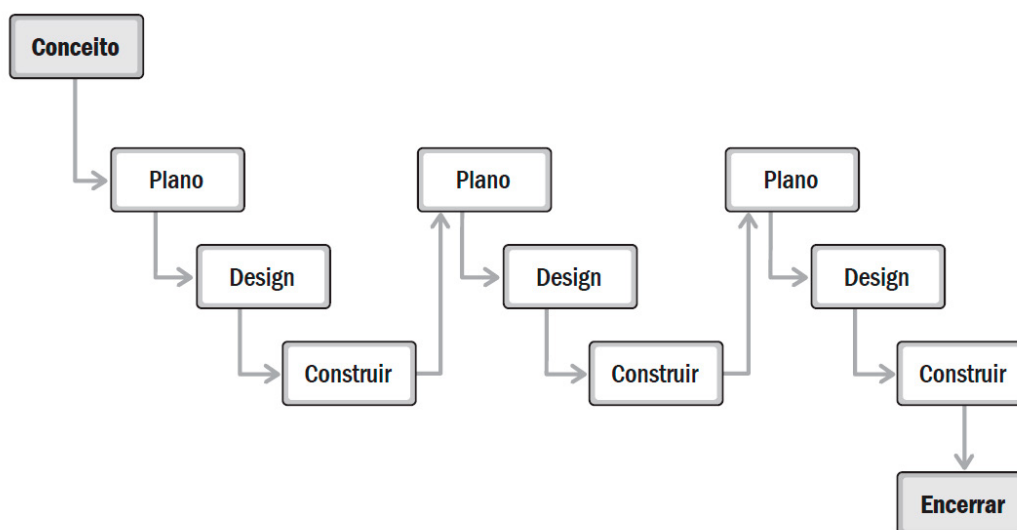

Ciclo de vida com uma abordagem de desenvolvimento adaptativa

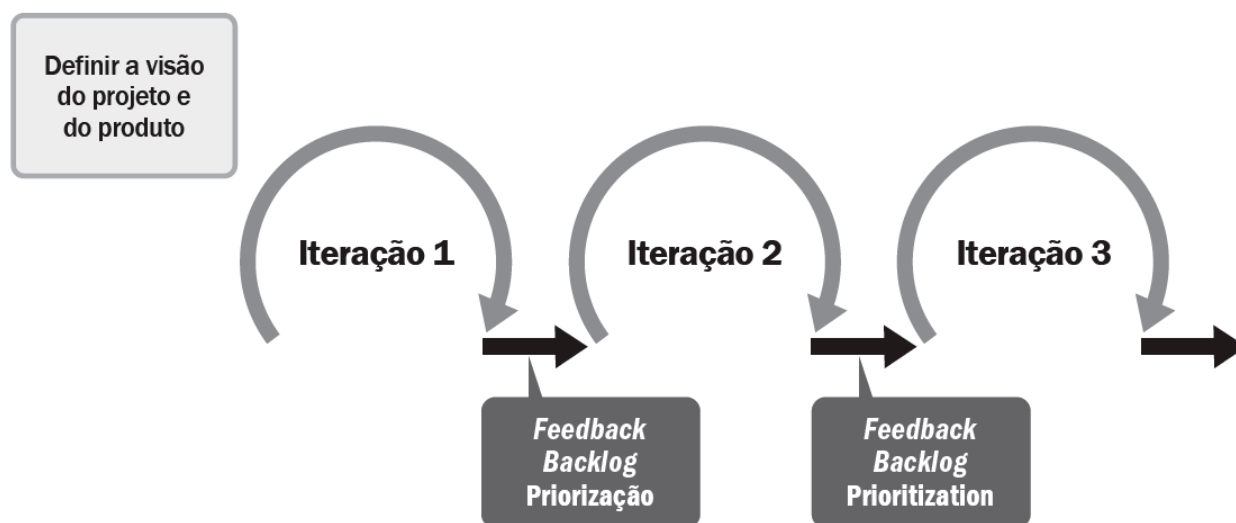

7.2.4. DOMÍNIO DE DESEMPENHO DO PLANEJAMENTO

O planejamento organiza, elabora e coordena o trabalho do projeto, durante todo o projeto.

O domínio de desempenho do planejamento trata das atividades e funções associadas à organização e coordenação iniciais, contínuas e em evolução necessárias para fornecer os resultados e as entregas do projeto.

A execução eficaz deste domínio de desempenho resulta nos seguintes resultados desejados:

- ▶ O projeto avança de maneira organizada, coordenada e deliberada.
- ▶ Existe uma abordagem holística para entregar os resultados do projeto.
- ▶ As informações em evolução são elaboradas para produzir as entregas e os resultados para os quais o projeto foi realizado.
- ▶ O tempo gasto no planejamento é apropriado para a situação.
- ▶ As informações de planejamento são suficientes para gerenciar as expectativas das partes interessadas.
- ▶ Há um processo de adaptação dos planos ao longo do projeto com base nas necessidades ou condições emergentes e variáveis.

7.2.4.1. VISÃO GERAL DO PLANEJAMENTO

O objetivo do **planejamento** é desenvolver proativamente uma abordagem para criar as entregas do projeto. As entregas do projeto conduzem aos resultados que o projeto foi executado para atingir.

7.2.4.2. VARIÁVEIS DE PLANEJAMENTO

Como cada projeto é único, a quantidade, o prazo e a frequência do planejamento variam. As variáveis que influenciam a forma COMO o planejamento do projeto é conduzido, incluem, entre outras:

- abordagem de desenvolvimento;
- entregas do projeto;
- requisitos organizacionais;
- condições do mercado;
- restrições legais ou regulamentares.

Existem diferentes maneiras de apresentar e/ou ajustar as estimativas:

Estimativa determinística e probabilística	As estimativas determinísticas, também conhecidas como estimativas pontuais, apresentam um único número ou valor, como 36 meses.
Estimativa absoluta e relativa	As estimativas absolutas são informações específicas e usam números reais. Embora as estimativas absolutas sejam específicas, as estimativas relativas são mostradas em comparação com outras estimativas. As estimativas relativas só têm significado dentro de um determinado contexto. Uma forma de estimativa relativa é o planning poker . No planning poker, a equipe do projeto que executa o trabalho chega a um consenso sobre o esforço necessário para agregar valor.
Estimativa baseada em fluxo	São desenvolvidas pela determinação do tempo de ciclo e a produtividade . O tempo de ciclo é o tempo total que uma unidade leva para passar por um processo. A produtividade é o número de itens que podem concluir um processo em um determinado tempo. Esses dois números podem fornecer uma estimativa para terminar uma determinada quantidade de trabalho.
Ajuste de estimativas pela incerteza	As estimativas são inerentemente incertas. A incerteza, por definição, está associada ao risco.

Ao comprimir o **cronograma**, é importante determinar a natureza das **dependências** entre as atividades. Algumas atividades não podem ser colocadas em paralelismo devido à natureza do trabalho, outras podem.

Os **quatro tipos de dependências** são:

Dependência obrigatória	Uma relação contratualmente exigida ou inerente à natureza do trabalho. Este tipo de dependência geralmente não pode ser modificado.
Dependência arbitrária	Um relacionamento que se baseia nas práticas recomendadas ou nas preferências do projeto. Esse tipo de dependência pode ser modificável.
Dependência externa	Um relacionamento entre atividades de projeto e atividades “não projetadas”. Este tipo de dependência geralmente não pode ser modificado.
Dependência interna	Um relacionamento entre uma ou mais atividades do projeto. Esse tipo de dependência pode ser modificável.

7.2.5. DOMÍNIO DE DESEMPENHO DE TRABALHO DO PROJETO

O domínio de desempenho do trabalho do projeto trata das atividades e funções associadas ao estabelecimento de processos do projeto, gerenciamento de recursos físicos e promoção de um ambiente de aprendizado.

A execução eficaz deste domínio de desempenho resulta nos seguintes resultados desejados:

- ▶ Desempenho de projeto eficiente e eficaz.
- ▶ Os processos do projeto são apropriados para o projeto e o ambiente.
- ▶ Comunicação adequada com as partes interessadas.
- ▶ Gerenciamento eficiente de recursos físicos.
- ▶ Gerenciamento eficaz de aquisições.
- ▶ Melhoria da capacidade da equipe devida ao aprendizado contínuo e melhoria de processos.

O **trabalho do projeto** está associado ao estabelecimento dos processos e à execução do trabalho para permitir que a equipe do projeto gere as entregas e os resultados esperados. Também mantém a equipe focada e as atividades funcionando perfeitamente. Isso inclui, entre outros:

- gerenciar o fluxo do trabalho existente, trabalho novo e mudanças no trabalho;
- manter a equipe do projeto focada;
- estabelecer sistemas e processos do projeto eficientes;
- comunicar com as partes interessadas;
- gerenciar materiais, equipamentos, suprimentos e logística;
- trabalhar com contratação de profissionais e fornecedores para planejar e gerenciar aquisições e contratos;
- acompanhar mudanças que podem afetar o projeto;
- habilitar a aprendizagem do projeto e a transferência de conhecimento.

7.2.5.1. PROCESSOS DO PROJETO

O gerente do projeto e a equipe do projeto estabelecem e revisam periodicamente os processos que a equipe do projeto está usando para conduzir o trabalho.

As formas de otimizar os processos para o meio ambiente incluem:

- métodos de produção *lean*;
- retrospectivas ou lições aprendidas;
- onde será a próxima melhor alocação de recursos financeiros?

7.2.6. DOMÍNIO DE DESEMPENHO DA ENTREGA

O domínio de desempenho da entrega trata das atividades e funções associadas às entregas do escopo e da qualidade esperados para o projeto.

A execução eficaz deste domínio de desempenho entrega os seguintes resultados desejados:

- ▶ Os projetos contribuem para os objetivos de negócios e o avanço da estratégia.
- ▶ Os projetos realizam os resultados que foram iniciados para entregar.
- ▶ Os benefícios do projeto são realizados no prazo em que foram planejados.
- ▶ A equipe do projeto tem uma compreensão clara dos requisitos.
- ▶ As partes interessadas aceitam e estão satisfeitas com os resultados do projeto.


Os projetos apoiam a execução da estratégia e o avanço dos objetivos dos negócios. A entrega do projeto concentra-se em atender aos requisitos, escopo e expectativas de qualidade para produzir as entregas esperadas que conduzirão aos resultados pretendidos.

As seguintes definições são relevantes para o domínio de desempenho da entrega:

- **Requisito:** uma condição ou funcionalidade necessária que deve estar presente em um produto, serviço ou resultado para satisfazer uma necessidade de negócio;
- **Definição de pronto (DoD):** uma lista de verificação de todos os critérios que devem ser atendidos para que uma entrega possa ser considerada pronta para uso do cliente;
- **Qualidade:** o grau em que um conjunto de características inerentes atende aos requisitos;
- **Custo da qualidade (CDQ):** todos os custos incorridos ao longo da vida útil do produto pelo investimento na prevenção da não conformidade, avaliação do produto ou serviço para conformidade e não cumprimento dos requisitos. Este modelo identifica **quatro categorias de custos** associados à qualidade:
 - **prevenção** (acontecem para impedir os defeitos e as falhas de um produto);
 - **avaliação** (para determinar o grau de conformidade com os requisitos de qualidade);
 - **falha interna** (associados à localização e correção de defeitos antes que o cliente receba o produto); e
 - **falha externa** (associados a defeitos encontrados após o cliente ter o produto e à correção dos mesmos). Exemplos: reparos e manutenção, reivindicações de garantia, reclamações, devoluções, reputação.

Os custos de prevenção e avaliação estão associados ao custo da conformidade com os requisitos de qualidade. Os custos de falha interna e externa estão associados ao custo de **não** conformidade.

Quanto mais tarde um defeito for encontrado, mais caro custará a sua correção. Isso ocorre porque o trabalho de *design* e desenvolvimento normalmente já ocorreu com base no componente defeituoso. Além disso, as atividades são mais caras de modificar à medida que o ciclo de vida avança, uma vez que mais partes interessadas são impactadas. Este fenômeno é caracterizado pela curva de custo da mudança.

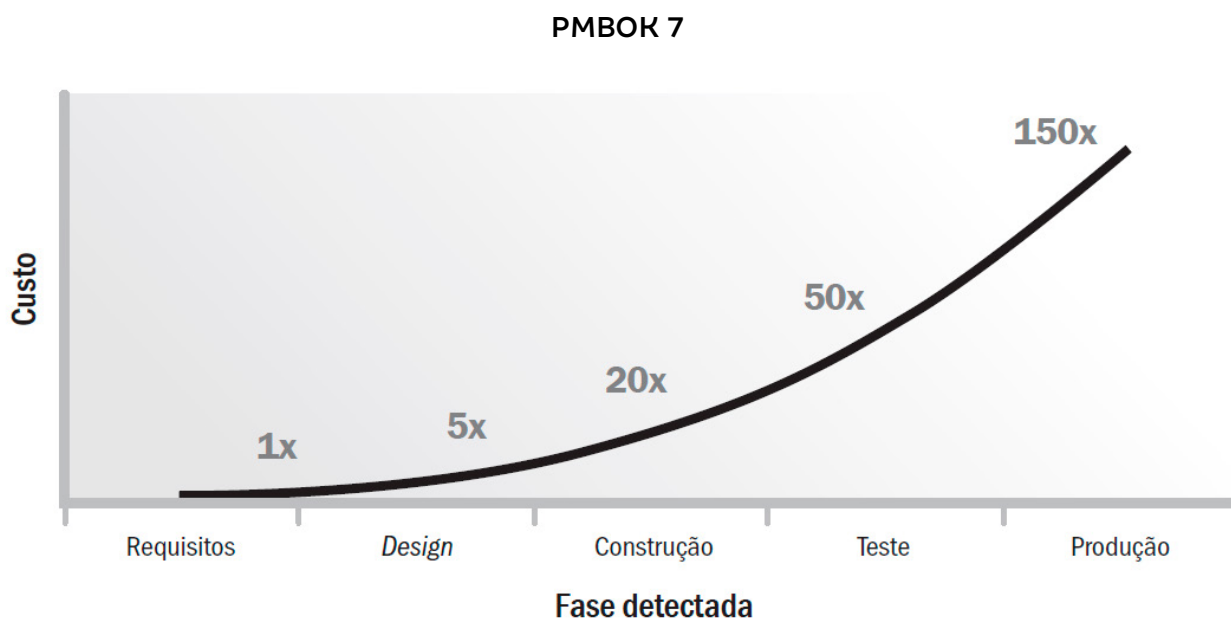


Curva de custo da mudança de Boehm: A mudança fica mais cara com o tempo

Estrutura analítica do projeto (EAP): uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar as entregas exigidas.

Observe pela figura seguinte, conforme PMBOK (2008), que **o projeto é sucessivamente quebrado em níveis de entregas cada vez menores até o menor nível desejado para detalhamento do escopo do projeto**. Este nível é denominado no PMBOK de **pacote de trabalho**. É possível agendar, estimar custos, monitorar e **controlar o trabalho planejado** contido nesses componentes de nível mais baixo da EAP, denominados pacotes de trabalho.

A decomposição de uma entrega ou subprojeto que será realizado em um futuro distante talvez não seja possível. A equipe de gerenciamento de projetos normalmente espera até que a entrega ou o subprojeto estejam esclarecidos para poder desenvolver os detalhes da EAP.

Exemplo de estrutura analítica do projeto com alguns ramos decompostos até o nível de pacotes de trabalho

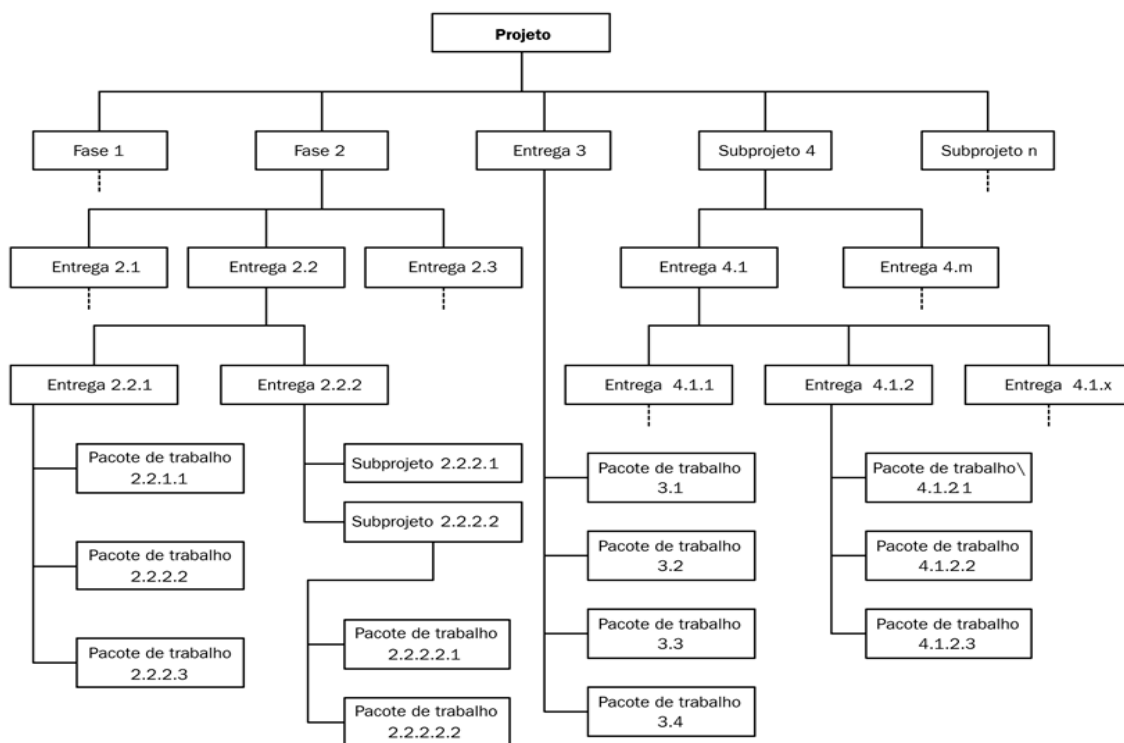

Fonte: PMBOK (2008).

DIRETO DO CONCURSO




005. (FGV/IBGE/ANÁLISE DE SISTEMAS/SUPORTE OPERACIONAL/2016/ADAPTADA) Marcos, gerente do projeto de atualização do parque tecnológico de uma grande corporação, concluiu a construção da Estrutura Analítica do Projeto (EAP). Assim, é correto afirmar que Marcos identificou:

- a) o caminho crítico do projeto
- b) as dependências entre as atividades
- c) as entregas do projeto
- d) as entregas para o cliente
- e) as estimativas de recursos necessários ao projeto



A **WBS (Work Breakdown Structure)**, também conhecida como **estrutura analítica do projeto (EAP)**, organiza e define o escopo total do projeto. Cada nível descendente representa uma definição cada vez mais detalhada do trabalho do projeto.

Exemplo de estrutura analítica do projeto com alguns ramos decompostos até o nível de pacotes de trabalho

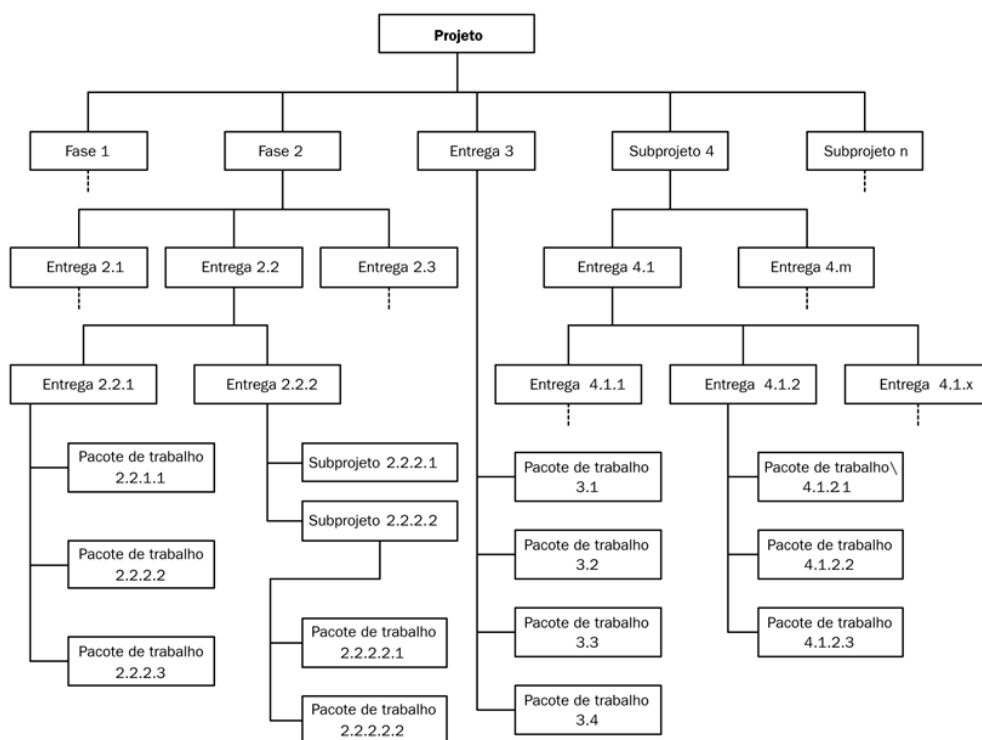

Observe pela figura anterior que o projeto é sucessivamente quebrado em níveis de entregas cada vez menores até o menor nível desejado para detalhamento do escopo do projeto. Este nível é denominado no PMBOK de **pacote de trabalho**.

Marcos, gerente do projeto de atualização do parque tecnológico de uma grande corporação, concluiu a construção da EAP. Assim, pode-se afirmar que Marcos identificou **as entregas do projeto**.

A EAP deve ser completa, organizada e pequena o suficiente para que o progresso possa ser medido, mas não detalhada o suficiente para se tornar – ela mesma – um obstáculo para a realização do projeto, é o que destaca.

Letra c.

006. (FCC/TRE-SP/ANALISTA JUDICIÁRIO/2017/ADAPTADA) A literatura aponta um claro *discrimen* entre as atividades rotineiras de uma organização e aquelas que são caracterizadas como projetos. Esse conceito restou sintetizado em uma das principais publicações do Project Management Institute – PMI, o PMBOK, que define projeto como um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Um dos conceitos apresentados pelo PMBOK7 é a Estrutura Analítica do Projeto – EAP, que pode ser entendida como


- a) a alocação do projeto dentro das prioridades da organização e sua consequente hierarquização.
- b) o mapeamento dos pontos críticos do projeto, denominados “bottlenecks” (gargalos).
- c) a descrição detalhada do projeto e do produto ou serviço resultante, correspondente ao seu escopo.
- d) a subdivisão das entregas e do trabalho a ser executado pela equipe envolvida no projeto, até sua menor divisão, denominada “pacotes de trabalho”.
- e) o fluxograma de todos os processos envolvidos na realização do projeto, com identificação da estimativa de tempo para cada tarefa.



A **WBS (Work Breakdown Structure)**, também conhecida como **estrutura analítica do projeto (EAP)**, **organiza e define o escopo total do projeto**. Cada nível descendente representa uma definição cada vez mais detalhada do trabalho do projeto.

Observe pela figura seguinte que **o projeto é sucessivamente quebrado em níveis de entregas cada vez menores até o menor nível desejado para detalhamento do escopo do projeto**. Este nível é denominado no PMBOK de **pacote de trabalho**. É possível agendar, estimar custos, monitorar e **controlar o trabalho planejado** contido nesses componentes de nível mais baixo da EAP, denominados pacotes de trabalho.

Exemplo de estrutura analítica do projeto com alguns ramos decompostos até o nível de pacotes de trabalho

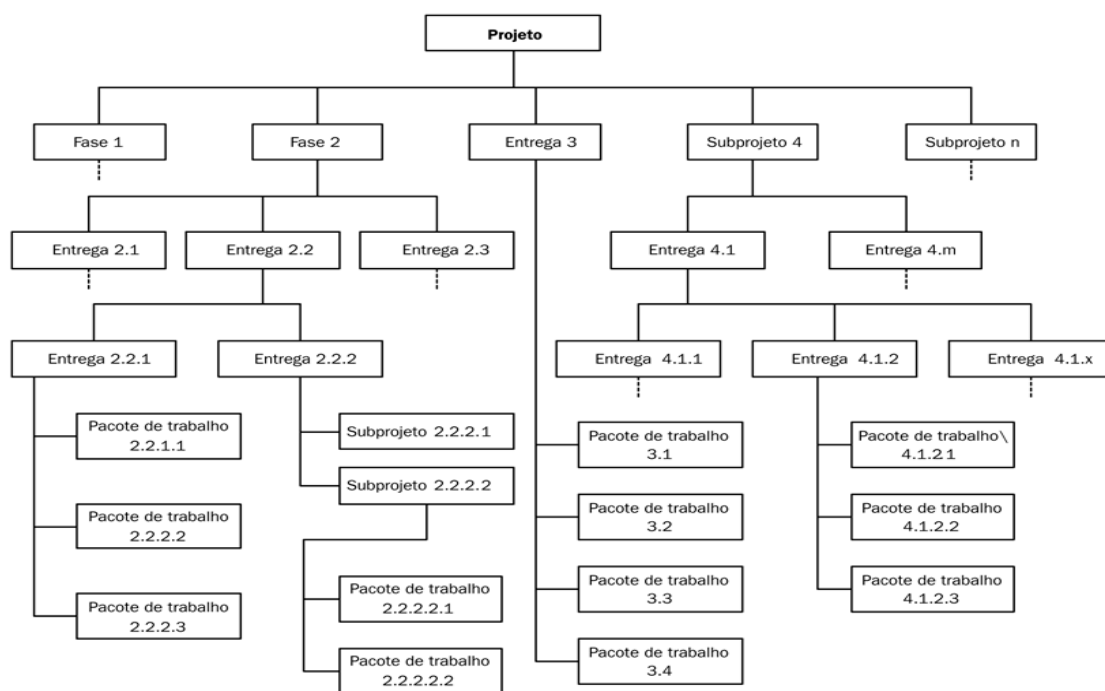

Fonte: PMBOK (2008).

Ao se criar uma EAP, realiza-se a subdivisão das principais entregas do projeto e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.

Letra d.

7.2.7. DOMÍNIO DE DESEMPENHO DA MEDIÇÃO

O domínio de desempenho da medição trata das atividades e funções associadas à avaliação do desempenho do projeto e à tomada de ações apropriadas para manter um desempenho aceitável.

A execução eficaz deste domínio de desempenho entrega os seguintes resultados desejados:

- ▶ Uma compreensão confiável do status do projeto.
- ▶ Dados acionáveis para facilitar a tomada de decisões.
- ▶ Ações oportunas e apropriadas para manter o desempenho do projeto sob controle.
- ▶ Atingir metas e gerar valor de negócio ao tomar decisões oportunas com base em previsões e avaliações confiáveis.

Medidas implicam a avaliação do desempenho do projeto e a implementação de respostas adequadas para manter o desempenho ideal.

Este domínio de desempenho se concentra em medidas de projetos ativos.

Veja algumas definições relevantes para o domínio de desempenho da medição:

- **Métrica:** a descrição de um atributo do projeto ou do produto e como medi-lo;
- **Linha de base:** a versão aprovada de um produto do trabalho, usada como base para comparação com os resultados reais;
- **Painel de controle (Dashboard):** um conjunto de tabelas e gráficos que mostram o progresso ou desempenho em relação a medidas importantes do projeto. Os painéis de controle geralmente incluem informações exibidas como gráficos de semáforo (também conhecidos como **gráficos VAV**, em que VAV é a abreviação de vermelho-amarelo-verde), gráficos de barras, gráficos de setores e gráficos de controle. Uma explicação de texto pode ser usada para quaisquer medidas que estejam fora dos limites estabelecidos.

Os **indicadores-chave de desempenho (KPIs)** de projetos são medidas quantificáveis usadas para avaliar o sucesso de um projeto. Existem dois tipos de KPIs:

Indicadores de Antecipação	Preveem mudanças ou tendências no projeto. Se a mudança ou tendência for desfavorável, a equipe do projeto avalia a causa raiz da medição do indicador de antecipação e toma medidas para reverter a tendência. A falta de um processo de gerenciamento de riscos, as partes interessadas não disponíveis nem engajadas ou os critérios de sucesso do projeto mal definidos são exemplos de indicadores que antecipam o risco que pode afetar o desempenho do projeto.
-----------------------------------	--

Indicadores de Espera	Medem as entregas ou eventos do projeto. Fornecem informações após o fato. Refletem o desempenho ou as condições anteriores. São mais fáceis de medir do que os indicadores de antecipação. Os exemplos incluem o número de entregas concluídas, o cronograma ou a variação de custo e a quantidade de recursos consumidos.
------------------------------	--

7.2.8. DOMÍNIO DE DESEMPENHO DA INCERTEZA

O domínio de desempenho da incerteza trata das atividades e funções associadas a riscos e incertezas.

A execução eficaz deste domínio de desempenho entrega os seguintes resultados desejados:

- ▶ Uma conscientização do ambiente em que ocorrem os projetos, incluindo, entre outros, os ambientes técnico, social, político, de mercado e econômico.
- ▶ Explorar e responder de forma proativa à incerteza.
- ▶ A conscientização da interdependência de múltiplas variáveis no projeto.
- ▶ A capacidade de antecipar ameaças e oportunidades, e compreender as consequências dos problemas.
- ▶ Entrega do projeto com pouco ou nenhum impacto negativo de condições ou eventos inesperados.
- ▶ Oportunidades são realizadas para melhorar o desempenho e os resultados do projeto
- ▶ As reservas de custo e cronograma são utilizadas de forma eficaz para manter o alinhamento com os objetivos do projeto.

Os projetos existem em ambientes com vários graus de incerteza. A incerteza apresenta ameaças e oportunidades que as equipes de projeto exploram, avaliam e decidem como lidar. Veja definições importantes relacionadas a esse domínio:

- **Incerteza:** falta de compreensão e conscientização de questões, eventos, caminhos a seguir ou soluções a serem buscadas;
- **Ambiguidade:** um estado de incerteza, de dificuldade em identificar a causa dos eventos ou a opção certa entre várias possibilidades;
- **Complexidade:** uma característica de programa, projeto ou seu ambiente que indica a dificuldade de gerenciamento devido ao comportamento humano, comportamento do sistema e ambiguidade;
- **Volatilidade:** a possibilidade de mudança rápida e imprevisível;
- **Ameaça:** um evento ou condição que, se ocorrer, tem um impacto negativo em um ou mais objetivos.

Cinco estratégias alternativas podem ser consideradas para lidar com ameaças como segue:

- **Prevenir:** a prevenção de ameaças ocorre quando a equipe do projeto atua para eliminar a ameaça ou proteger o projeto de seu impacto;
- **Escalar:** a escalção é apropriada quando a equipe do projeto ou o seu patrocinador concorda que uma ameaça está fora do escopo do projeto ou que a resposta proposta excede a autoridade do gerente do projeto;
- **Transferir:** a transferência envolve passar a responsabilidade de uma ameaça a terceiros para gerenciar o risco e suportar o impacto, caso a ameaça ocorra;
- **Mitigar:** na mitigação de ameaças, a ação é realizada para reduzir a probabilidade de ocorrência e/ou o impacto de uma ameaça. A ação de mitigação antecipada é quase sempre mais efetiva do que tentar reparar o dano depois que a ameaça ocorreu;
- **Aceitar:** a aceitação de ameaças reconhece a existência de uma ameaça, mas nenhuma ação proativa é tomada. Aceitar ativamente um risco pode incluir o desenvolvimento de um plano de contingência que seria acionado se o evento ocorresse; ou pode incluir aceitação passiva, que significa não fazer nada;
- **Risco:** um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto. Os membros da equipe do projeto devem identificar proativamente os riscos ao longo do projeto para evitar ou minimizar os impactos das ameaças e explorar ou maximizar os impactos das oportunidades.

7.3. TAILORING

Esta seção descreve o significado de *tailoring* e apresenta uma visão geral do que pode ser classificado como *tailoring* e como fazer o *tailoring* em cada projeto.

Tailoring é a **adaptação deliberada da abordagem, da governança e dos processos de gerenciamento de projetos para torná-los mais adequados a determinado ambiente e ao trabalho a realizar.**

Em um ambiente de projeto, o *tailoring* considera a abordagem de desenvolvimento, os processos, o ciclo de vida do projeto, as entregas e a escolha das pessoas com quem se engajar.

Tailoring implica escolher e ajustar, consciente de vários fatores do projeto, sem considerar se o rótulo “*tailoring*” será usado.

O *tailoring* envolve conhecer o contexto, as metas e o ambiente operacional do projeto.

O *tailoring* é realizado para ajustar melhor a organização, o ambiente operacional e as necessidades de projeto.

O *tailoring* gera benefícios diretos e indiretos para as organizações. Esses incluem, entre outros:

- mais comprometimento dos membros da equipe do projeto que ajudaram a realizar o *tailoring* da abordagem;
- enfoque orientado ao cliente, pois as suas necessidades são um importante fator de influência em seu desenvolvimento; e
- uso mais eficiente dos recursos de projeto.


Os **aspectos** do projeto que podem ser submetidos ao *tailoring* são:

- seleção do ciclo de vida e a abordagem de desenvolvimento;
- processos;
- engajamento;
- ferramentas; e
- métodos e artefatos.

Vejamos a seguir alguns detalhes do **processo de tailoring**, que envolve quatro etapas:

- selecionar a abordagem inicial;
- realizar o *tailoring* da organização;
- realizar o *tailoring* do projeto;
- implementar melhorias contínuas.

Detalhes das etapas do processo de tailoring (PMBOK 7)

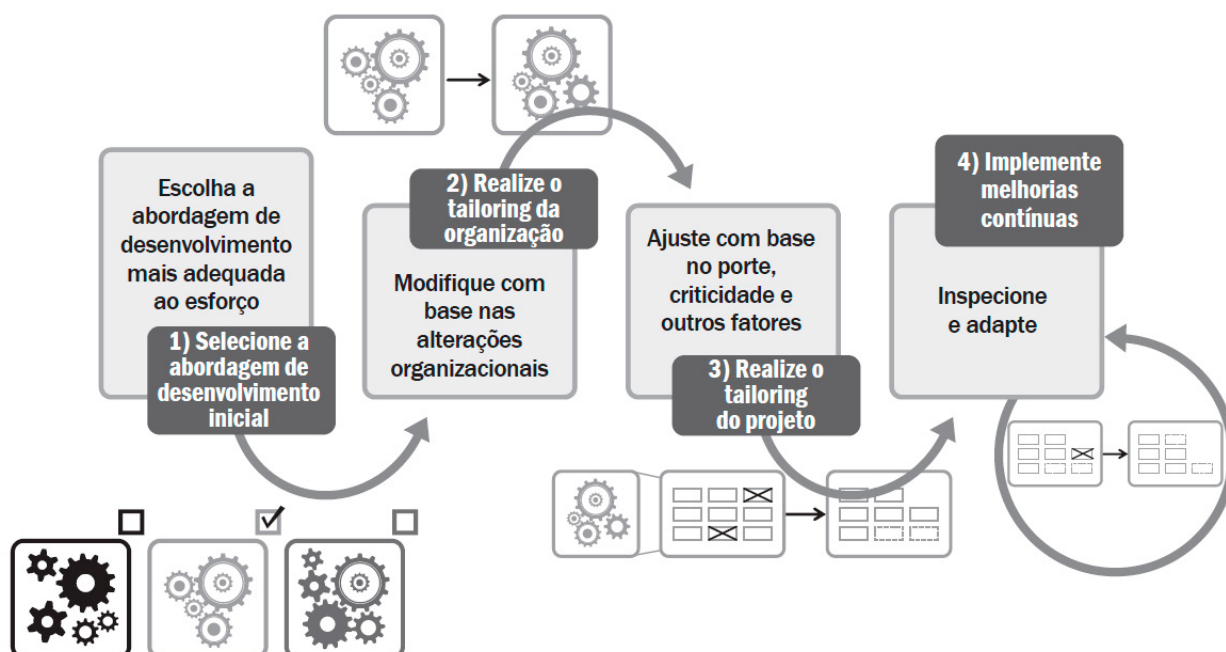

7.4. MODELOS, MÉTODOS E ARTEFATOS

Esta seção apresenta uma descrição sucinta dos **modelos**, **métodos** e **artefatos** usados comumente.


- **Modelo**: representa a **estratégia** do pensamento para explicar um processo, *framework* ou uma experiência;
- **Método**: é o **meio** de alcançar um resultado, saída ou entrega do projeto;
- **Artefato**: pode ser um **modelo**, **documento**, **saída** ou **entrega** do projeto.

Esses modelos, métodos e artefatos ilustram a gama de opções à disposição das equipes do projeto para produzir entregas, organizar o trabalho, viabilizando a comunicação e a colaboração.

Modelos de Liderança Situacional

Descrevem **COMO os estilos de liderança podem ser submetidos ao *tailoring*** para atender às necessidades individuais e da equipe do projeto.

Modelos de liderança situacional

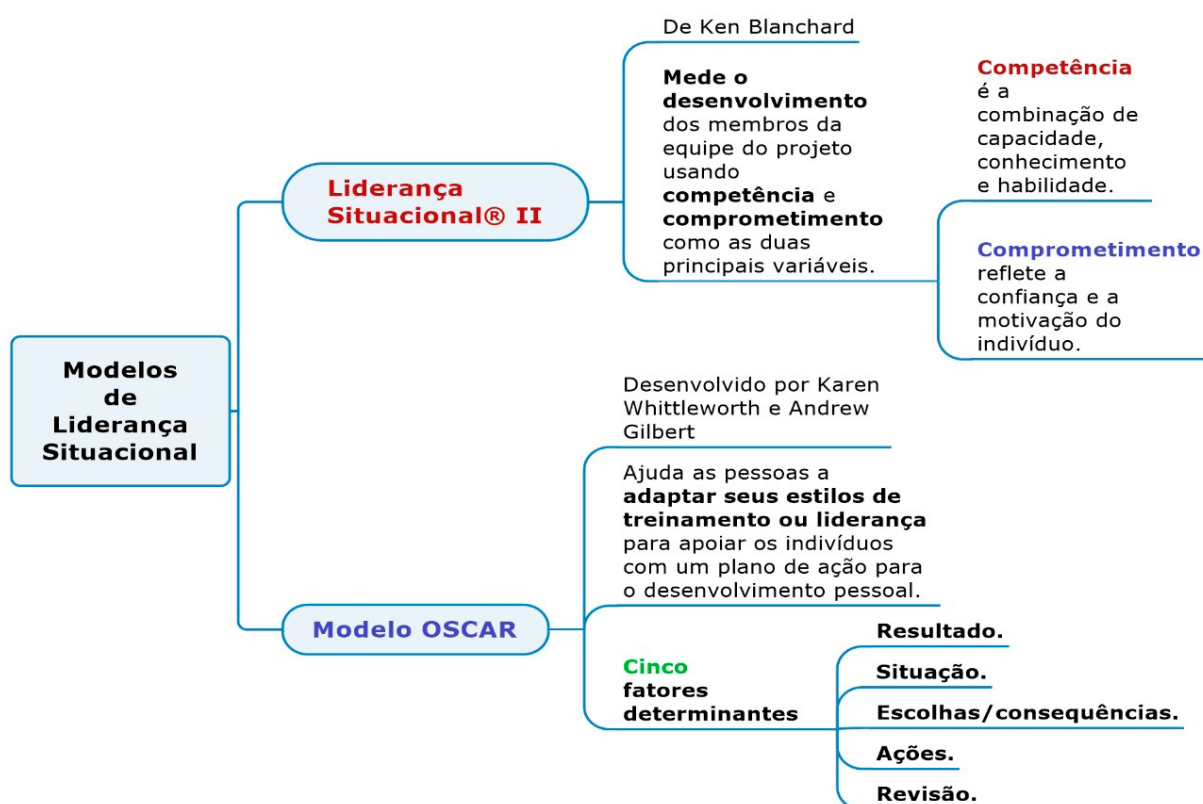


Fonte: Elaboração Própria (2022).

Modelos de Comunicação

Demonstram conceitos associados a como os quadros de referência de remetentes e destinatários afetam a eficácia da comunicação, como o meio de comunicação influencia a eficácia da comunicação, e os tipos de desconexões entre as expectativas e a realidade do usuário final.

Modelos de comunicação

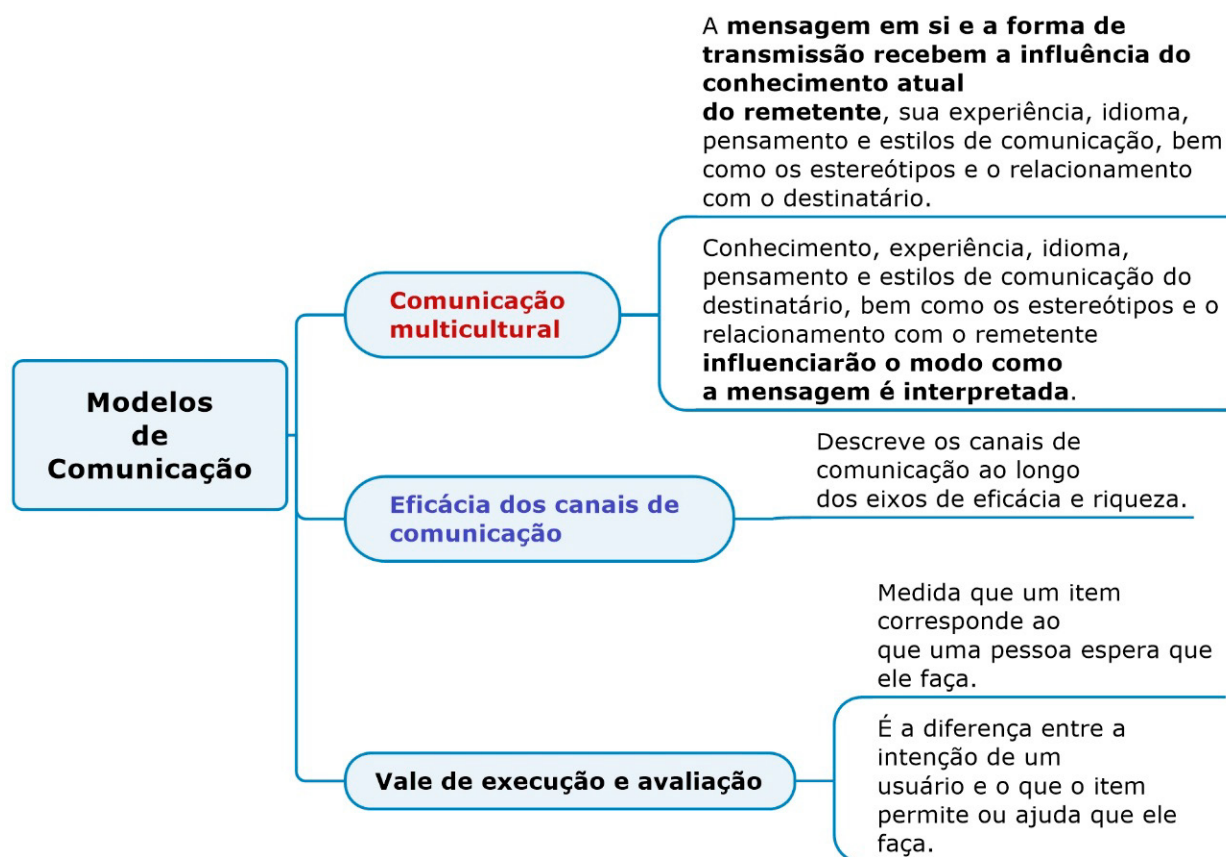


Fonte: Elaboração Própria (2022).

7.4.1. MODELOS MOTIVACIONAIS

As pessoas têm melhor desempenho quando estão motivadas, e as pessoas são motivadas por coisas diferentes. Exemplos de modelos dessa categoria:

Modelos motivacionais

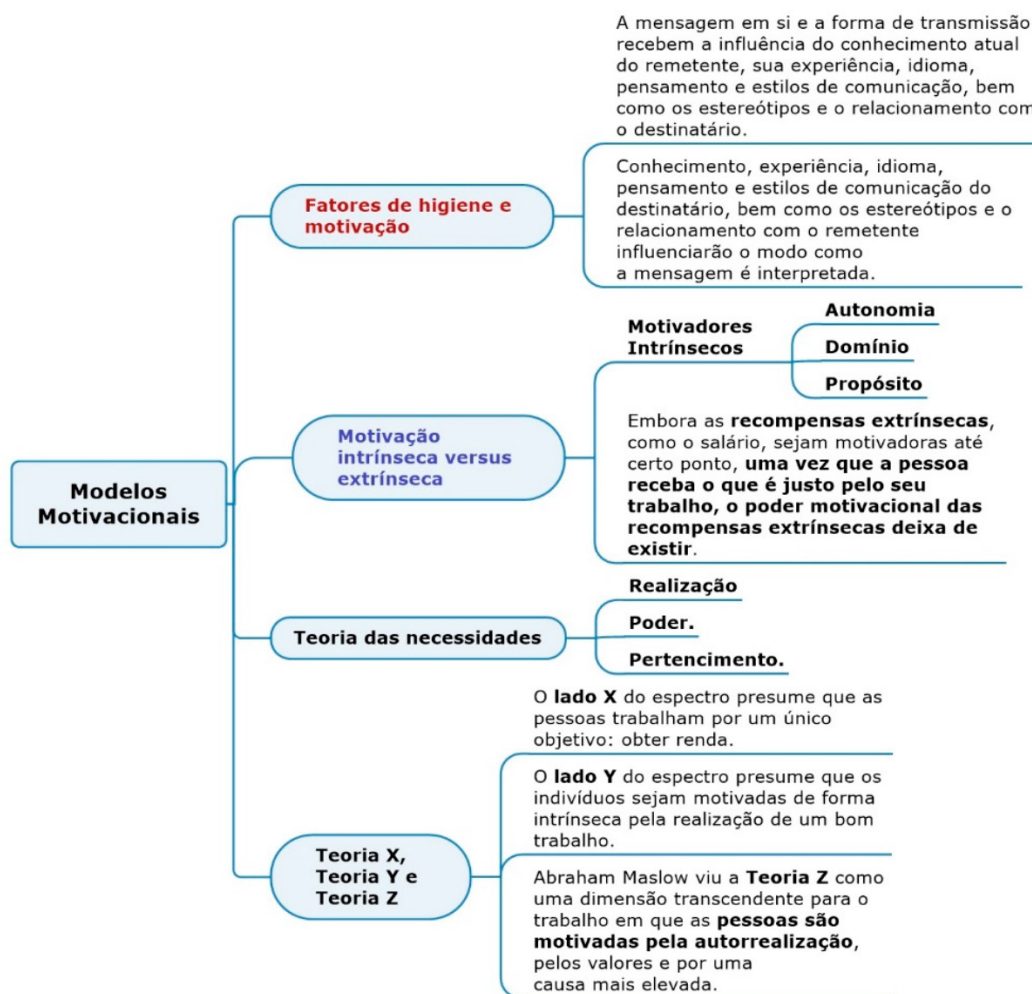

7.4.2. MODELOS DE MUDANÇA

Muitos projetos trazem um aspecto de mudança de sistemas, comportamentos, atividades e, às vezes, culturas. O gerenciamento deste tipo de mudança requer refletir sobre como fazer a transição do atual para o futuro estado desejado.

Exemplos de modelos de mudança:

- Modelo ADKAR®;
- Processo de 8 etapas para liderar a mudança;
- Modelo de mudança Virginia Satir;
- Modelo de transição.

7.4.3. MODELOS DE COMPLEXIDADE

Os projetos existem em um estado de ambiguidade e exigem interações entre vários sistemas, muitas vezes com resultados incertos. A complexidade é um desafio com o qual devemos trabalhar.

Exemplos de modelos de complexidade:

- **Framework Cynefin:** ajuda a identificar comportamentos como sondar, sentir, responder, agir e categorizar, e isto pode ajudar a influenciar as relações entre as variáveis e guiar as ações;
- **Matriz de Stacey:** analisa duas dimensões para determinar a complexidade relativa de um projeto:
 - (a) a incerteza relativa dos requisitos para a entrega, e
 - (b) a incerteza relativa de que a tecnologia será usada para criar a entrega.

7.4.4. MODELOS DE DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE DO PROJETO

As equipes do projeto passam por diferentes estágios de desenvolvimento. Conhecer o estágio da equipe neste desenvolvimento ajuda os gerentes de projeto a apoiar a equipe do projeto e o seu crescimento.

Veja dois exemplos de modelos dessa categoria:

- **Escada de Tuckman:** articulou os estágios de desenvolvimento da equipe como **formação, conflito, acordo e desempenho**. Muitas pessoas acrescentam um quinto estágio: **dispersão**. Neste modelo, a cultura da equipe começa no estágio de formação e evolui ao longo dos demais estágios de desenvolvimento;
- **Modelo Drexler/Sibbet de desempenho da equipe.**

7.4.5. OUTROS MODELOS

- **Modelo de conflito:** temer o conflito pode restringir a comunicação e a criatividade. No entanto, o conflito também pode trazer prejuízos;
- **Modelos de negociação,** como ganha-ganha, ganha-perde/perde-ganha, perde-perde;
- **Planejamento:** Barry Boehm desenvolveu um modelo que compara o tempo e o esforço investido no desenvolvimento de planos para reduzir o risco, incluindo o atraso e outros custos associados ao excesso de planejamento. Ao dedicar mais tempo para planejar com antecedência, muitos projetos podem reduzir a incerteza, a supervisão e o retrabalho;

• **Grupos de processo:**

- Os **processos do gerenciamento de projetos** podem ser **organizados** em **agrupamentos lógicos de entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do gerenciamento de projetos**, com *tailoring* para atender às necessidades da organização, das partes interessadas e do projeto;
- Os **grupos de processos não** são fases do projeto;
- Eles **interagem com cada fase de um ciclo de vida do projeto**. Talvez, todos esses processos podem ocorrer em uma única fase;
- Os **processos podem ser repetidos dentro de uma fase ou ciclo de vida**. O número de iterações e as interações entre processos variam de acordo com as necessidades do projeto;
- Os projetos que seguem uma abordagem com base em processo podem usar os seguintes **cinco grupos de processo** com uma estrutura organizacional:

Iniciação	Processos para definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente, através da obtenção de autorização para iniciar o projeto ou fase.
Planejamento	Processos para definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e desenvolver o curso de ação necessário para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado.
Execução	Os processos para concluir o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer os requisitos do projeto.
Monitoramento e controle	Os processos para acompanhar, analisar e regular o progresso e o desempenho do projeto, identificar todas as áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e iniciar as mudanças correspondentes.
Encerramento	Os processos para concluir ou encerrar formalmente um projeto, uma fase ou contrato.

- **Modelo de relevância:** trata as partes interessadas.

7.4.6. MODELOS APLICADOS NOS DOMÍNIOS DE DESEMPENHO

Modelo	Domínio de desempenho							
	Equipe	Partes interessadas	Desenvolvimento e ciclo de vida	Planejamento	Trabalho do projeto	Entrega	Medição	Incerteza
Modelos de liderança situacional:								
Liderança Situacional® II	X				X			
OSCAR	X				X			
Modelos de comunicação:								
Comunicação multicultural	X	X		X	X			
Eficácia dos canais de comunicação	X	X		X	X			
Vale de execução e avaliação		X				X		
Modelos motivacionais:								
Fatores de higiene e motivação	X			X	X			
Motivação intrínseca vs extrínseca	X			X	X			
Teoria das necessidades	X			X	X			
Teoria X, Teoria Y e Teoria Z	X			X	X			
Modelos de mudança:								
Gerenciamento de mudança nas organizações		X		X	X			
ADKAR®		X		X	X			
Processo de 8 etapas para mudança antecipada		X		X	X			
Transição		X		X	X			
Modelos de complexidade:								
Framework Cynefin			X	X	X	X		X
Matriz Stacey			X	X	X	X		X
Modelos de desenvolvimento da equipe do projeto:								
Escada de Tuckman	X				X			
Modelo Drexler/Sibbet de desempenho da equipe	X				X			
Outros modelos:								
Conflito	X	X			X			
Negociação		X		X	X	X		
Planejamento			X	X	X			
Grupos de processo				X	X	X	X	
Saliência		X		X	X			

7.4.7. MÉTODOS MAIS USADOS

O **método** define um meio de alcançar um resultado, saída ou entrega do projeto. A seguir, destacamos uma amostragem dos mais usados para apoiar o trabalho do projeto.

7.4.7.1. COLETA E ANÁLISE DE DADOS

Usados para **coletar**, **analisar** e **avaliar** dados e informações para obter uma compreensão mais profunda de uma situação.


Métodos de coleta e análise de dados



Fonte: Elaboração própria (2022).

7.4.7.2. ESTIMATIVA

Utilizados para se obter uma **medida aproximada do trabalho, tempo ou custo em um projeto.**

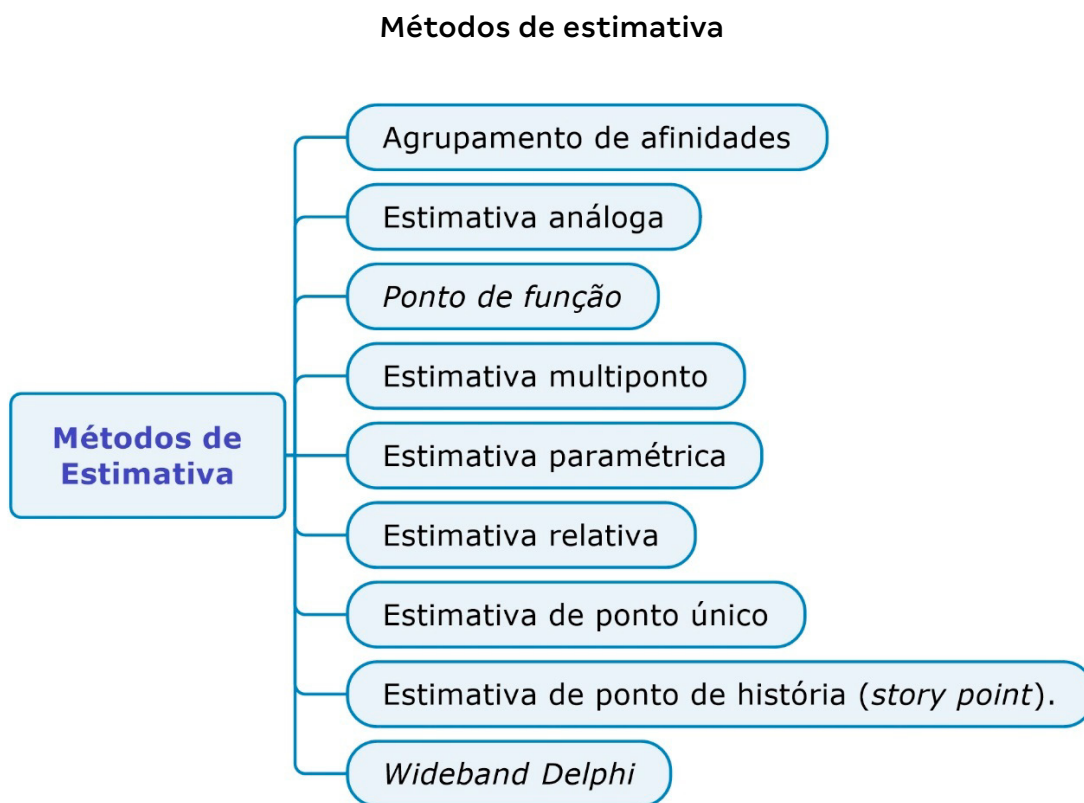


Fonte: Elaboração própria (2022).

7.4.7.3. REUNIÕES E EVENTOS

As reuniões são um meio importante para engajar a equipe do projeto e outras partes interessadas. São os principais meios de comunicação em todo o projeto.


Métodos de reuniões e eventos

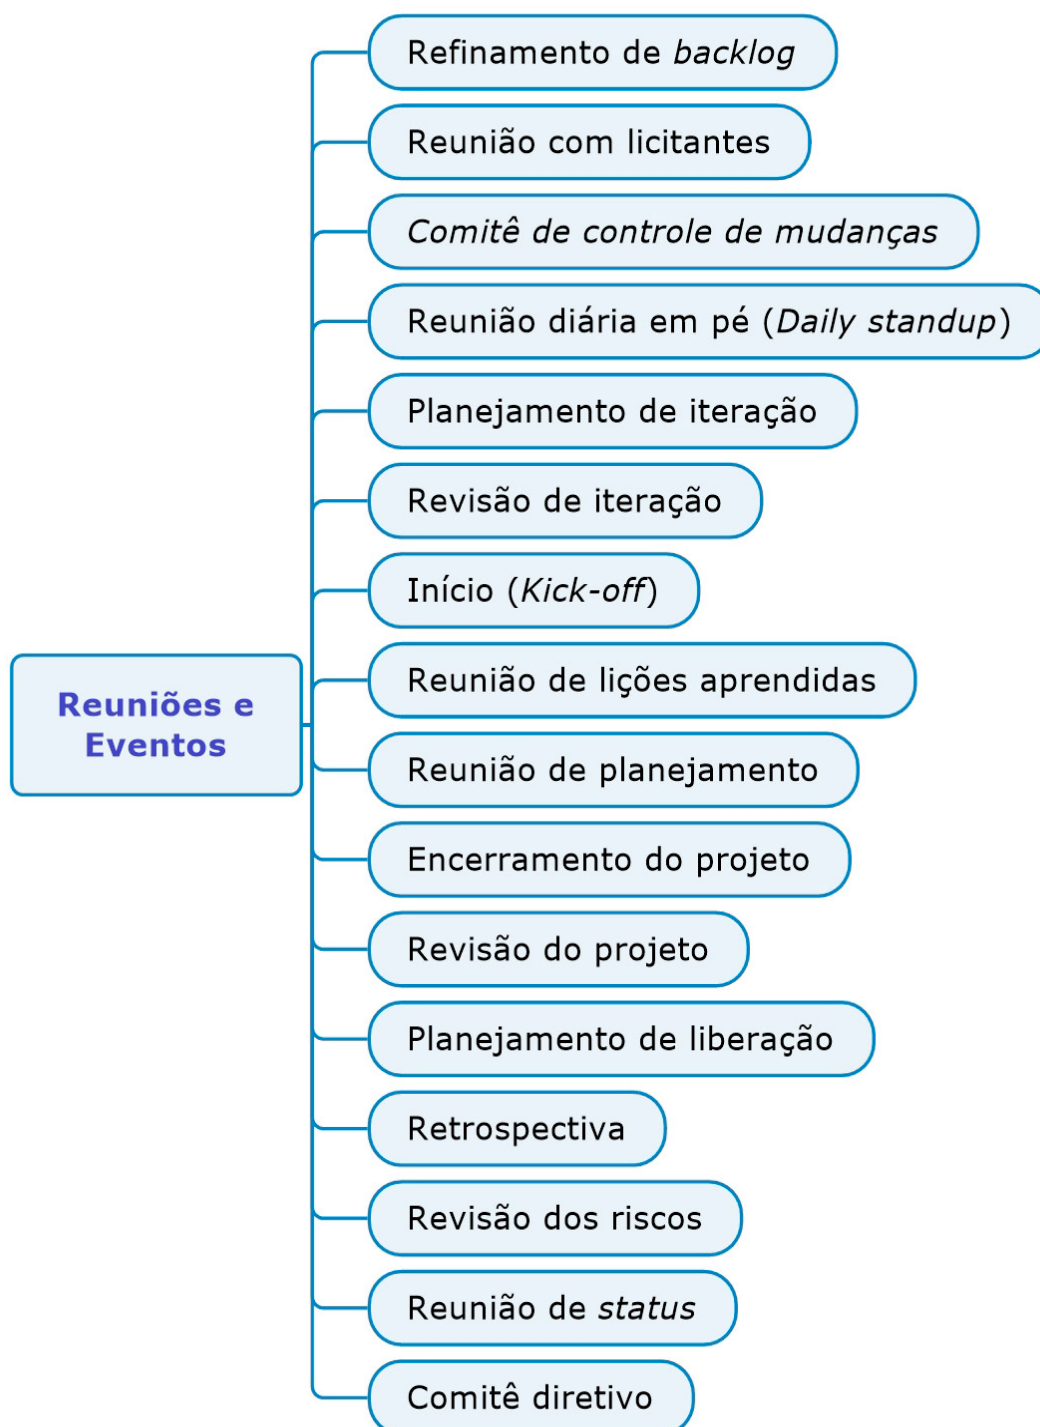

Fonte: Elaboração própria (2022).

7.4.7.4. OUTROS MÉTODOS

Os métodos aqui descritos não se enquadram em uma categoria específica; no entanto, são métodos comuns, usados para diversas finalidades em projetos.

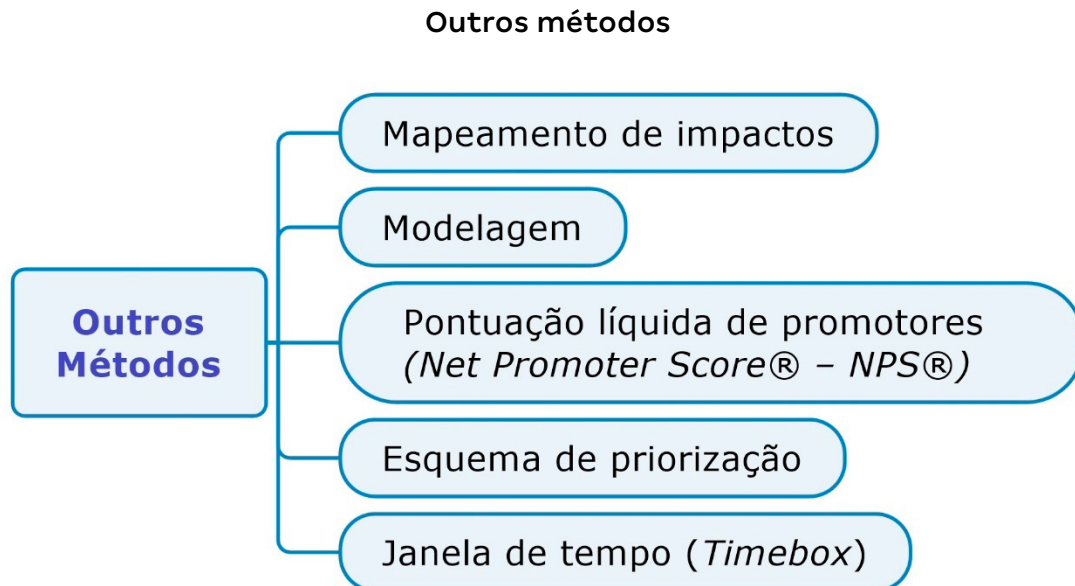

Fonte: Elaboração própria (2022).

7.4.8. MODELOS APLICADOS NOS DOMÍNIOS DE DESEMPENHO

Mapeamento dos métodos com probabilidade de uso
em cada domínio de desempenho (PMBOK 7)

Método	Domínio de desempenho							
	Equipe	Partes Interessadas	Desenvolvimento e ciclo de vida	Planejamento	Trabalho do projeto	Entrega	Medição	Incerteza
Métodos de coleta e análise de dados:								
Análise de alternativas				X	X	X		X
Análise de premissas e restrições				X		X		X
<i>Benchmarking</i>						X	X	
Análise da justificativa do negócio				X			X	
Período de retorno			X	X			X	
Taxa interna de retorno				X			X	
Retorno do investimento				X			X	
Valor presente líquido			X	X		X	X	
Relação de custo-benefício				X			X	
Folha de verificação						X	X	
Custo da qualidade				X		X	X	
Análise da árvore de decisão				X				
Análise do valor agregado				X			X	
Valor monetário esperado				X				
Previsão							X	
Diagrama de influência				X				
Avaliação do ciclo de vida				X				
Análise de fazer ou comprar				X	X			
Matriz de probabilidade e impacto				X				X
Análise de processo				X	X	X	X	
Análise de regressão				X			X	
Análise de causa-raiz					X	X		
Análise de sensibilidade				X	X	X		
Simulação				X			X	
Análise das partes interessadas		X		X	X			
Análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT)				X				X
Análise de tendências							X	
Mapeamento da cadeia de valor				X	X	X		
Análise de variação							X	
Análise de cenário e-se				X				X

Mapeamento dos métodos com probabilidade de uso
em cada domínio de desempenho (PMBOK 7)

Método	Domínio de desempenho							
	Equipe	Partes Interessadas	Desenvolvimento e ciclo de vida	Planejamento	Trabalho do projeto	Entrega	Medição	Incerteza
Métodos de estimativa:								
Agrupamento de afinidades				X				
Estimativa análoga				X				
Pontos de função				X				
Estimativa multiponto				X				
Estimativa paramétrica				X				
Estimativa relativa				X				
Estimativa de ponto único				X				
Estimativa de ponto de história				X				
Wideband Delphi				X				
Métodos de reuniões e eventos:								
Refinamento de backlog		X		X	X	X		
Reunião com licitantes		X		X	X			
Comitê de controle de mudanças					X	X		
Reunião diária em pé				X	X			
Revisão de iteração		X			X	X		
Planejamento de iteração		X		X	X	X		
Início	X	X			X			
Lições aprendidas		X		X	X	X		
Planejamento				X				
Encerramento do projeto	X	X			X			
Revisão do projeto		X			X	X	X	
Planejamento de liberação		X		X				
Retrospectiva	X			X				
Revisão dos riscos					X			X
Status					X		X	
Comitê diretivo		X			X			
Outros métodos:								
Mapeamento de impactos	X	X		X		X	X	
Modelagem						X		
Pontuação líquida de promotores (NPS®)		X					X	
Esquema de priorização		X			X			
Janela de tempo			X	X	X	X	X	

7.4.9. ARTEFATOS DE USO MAIS COMUM

7.4.9.1 ARTEFATOS DE ESTRATÉGIA

Documentos criados antes ou no início do projeto que tratam de informações estratégicas, de negócio ou de alto nível sobre o projeto.

São desenvolvidos no início de um projeto e normalmente não mudam, embora possam ser revisados ao longo do projeto.

Business case	Proposta de valor de um projeto apresentado.
Business model canvas	Resumo visual de uma página.
Resumo do projeto	Visão geral de alto nível das metas, entregas e processos do projeto.
Termo de abertura do projeto	Documento que autoriza formalmente a existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto.
Declaração de visão do projeto	Descrição concisa e de alto nível do projeto.
Roadmap	Cronograma de alto nível que descreve itens como marcos, eventos significativos, revisões e pontos de decisão.

7.4.9.2. HISTÓRICOS E REGISTROS

Usados para registrar os aspectos em evolução do projeto.

Registro de premissas	Registra todas as premissas (fator considerado verdadeiro, real ou certo, sem necessidade de prova ou demonstração) e restrições (fator que limita as opções de gerenciamento de um projeto, programa, portfólio ou processo) durante o projeto.
Backlog	Lista ordenada de tarefas do projeto a serem executadas.
Registro das mudanças	Lista abrangente das mudanças apresentadas durante o projeto e seu status atual.
Registro das questões	Uma condição ou situação atual que pode afetar os objetivos do projeto.
Registro das lições aprendidas	Registro do conhecimento adquirido durante um projeto, fase ou iteração.
Backlog ajustado ao risco	Inclui o trabalho e as ações para lidar com ameaças e oportunidades.
Registro dos riscos	Repositório no qual são registradas as saídas de processos de gerenciamento dos riscos.
Registro das partes interessadas	Registra informações sobre as partes interessadas do projeto, incluindo avaliação e classificação das partes interessadas do projeto.

7.4.9.3. PLANOS

Meios propostos para se realizar algo. Em geral, os planos são documentos escritos, mas também podem ser refletidos nos quadros visuais/virtuais.

Plano de controle de mudanças	Estabelece o comitê de controle de mudanças , documenta a extensão de sua autoridade e descreve como o sistema de controle de mudanças será implementado.
Plano de gerenciamento das comunicações	Descreve como, quando e por quem as informações sobre o projeto são administradas e disseminadas.
Plano de gerenciamento dos custos	Descreve como os custos serão planejados, estruturados e controlados.
Plano de iteração	Plano detalhado para a iteração atual.
Plano de gerenciamento das aquisições	Descreve como a equipe do projeto adquirirá produtos e serviços fora da organização executora.
Plano de gerenciamento do projeto	Documento que descreve como o projeto será executado, monitorado, controlado e encerrado.
Plano de gerenciamento da qualidade	Descreve como políticas, procedimentos e diretrizes aplicáveis serão implementados para alcançar os objetivos de qualidade.
Plano de liberação (Release plan)	Define as expectativas de datas, características e/ou resultados que devem ser entregues ao longo de várias iterações.
Plano de gerenciamento dos requisitos	Descreve como os requisitos serão analisados, documentados e gerenciados.
Plano de gerenciamento dos recursos	Descreve como recursos do projeto são adquiridos, alocados, monitorados e controlados.
Plano de gerenciamento dos riscos	Descreve como as atividades de gerenciamento de riscos serão estruturadas e executadas.
Plano de gerenciamento do escopo	Descreve como o escopo será definido, desenvolvido, monitorado, controlado e validado.
Plano de gerenciamento do cronograma	Estabelece os critérios e as atividades para o desenvolvimento, monitoramento e controle do cronograma.
Plano de engajamento das partes interessadas	Identifica as estratégias e ações necessárias para promover o envolvimento produtivo das partes interessadas na decisão ou execução do projeto ou programa.
Plano de testes	Descreve as entregas que serão testadas, os testes que serão realizados e os processos que serão aplicados nos testes.

7.4.9.4. GRÁFICOS DE HIERARQUIA

São gráficos que começam com informações de alto nível, progressivamente decompostas em níveis mais baixos de detalhes.

Estrutura analítica organizacional	Ilustra o relacionamento entre as atividades do projeto e as unidades organizacionais que executarão tais atividades.
Estrutura analítica de produto	Uma estrutura hierárquica que reflete os componentes e as entregas de um produto.
Estrutura analítica dos recursos	Uma representação hierárquica dos recursos, por categoria e tipo.
Estrutura analítica dos riscos	Uma representação hierárquica de potenciais fontes de riscos.
Estrutura analítica do projeto	A decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar as entregas exigidas.

7.4.9.5. LINHAS DE BASE

Representam a versão aprovada de um produto ou plano. O desempenho real é comparado às linhas de base para identificar variações.

Orçamento	A estimativa aprovada para o projeto ou qualquer componente de estrutura analítica do projeto (EAP) ou qualquer atividade do cronograma. Cronograma de marcos. Este tipo de cronograma apresenta marcos com datas planejadas.
Linha de base da medição do desempenho	Escopo, cronograma e linhas de base de custo integrados usados comparativamente para gerenciar, medir e controlar a execução do projeto.
Cronograma do projeto	Um resultado de um modelo de cronograma que demonstra a conexão de atividades com suas datas, durações, marcos e recursos planejados.
Linha de base do escopo	A versão aprovada de uma declaração de escopo, estrutura analítica do projeto (EAP) e dicionário da EAP associado, que pode ser mudada com a utilização de procedimentos formais de controle de mudanças e é usada como base para comparação com resultados reais.

7.4.9.6. DADOS E INFORMAÇÕES VISUAIS

Artefatos que organizam e apresentam dados e informações em um formato visual, como: **tabelas, gráficos, matrizes e diagramas**.

De modo geral, esses artefatos são produzidos depois da coleta e análise dos dados e que podem ajudar na tomada de decisões e na priorização.

Diagrama de afinidades	Apresenta ideias, classificadas em grupos, para revisão e análise.
Gráfico de burndown/burnup	Representação do trabalho restante em uma janela de tempo (timebox) ou do trabalho concluído para o lançamento de um produto ou entrega do projeto.

Diagrama de causa e efeito	Ajuda a rastrear um efeito indesejável até sua causa raiz.
Diagrama de fluxo cumulativo (DFC)	Gráfico que indica as funcionalidades concluídas ao longo do tempo, funcionalidades em outros estados de desenvolvimento e em <i>backlog</i> .
Gráfico de tempo de ciclo	Mostra o tempo médio de ciclo dos itens de trabalho concluídos ao longo do tempo.
Painel de controle	Conjunto de tabelas e gráficos que mostram o progresso ou desempenho em relação a métricas importantes do projeto.
Fluxograma	Diagrama das entradas, ações do processo e saídas de um ou mais processos em um sistema.
Gráfico de Gantt	Gráfico de barras com informações de cronograma em que as atividades são listadas no eixo vertical, as datas são mostradas no eixo horizontal, e as durações das atividades aparecem como barras horizontais posicionadas de acordo com as datas de início e término.
Histograma	Gráfico de barras que mostra a representação gráfica de dados numéricos.
Irradiador de informações	Um quadro físico visível que fornece informações para o resto da organização, permitindo o compartilhamento oportuno de conhecimento.
Gráfico de tempo de entrega	Mostra a tendência do tempo de entrega médio de conclusão de itens no trabalho ao longo do tempo.
Matriz de priorização	Diagrama de dispersão em que o esforço é mostrado no eixo horizontal e o valor no eixo vertical dividido em quatro quadrantes para classificar os itens por prioridade.
Diagrama de rede do cronograma do projeto	Mostra os relacionamentos lógicos entre as atividades do cronograma do projeto.
Matriz de rastreabilidade dos requisitos	Tabela que liga os requisitos dos produtos desde as suas origens até as entregas que os satisfazem.
Matriz de responsabilidades (MR)	Tabela que mostra os recursos do projeto alocados a cada pacote de trabalho.
Diagrama de dispersão	Gráfico que mostra o relacionamento entre duas variáveis.
Curva S	Gráfico que exibe custos cumulativos durante determinado prazo.
Matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas	Compara os níveis de engajamento atual e desejado das partes interessadas.
Mapa de histórias (Story map)	Modelo visual de todos os recursos e funcionalidades desejados para determinado produto.
Gráfico de produtividade (Throughput chart)	Mostra as entregas aceitas ao longo do tempo.
Caso de uso	Descreve e explora como um usuário interage com um sistema para atingir um objetivo específico.
Mapeamento da cadeia de valor	Usado para documentar, analisar e melhorar o fluxo de informações ou materiais necessários para gerar um produto ou serviço para um cliente.
Gráfico de velocidade	Controla a taxa na qual as entregas são produzidas, validadas e aceitas dentro de um intervalo predefinido.

7.4.9.7. RELATÓRIOS

Registros formais ou resumos de informações.

Relatório de qualidade	Documento de projeto que inclui questões de gerenciamento da qualidade, recomendações de ações corretivas e um resumo das conclusões das atividades de controle da qualidade.
Relatório de riscos	Desenvolvido progressivamente durante os processos de gerenciamento dos riscos. Resume as informações sobre cada risco do projeto e o nível de risco geral do projeto.
Relatório de status	Fornece um relatório sobre o status atual do projeto.

7.4.9.8. ACORDOS E CONTRATOS

Acordo é qualquer documento ou comunicação que define as intenções das partes. Nos projetos, os acordos assumem a forma de contratos ou outros entendimentos definidos.

Contratos de preço fixo	Envolve a definição de um preço fixo total para determinado produto ou serviço, ou resultado a ser fornecido.
Contratos de custos reembolsáveis	Envolve pagamentos ao fornecedor por todos os custos reais incorridos do trabalho concluído, acrescidos de uma remuneração que corresponde ao lucro do fornecedor.
Tempo e materiais (T&M)	Este contrato estabelece uma taxa fixa, mas não uma especificação precisa do trabalho. Pode ser usado para aumento de pessoal, especialista no assunto ou outro suporte externo.
Entrega indefinida, quantidade indefinida (EIQI)	Contrato que estabelece uma quantidade não especificada de bens ou serviços, com um limite superior e um inferior, durante um período fixo.
Outros acordos	Outros tipos de acordo incluem memorando de entendimento (MOU), memorando de acordo (MOA), acordo de nível de serviço (SLA), acordo básico de pedidos (BOA), etc.

7.4.9.9. OUTROS ARTEFATOS

Os documentos e entregas aqui descritos não se enquadram em uma categoria específica; mas são artefatos importantes, usados para várias finalidades.

Lista de atividades	Documenta as atividades do cronograma para que os membros da equipe do projeto compreendam que trabalho deverá ser realizado.
Documentos de licitação	Usados para solicitar propostas dos fornecedores em potencial.
Métricas	Descrevem um atributo e como medi-lo.

Calendário do projeto	Identifica os dias úteis e os turnos disponíveis para as atividades definidas no cronograma.
Documentação dos requisitos	Registra os requisitos do produto e as informações relevantes necessárias para gerenciar os requisitos.
Termo de abertura da equipe do projeto	Registra valores, acordos e diretrizes operacionais da equipe do projeto e estabelece expectativas claras com relação ao comportamento aceitável dos membros da equipe do projeto.
História de usuário	Breve descrição de um resultado para um usuário específico, com a promessa de uma conversa futura para explicar detalhes.

7.4.10. ARTEFATOS APLICADOS NOS DOMÍNIOS DE DESEMPENHO

Artefato	Domínio de desempenho							
	Equipe	Partes Interessadas	Desenvolvimento e ciclo de vida	Planejamento	Trabalho do projeto	Entrega	Medição	Incerteza
Artefatos de estratégia:								
Business case		X		X				
Resumo do projeto		X		X				
Termo de abertura do projeto		X		X				
Declaração de visão do projeto		X		X				
Roadmap		X	X	X				
Artefatos de histórico e registro:								
Registro de premissas				X	X	X		X
Backlog				X	X	X		
Registro das mudanças					X	X		
Registro das questões					X			
Registro das lições aprendidas					X			
Backlog ajustado ao risco				X				X
Registro dos riscos				X	X	X		X
Registro das partes interessadas		X		X				
Artefatos de planos:								
Plano de controle de mudanças				X	X	X		
Plano de gerenciamento das comunicações		X		X	X			
Plano de gerenciamento dos custos				X				
Plano de iteração				X				
Plano de gerenciamento das aquisições				X	X			
Plano de gerenciamento do projeto		X		X	X			
Plano de gerenciamento da qualidade				X	X	X		
Plano de liberação				X		X		
Plano de gerenciamento dos requisitos				X		X		
Plano de gerenciamento dos recursos				X	X			
Plano de gerenciamento dos riscos				X	X			X
Plano de gerenciamento do escopo				X		X		

8. PATROCINADOR DO PROJETO

- Dependendo da organização, em geral, cada projeto tem um patrocinador;
- Segundo PMBOK 7, o **patrocinador do projeto** atua como **líder de decisões** que estão fora da autoridade e do poder da posição do gerente e da equipe do projeto;
- O envolvimento e a supervisão ativos de um patrocinador do projeto apoiam o gerente do projeto, a equipe do projeto e, por fim, conduzem aos resultados do projeto;
- O patrocinador também vincula a equipe do projeto à estratégia e à visão geral no nível executivo da organização;
- O elo estratégico proporcionado pelo patrocinador capacita e habilita a equipe do projeto a otimizar o seu desempenho, mantendo o alinhamento à **estratégia da organização**;
- Entre outras, os patrocinadores desempenham as seguintes funções:
 - transmitem a visão, as metas e expectativas à equipe;
 - defendem o projeto e a equipe;
 - facilitam as decisões do nível executivo;
 - ajudam a garantir os recursos;
 - mantêm os projetos alinhados aos objetivos do negócio;
 - removem obstáculos;
 - resolvem problemas que ficam além da autoridade da equipe do projeto;
 - apresentam oportunidades que surgem durante o projeto à gerência sênior;
 - monitoram os resultados do projeto após o encerramento para assegurar que os benefícios para o negócio são percebidos.


RESUMO

Vamos às alterações no Guia PMBOK 7:

- Esta edição do *Guia PMBOK* tem **ênfoque nos resultados da entrega**, **sem** considerar a abordagem usada pela equipe do projeto;
- A mudança de um padrão baseado em processo para outro, baseado em **princípios**, necessita de uma abordagem diferente para tratar os vários aspectos do gerenciamento de projetos. Assim, **os domínios de desempenho de projetos representam um grupo de atividades relacionadas, essenciais para a entrega eficaz dos resultados do projeto**. Neste guia existem **OITO DOMÍNIOS DE DESEMPENHO DE PROJETOS**;
- **Tailoring** é a adaptação deliberada da abordagem, da governança e dos processos do gerenciamento de projetos para torná-los mais adequados a determinado ambiente e ao trabalho a realizar. O processo de *tailoring* é conduzido pelos princípios orientadores do gerenciamento de projetos, da cultura e dos valores organizacionais;
- A **nova 7ª edição do PMBOK®** traz as abordagens ágeis, adaptativas e híbridas (mistura das tradicionais com as ágeis) **para dentro dos possíveis contextos e cenários aos quais os projetos possam estar inseridos**;
- O **profissional de gestão de projetos deverá estar mais alinhado às questões de estratégia das organizações**. Suas habilidades devem transitar verticalmente e horizontalmente e devem ter uma atitude flexível frente aos desafios que projetos de inovação trazem, saber trabalhar as demandas x dificuldades para atuar como um alto gestor com orientado para resultados;
- A **6ª edição do PMBOK** destacava **10 áreas de conhecimento** em gerenciamento de projetos, que são:
 - Gerenciamento da **Integração** do Projeto;
 - Gerenciamento do **Escopo** do Projeto;
 - Gerenciamento do **Cronograma** do Projeto;
 - Gerenciamento dos **Custos** do Projeto;
 - Gerenciamento da **Qualidade** do Projeto;
 - Gerenciamento dos **Recursos** do Projeto;
 - Gerenciamento da **Comunicação** do Projeto;
 - Gerenciamento dos **Riscos** do Projeto;
 - Gerenciamento das **Aquisições** do Projeto; e
 - Gerenciamento das **Partes Interessadas**;
- **Essas áreas de conhecimento deixam de existir** de forma direta no **PMBOK 7** e **entram os Domínios de Desempenho do Projeto (Project Performance Domains)**, que é **um grupo de atividades direcionadas à efetiva entrega de resultados e que inclui importantes práticas de gestão para um gerenciamento de projetos eficaz**;


- O guia **não** contempla mais os exemplos das ferramentas e técnicas. Cria uma plataforma interativa intitulada *PMIstandarts+™* para disponibilizar esse conteúdo;
- Os profissionais que já são certificados não serão prejudicados uma vez que não perderão sua validade, assim como os critérios para manutenção serão mantidos.

Revisão do padrão de gerenciamento de projetos e a migração da sexta para a sétima edição do Guia PMBOK®, e a plataforma de conteúdo digital do PMIstandards+™

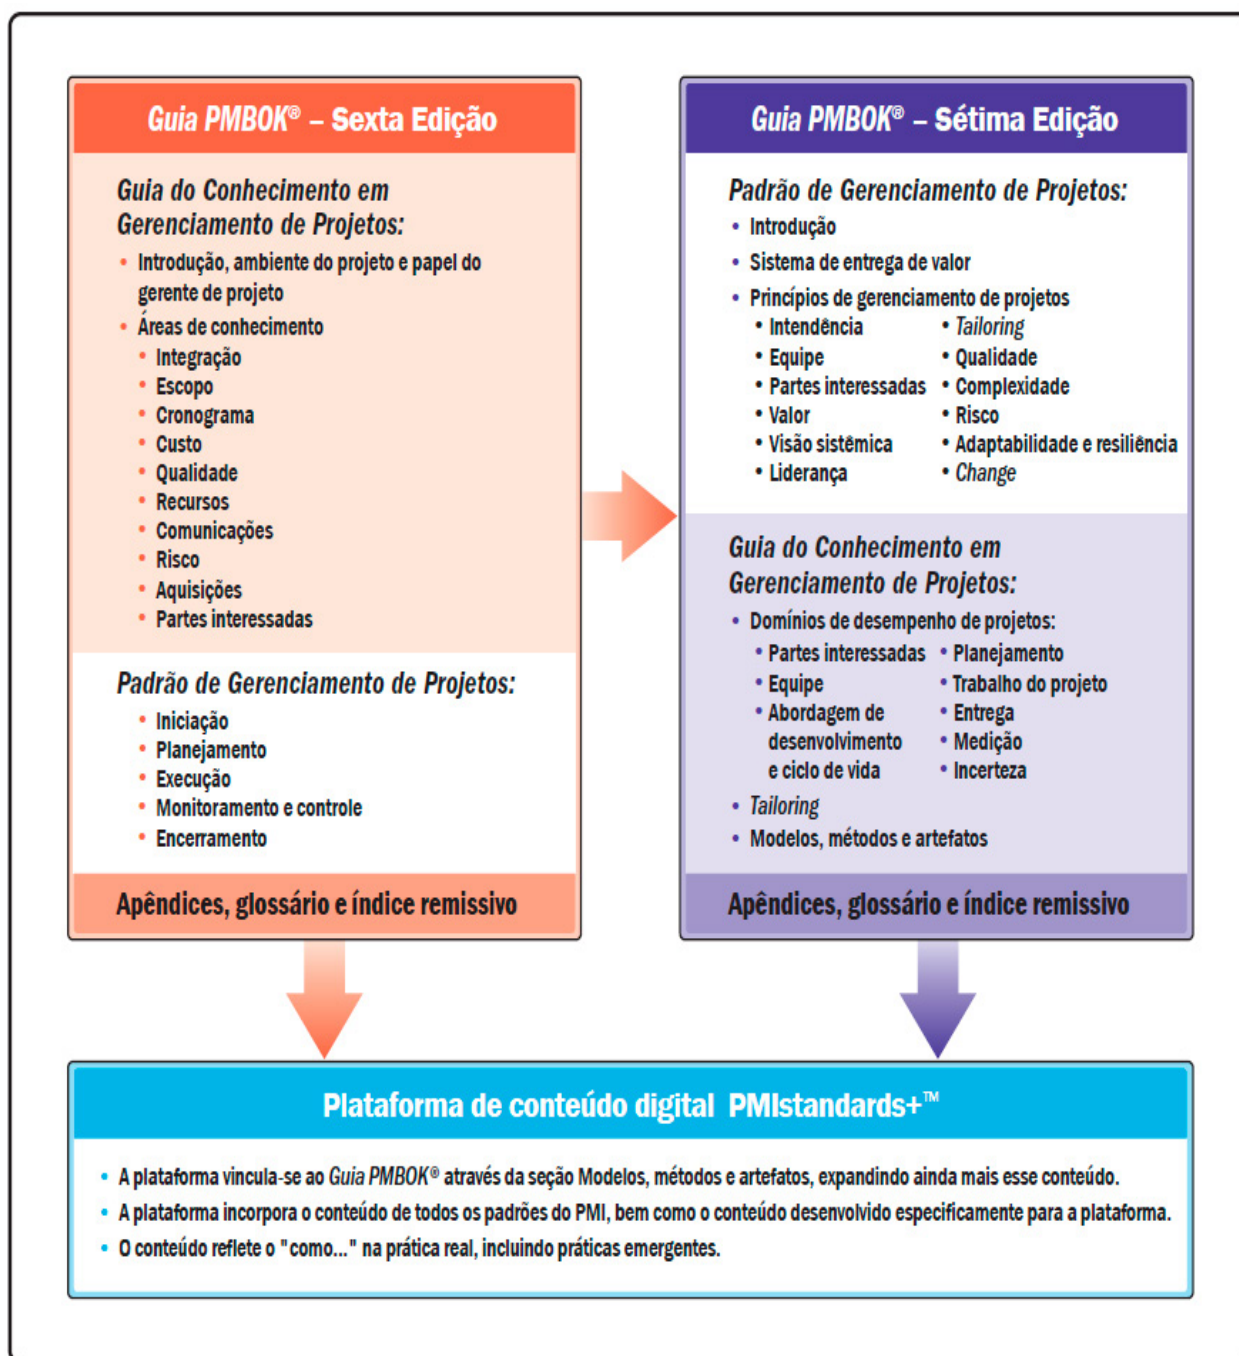


Fonte: PMBOK 7 (2021).

Os 12 princípios do PMBOK 7

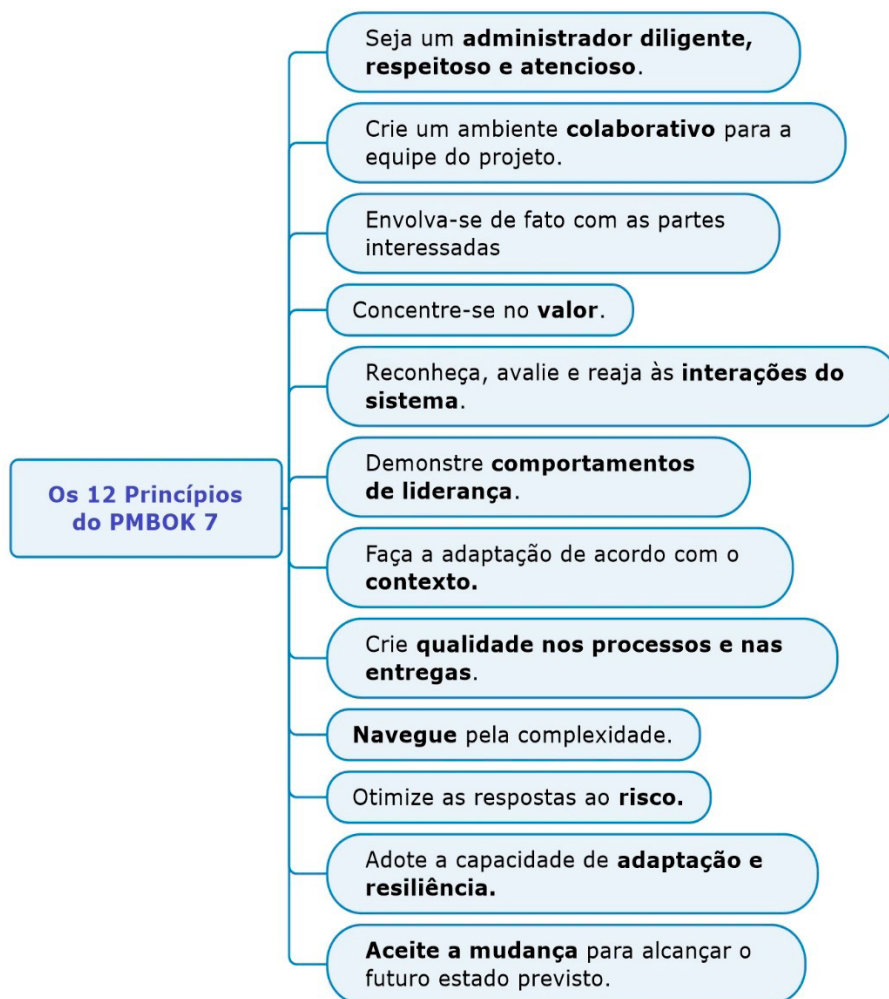

Fonte: Elaboração própria (2025).

Sobreposição dos princípios dos gerenciamentos de projetos e gerais

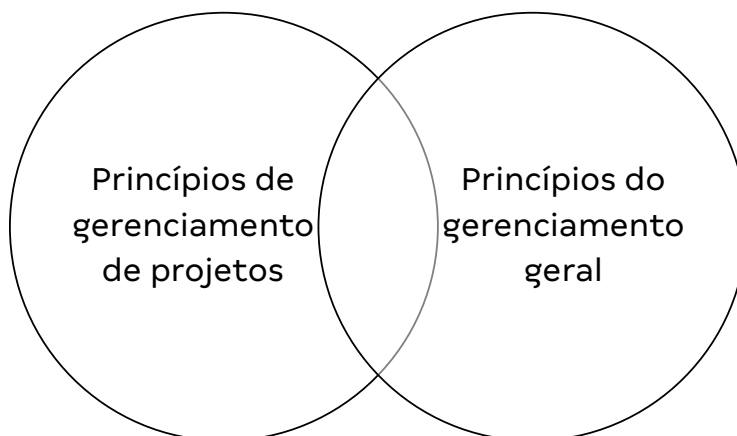

QUESTÕES COMENTADAS EM AULA

001. (FCC/SABESP/TÉCNICO EM GESTÃO 01/2018) Considerando-se a definição apresentada pelo PMI (Project Management Institute), são atributos de um projeto

- a) o objetivo definido e o uso de vários recursos disponíveis para a sua consecução.
- b) o esforço único e as tarefas dependentes e repetitivas.
- c) a vida finita e a flexibilização dos objetivos em decorrência do andamento do projeto.
- d) a independência de tarefas e a variação do prazo em decorrência da necessidade dos recursos.
- e) o grau de incerteza e o esforço cíclico.

002. (CESPE/TRT 7ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2017) Considere que, para atingir os objetivos estratégicos, uma organização desenvolva os seus projetos com base no guia PMBOK. Nesse caso, se o gestor pretende acessar a coleção de projetos do setor de recursos humanos (RH), ele deverá acessar

- a) o sistema de RH.
- b) o portfólio de projetos.
- c) os projetos.
- d) os requisitos do projeto.

003. (CESPE/TJ-SE/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2014/ADAPTADA) Com base no disposto no PMBOK (Project Management Body of Knowledge Guide), 7ª edição, julgue o item seguinte.

Os projetos e programas de um portfólio devem ser agrupados a fim de propiciar o alcance dos objetivos estratégicos da organização, por isso, devem estar, necessariamente, diretamente relacionados.

004. (INÉDITA/2022) O Guia PMBOK 7 passou a abordar os sete domínios de desempenho de projetos que compõem um sistema integrado para viabilizar a entrega bem-sucedida do projeto e os resultados pretendidos.

005. (FGV/IBGE/ANÁLISE DE SISTEMAS/SUORTE OPERACIONAL/2016/ADAPTADA) Marcos, gerente do projeto de atualização do parque tecnológico de uma grande corporação, concluiu a construção da Estrutura Analítica do Projeto (EAP). Assim, é correto afirmar que Marcos identificou:

- a) o caminho crítico do projeto
- b) as dependências entre as atividades
- c) as entregas do projeto
- d) as entregas para o cliente
- e) as estimativas de recursos necessários ao projeto

006. (FCC/TRE-SP/ANALISTA JUDICIÁRIO/2017/ADAPTADA) A literatura aponta um claro *discrimen* entre as atividades rotineiras de uma organização e aquelas que são caracterizadas como projetos. Esse conceito restou sintetizado em uma das principais publicações do Project Management Institute – PMI, o PMBOK, que define projeto como um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Um dos conceitos apresentados pelo PMBOK7 é a Estrutura Analítica do Projeto – EAP, que pode ser entendida como

- a) a alocação do projeto dentro das prioridades da organização e sua consequente hierarquização.
- b) o mapeamento dos pontos críticos do projeto, denominados “bottlenecks” (gargalos).
- c) a descrição detalhada do projeto e do produto ou serviço resultante, correspondente ao seu escopo.
- d) a subdivisão das entregas e do trabalho a ser executado pela equipe envolvida no projeto, até sua menor divisão, denominada “pacotes de trabalho”.
- e) o fluxograma de todos os processos envolvidos na realização do projeto, com identificação da estimativa de tempo para cada tarefa.

EXERCÍCIOS

007. (CESP/CEBRASPE/MPO/ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/2024) Julgue o item a seguir, relativos ao gerenciamento de projetos.

Os domínios de desempenho de projetos — partes interessadas, equipe, abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida, planejamento, trabalho do projeto, entrega, medição e incerteza — são independentes entre si, podendo ser tratados de forma isolada durante a execução do projeto.

008. (CESPE/CEBRASPE/MPO/ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/2024) Julgue o item a seguir, relativos ao gerenciamento de projetos.

As demandas e tendências atuais do gerenciamento de projetos ocasionaram as seguintes mudanças: a transição de um padrão embasado em processos para um padrão embasado em princípios; a adoção de uma visão de sistemas de gerenciamento de projetos; o reconhecimento da relevância contínua do Guia PMBOK®; e a necessidade de um profissional com perfil menos descritivo e mais pautado em princípios

009. (CEBRASPE/CESPE/MPO/ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Com relação ao arcabouço de gerenciamento de projetos, julgue o item que se segue.

Envolvimento das partes interessadas, ambiente colaborativo, enfoque no valor e tailoring são alguns dos princípios do gerenciamento de projetos segundo o PMBOK7.

010. (CESPE/CEBRASPE/ITAIPU/PROFISSIONAL NÍVEL UNIVERSITÁRIO JÚNIOR/2024) Julgue os itens a seguir, tendo como referência o sistema de entrega de valor apresentado no Guia PMBOK, 7ª edição.

I – Os sistemas de governança fornecem uma estrutura integrada para avaliar mudanças e riscos associados aos componentes de um sistema de entrega de valor.

II – Para garantir a integridade de um sistema de governança, as operações de projetos estão restritas a programas ou portfólios.

III – Os componentes de um sistema de entrega de valor produzem resultados que criam benefícios percebidos pela organização; esses benefícios criam valor, ou seja, a vantagem, a importância ou a utilidade de algo.

IV – A coordenação centralizada se baseia na orientação e liderança de um gerente de projeto designado e não admite que equipes de projeto auto-organizadas atuem em partes do trabalho do projeto.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas os itens I e II estão certos.
- b) Apenas os itens I e III estão certos.
- c) Apenas os itens I e IV estão certos.
- d) Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

011. (VUNESP/ESFCEX/CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR/2023) A 7ª edição do Guia PMBoK traz inovações significativas com relação às seis edições anteriores, visando manter sua relevância frente às complexidades sociais.

Entre essas inovações, um dos conceitos que ganha destaque na gestão de projetos refere-se à adaptação de acordo com o contexto, que diz respeito

- a) ao pensamento sistêmico.
- b) à volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade (VUCA).
- c) ao método iterativo.
- d) ao tailoring.
- e) aos domínios de desempenho.

012. (CESPE/CEBRASPE/TJ-RJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANALISTA DE PROJETOS/2021) De acordo com o PMBOK 7, a definição de expectativas para datas, recursos e resultados esperados ao longo de várias iterações de um projeto é estabelecida pelo plano de

- a) engajamento das partes interessadas.
- b) gerenciamento de qualidade.
- c) gerenciamento do cronograma.
- d) controle de mudanças.
- e) liberação.

013. (CESPE/CEBRASPE/TJ-RJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANALISTA DE NEGÓCIOS/2021) De acordo com o PMBOK 7, o planejamento organizacional impacta os projetos, que são priorizados com base em riscos, em financiamentos e em outras considerações, a exemplo de projeto, programa e portfólio. A esse respeito, assinale a opção correta.

- a) Os portfólios são agrupados em um programa que engloba os projetos com objetivos estratégicos.
- b) Os projetos individuais estão sempre associados a programas que são gerenciados de forma coordenada para apoiar o portfólio.

- c) Portfólio refere-se a projetos, programas, carteiras subsidiárias e operações gerenciadas como um grupo para atingir os objetivos estratégicos.
- d) Portfólios, programas e projetos são interdependentes, não havendo relação direta entre eles.
- e) Projetos e portfólios são diretamente relacionados ao plano estratégico da organização por meio do seu programa.

014. (CEBRASPE/CESPE/DPE RO/ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA/ADMINISTRAÇÃO/2022)

No estudo a respeito da gestão de projetos, é importante conhecer as diferenças entre projetos e processos.

Nesse contexto, é correto considerar como atividade associada a projetos

I – a construção de um novo aeroporto.

II – o levantamento de requisitos para um website.

III – a operação de uma usina nuclear.

IV – a construção de um submarino.

V – o fornecimento de energia elétrica por meio de produção fotovoltaica.

Estão certos apenas os itens

- a) II e V.
- b) III e IV.
- c) I, II e IV.
- d) I, II, III e V.
- e) I, III, IV e V.

015. (CEBRASPE/CESPE/IBAMA/ANALISTA ADMINISTRATIVO/2022) Julgue o item seguinte, que se refere à administração geral.

Os métodos ágeis na gestão de projetos referem-se à capacidade de responder às mudanças que ocorrem durante o desenvolvimento dos projetos.

016. (CEBRASPE/CESPE/FUNPESP-EXE/ANALISTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR/TECNOLOGIA/2022) A respeito do gerenciamento de projetos de TI, julgue o item subsequente, tendo como referência o PMBOK.

Um projeto deve ter início, meio e fim, não podendo configurar um processo contínuo.

017. (IDIB/CREMEPE/ANALISTA SUPERIOR/ADMINISTRADOR/2021) Estão entre as principais características definidoras do entendimento contemporâneo sobre projeto

- a) ser algo temporário e resultar em algo exclusivo.
- b) ser contínuo e cíclico.
- c) possuir início, meio e fim bem estabelecidos e foco em governança.
- d) ser cíclico e focado no cliente.

018. (CESPE/EMAP/ESPECIALISTA PORTUÁRIO/ENGENHARIA CIVIL/2018) Julgue o item subsequente, relativo à gestão de projetos e às ferramentas computacionais atualmente disponíveis para auxiliar e facilitar o gerenciamento das rotinas de trabalho.

A estrutura analítica de projeto (EAP) é uma representação visual da estrutura do projeto, na qual se apresentam, de forma hierárquica, todas as entregas, subdividindo-se os produtos e o trabalho em componentes, para facilitar o gerenciamento das atividades do projeto.

019. (CESPE/PGE-PE/ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PROCURADORIA/2019/ADAPTADA) A respeito da elaboração de projeto e do termo de abertura de projeto, julgue o item a seguir. O termo de abertura do Projeto é o documento em que consta a autorização para a realização do projeto.

020. (CESPE/PGE-PE/ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PROCURADORIA/2019/ADAPTADA) A respeito da elaboração de projeto e do termo de abertura de projeto, julgue o item a seguir. Em regra, o termo de abertura do projeto apresenta um detalhamento dos produtos entregáveis, isto é, que serão entregues pelo projeto.

021. (CESPE/PGE-PE/ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PROCURADORIA/2019/ADAPTADA) A respeito da elaboração de projeto e do termo de abertura de projeto, julgue o item a seguir. A estrutura analítica do projeto (EAP) deve estar descrita no termo de abertura do projeto.

022. (INÉDITA/2025) A respeito de artefatos de estratégia do PMBOK7, julgue o item a seguir. O business case é uma proposta de valor de um projeto apresentado.

023. (INÉDITA/2025) Com relação ao PMBOK 7, julgue o item subsequente. Ao comprimir o cronograma, é importante determinar a natureza das dependências entre as atividades.

024. (INÉDITA/2025) Com relação ao PMBOK 7, julgue o item subsequente. As **estimativas absolutas** são informações específicas e usam números reais.

025. (FCC/ALESE/ANALISTA LEGISLATIVO/ADMINISTRAÇÃO/2018) Algumas características são fundamentais para diferenciar uma atividade ordinária desempenhada no âmbito organizacional, de outra caracterizada como um projeto, entre elas a

- a) valoração, com a fixação de indicadores mensuráveis.
- b) amplitude, englobando todos os setores da organização.
- c) prioridade, não cabendo, uma vez iniciada, a suspensão.
- d) complexidade, pressupondo o envolvimento de especialistas externos.
- e) temporalidade, com início e fim definidos.

026. (CESPE/EMAP/ESPECIALISTA PORTUÁRIO/ENGENHARIA CIVIL/2018) Julgue o item subsequente, relativo à gestão de projetos e às ferramentas computacionais atualmente disponíveis para auxiliar e facilitar o gerenciamento das rotinas de trabalho.

A estrutura analítica de projeto (EAP) é uma representação visual da estrutura do projeto, na qual se apresentam, de forma hierárquica, todas as entregas, subdividindo-se os produtos e o trabalho em componentes, para facilitar o gerenciamento das atividades do projeto.

027. (FCC/TRT 3ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/INFORMÁTICA/2014) É um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um término definidos. O término é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir que esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o projeto for encerrado, ou quando o mesmo não for mais necessário.

De acordo com o PMBOK, o texto acima é definição de

- a) estimativa.
- b) serviço.
- c) planejamento.
- d) projeto.
- e) processo.

028. (CESGRANRIO/BNDES/ANALISTA DE SUPORTE/2008) Segundo o PMBOK, NÃO é característica de um projeto:

- a) possuir início e fim definidos.
- b) desenvolver-se em etapas e continuar por incrementos.
- c) ser contínuo e repetitivo.
- d) criar serviços únicos.
- e) criar produtos únicos.

029. (ESAF/SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/DESENVOLVIMENTO SIST. INFORMAÇÃO/2008) O conjunto de atividades necessárias à criação de um serviço exclusivo, até uma data limite, representa

- a) uma implementação
- b) uma operação
- c) um programa
- d) um projeto
- e) uma instrução

030. (INÉDITA/2025) Os projetos são frequentemente utilizados como forma de atingir o plano estratégico de uma organização.

031. (CESPE/ABIN/ANALISTA DE SUPORTE/2010) O item subsequente é relativo aos elementos funcionais e estruturais que constituem a gerência de projetos e o modelo proposto pelo Project Management Institute (PMI).

Ao se criar uma EAP, realiza-se a subdivisão das principais entregas do projeto e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.

032. (CESPE/SERPRO/ANALISTA/2005) Analise a afirmativa a seguir: operações são empreendimentos temporários que têm por fim produzir um resultado único dentro de restrições de tempo e custo. Projetos diferem de operações principalmente no que se refere ao caráter repetitivo dos resultados produzidos e à inexistência de um prazo de encerramento.

033. (INÉDITA/2025) Julgue o item subsequente, relativo ao PMBOK 7.
Dependendo da organização, em geral, cada projeto tem um patrocinador.

034. (INÉDITA/2025) No contexto do Guia PMBOK® – Sétima Edição, o escritório de gerenciamento de projeto (EGP) representa uma estrutura de gerenciamento que padroniza os processos de governança relacionados ao projeto e facilita o compartilhamento de recursos, ferramentas, metodologias e técnicas.

035. (INÉDITA/2025) Julgue o item subsequente, relativo ao PMBOK 7.
Estrutura analítica de produto é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar as entregas exigidas.

036. (INÉDITA/2025) Na abordagem de desenvolvimento iterativa o escopo, o tempo e o custo do projeto são determinados nas fases iniciais do ciclo de vida.

037. (INÉDITA/2025) Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para cumprir os requisitos definidos.

GABARITO

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. a | 35. E |
| 2. b | 36. E |
| 3. E | 37. C |
| 4. E | |
| 5. c | |
| 6. d | |
| 7. E | |
| 8. C | |
| 9. C | |
| 10. b | |
| 11. d | |
| 12. e | |
| 13. c | |
| 14. c | |
| 15. C | |
| 16. C | |
| 17. a | |
| 18. C | |
| 19. C | |
| 20. E | |
| 21. E | |
| 22. C | |
| 23. C | |
| 24. C | |
| 25. e | |
| 26. C | |
| 27. d | |
| 28. c | |
| 29. d | |
| 30. C | |
| 31. C | |
| 32. E | |
| 33. C | |
| 34. C | |


GABARITO COMENTADO

007. (CESP/CEBRASPE/MPO/ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/2024) Julgue o item a seguir, relativos ao gerenciamento de projetos.

Os domínios de desempenho de projetos — partes interessadas, equipe, abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida, planejamento, trabalho do projeto, entrega, medição e incerteza — são independentes entre si, podendo ser tratados de forma isolada durante a execução do projeto.



Oito domínios de desempenho de projetos

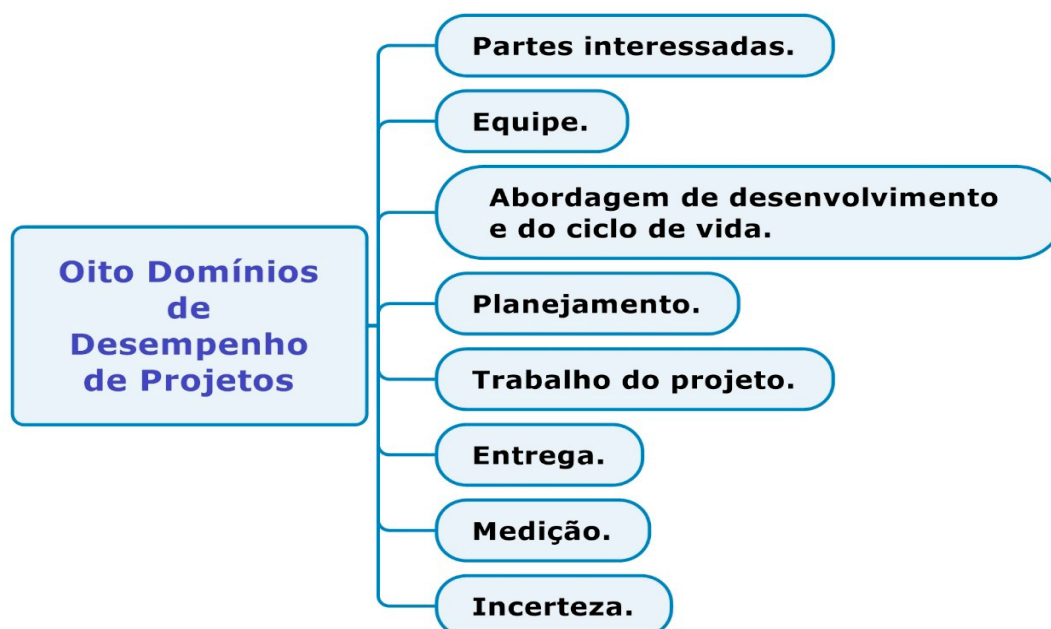

Fonte: Elaboração própria (2025).

No contexto do gerenciamento de projetos, conforme descrito no PMBOK 7ª edição, os domínios de desempenho de projetos, tais como partes interessadas, equipe, abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida, planejamento, trabalho do projeto, entrega, medição e incerteza, **não** são independentes entre si. Pelo contrário, **esses domínios são altamente interrelacionados e interdependentes**.

Razões para a Interdependência:

- partes interessadas e equipe: a gestão eficaz das partes interessadas requer uma equipe bem coordenada que possa abordar e resolver questões de interesse dos *stakeholders*;

- abordagem de desenvolvimento e Ciclo de Vida: a escolha da metodologia ou abordagem de desenvolvimento (como Ágil, Cascata etc.) influencia diretamente o ciclo de vida do projeto, afetando todas as suas fases;
- planejamento e trabalho do projeto: o planejamento define os requisitos e restrições do trabalho do projeto, integrando essas informações com os recursos e cronogramas;
- entrega e medição: a capacidade de entregar resultados está diretamente ligada à capacidade de medir e avaliar o progresso face aos objetivos definidos, indicando desempenhos tangíveis e resultados;
- incerteza: deve ser gerida através da antecipação e mitigação, envolvendo todos os outros domínios.

Portanto, tratar qualquer um desses domínios de forma isolada pode **enfraquecer a capacidade de gerenciar um projeto de forma eficaz**, já que **o sucesso em um geralmente depende do alinhamento e coordenação com os outros**. A complexidade de entregar um projeto com sucesso exige uma visão integrada e holística de todos esses domínios.

Errado.

008. (CESPE/CEBRASPE/MPO/ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/2024) Julgue o item a seguir, relativos ao gerenciamento de projetos.

As demandas e tendências atuais do gerenciamento de projetos ocasionaram as seguintes mudanças: a transição de um padrão embasado em processos para um padrão embasado em princípios; a adoção de uma visão de sistemas de gerenciamento de projetos; o reconhecimento da relevância contínua do Guia PMBOK®; e a necessidade de um profissional com perfil menos descritivo e mais pautado em princípios



A afirmação traz uma análise acertada das mudanças contemporâneas no gerenciamento de projetos, conforme refletido no PMBOK 7ª edição. Vamos examinar cada aspecto mencionado:

1. Transição de um padrão embasado em processos para um padrão embasado em princípios:

- A 7ª edição do PMBOK evolui para um **padrão baseado em princípios** a fim de apoiar o gerenciamento de projetos de forma mais eficiente e focar mais nos resultados pretendidos, em vez de em entregas;
- O PMBOK 7 enfatiza princípios ao invés de estritamente processos e práticas, permitindo uma maior flexibilidade e adaptabilidade nos projetos;
- No entanto, **não descarta o alinhamento com a abordagem baseada em processos de edições anteriores**. Várias organizações e profissionais ainda consideram essa abordagem valiosa para guiar seus recursos de gerenciamento de projetos, alinhar

metodologias e avaliar capacidades nessa área. Dessa forma, a abordagem baseada em processos contínua sendo pertinente no contexto da nova edição.

2. Adoção de uma visão de sistemas de gerenciamento de projetos:

- Esta abordagem holística permite a consideração das interações entre diferentes partes de um projeto e como elas contribuem para os objetivos gerais.

3. Reconhecimento da relevância contínua do Guia PMBOK®:

- Embora as edições e abordagens evoluam, o PMBOK continua a ser uma referência essencial para profissionais de gerenciamento de projetos em todo o mundo, proporcionando diretrizes cruciais e atualizadas.

4. Necessidade de um profissional com perfil menos descritivo e mais pautado em princípios:

- Reflete a dificuldade crescente que exige líderes de projeto flexíveis e adaptáveis, concentrados na aplicação de princípios ao invés de seguirem roteiros fixos.

Portanto, a sentença está em consonância com as tendências atuais de gerenciamento de projetos, conforme observado no PMBOK 7, que promove princípios amplamente aplicáveis, proporcionando uma base sólida para adaptar estratégias e práticas às necessidades dinâmicas dos projetos.

Certo.

009. (CEBRASPE/CESPE/MPO/ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Com relação ao arcabouço de gerenciamento de projetos, julgue o item que se segue.

Envolvimento das partes interessadas, ambiente colaborativo, enfoque no valor e tailoring são alguns dos princípios do gerenciamento de projetos segundo o PMBOK7.



De acordo com a 7ª edição do PMBOK, os princípios que orientam o gerenciamento de projetos refletem conceitos como o envolvimento dos *stakeholders* (partes interessadas), um enfoque no valor entregue, a promoção de um ambiente colaborativo e o conceito de *tailoring*, que envolve a adaptação de abordagens, processos e ferramentas ao contexto específico do projeto.

- **Envolvimento das partes interessadas** (*stakeholder engagement*) é um princípio importante, pois trata da compreensão e manejo das expectativas e necessidades das partes envolvidas. O engajamento das partes interessadas deve ser proativo e na medida necessária que possa contribuir para o sucesso do projeto e a satisfação do cliente;

- **Ambiente colaborativo** relacionado à liderança colaborativa, que promove a colaboração eficaz entre os membros da equipe e com *stakeholders*. As equipes de projeto são formadas por pessoas com diversas habilidades, conhecimentos e experiências. As equipes de projeto que trabalham de modo colaborativo podem cumprir um objetivo compartilhado da maneira **mais eficaz e eficiente** do que os indivíduos que trabalham por conta própria;
- **Enfoque no valor** é crucial, pois prioriza a entrega de valor para a organização e os *stakeholders* ao longo do projeto. Avalie e ajuste continuamente o alinhamento do projeto aos objetivos do negócio e aos benefícios e valor pretendidos;
- **Tailoring** é um conceito do PMBOK 7, que enfatiza a adaptação de práticas e técnicas ao contexto do projeto, maximizando a relevância e a eficiência. Trata-se da adaptação deliberada da abordagem, governança e dos processos para torná-los mais adequados para o ambiente determinado e o trabalho em questão.

Certo.

010. (CESPE/CEBRASPE/ITAIPU/PROFISSIONAL NÍVEL UNIVERSITÁRIO JÚNIOR/2024) Julgue os itens a seguir, tendo como referência o sistema de entrega de valor apresentado no Guia PMBOK, 7ª edição.

I – Os sistemas de governança fornecem uma estrutura integrada para avaliar mudanças e riscos associados aos componentes de um sistema de entrega de valor.

II – Para garantir a integridade de um sistema de governança, as operações de projetos estão restritas a programas ou portfólios.

III – Os componentes de um sistema de entrega de valor produzem resultados que criam benefícios percebidos pela organização; esses benefícios criam valor, ou seja, a vantagem, a importância ou a utilidade de algo.

IV – A coordenação centralizada se baseia na orientação e liderança de um gerente de projeto designado e não admite que equipes de projeto auto-organizadas atuem em partes do trabalho do projeto.

Assinale a opção correta.

- Apenas os itens I e II estão certos.
- Apenas os itens I e III estão certos.
- Apenas os itens I e IV estão certos.
- Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- Todos os itens estão certos.




Vamos então avaliar cada uma das afirmativas com base nas diretrizes apresentadas no PMBOK, 7ª edição:

I – Certo. Os sistemas de governança fornecem uma estrutura **integrada** para avaliar mudanças, questões e riscos associados ao meio ambiente e a qualquer componente do sistema de entrega de valor. Isso inclui objetivos do portfólio, benefícios do programa e resultados produzidos por projetos.

II – Errado. Embora a governança de projetos frequentemente ocorra dentro do contexto de programas ou portfólios, as operações de projetos não estão estritamente restritas a esses níveis e o sistema de governança não limita necessariamente projetos a tais estruturas. As operações podem apoiar e influenciar diretamente portfólios, programas e projetos, e também outras funções de negócios.

III – Certo. Esse item descreve precisamente o conceito de como os componentes do sistema de entrega de valor contribuem para a criação de valor organizacional, que é uma parte central do guia PMBOK 7ª edição. Os componentes de um sistema de entrega de valor criam itens para entrega usados para produzir resultados. Um resultado é a consequência ou o resultado final de um processo ou projeto. O foco nos resultados, escolhas e decisões destaca o desempenho de longo prazo do projeto. Os resultados criam benefícios, que são os ganhos percebidos pela organização. Por sua vez, os benefícios criam valor, ou seja, a vantagem, a importância ou a utilidade de algo.

Componentes de um exemplo de sistema de entrega de valor

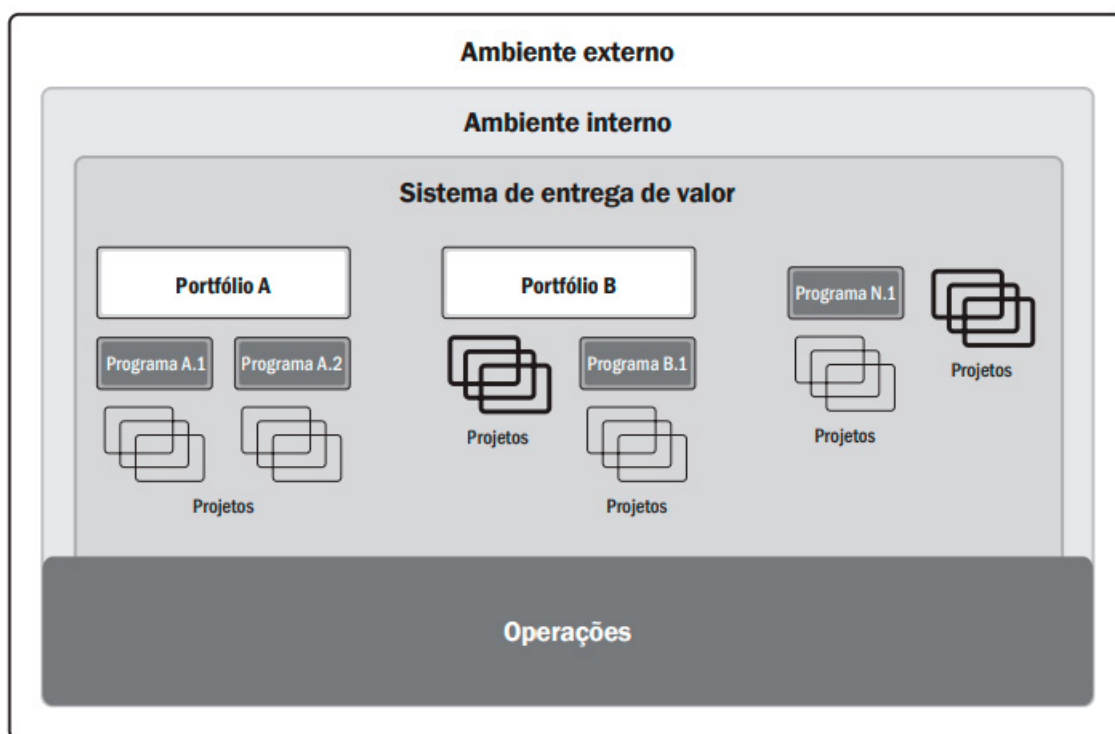

Fonte: PMBOK 7 (2021).

IV – Errado. Embora a coordenação centralizada enfoque na liderança de um gerente de projeto designado, o PMBOK 7ª edição reconhece a flexibilidade e agilidade organizacional, em que equipes auto-organizadas podem ser valiosas, especialmente em abordagens ágeis. Com base nas análises acima, a opção correta é: **b) Apenas os itens I e III estão certos.**

Letra b.

011. (VUNESP/ESFCEX/CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR/2023)

A 7ª edição do Guia PMBoK traz inovações significativas com relação às seis edições anteriores, visando manter sua relevância frente às complexidades sociais.

Entre essas inovações, um dos conceitos que ganha destaque na gestão de projetos refere-se à adaptação de acordo com o contexto, que diz respeito

- a) ao pensamento sistêmico.
- b) à volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade (VUCA).
- c) ao método iterativo.
- d) ao tailoring.
- e) aos domínios de desempenho.



Na 7ª edição do Guia PMBOK, um dos conceitos que ganha destaque na gestão de projetos é a **adaptação de acordo com o contexto**, que se refere ao **tailoring**.

Tailoring é o **processo de adaptar práticas, metodologias e abordagens ao contexto específico do projeto**. Essa personalização considera fatores como o ambiente do projeto, as necessidades da equipe e dos *stakeholders* etc., para garantir que o gerenciamento do projeto seja mais eficaz e atenda melhor aos seus objetivos.

Assim, a opção correta é **“d) ao tailoring”**, que reflete a ênfase na adaptação dos procedimentos de gerenciamento de acordo com as particularidades e requisitos do projeto no PMBOK 7ª edição.


Tailoring é a adaptação deliberada da abordagem, governança e dos processos para torná-los mais adequados para o ambiente determinado e o trabalho em questão.

O tailoring envolve conhecer o contexto, as metas e o ambiente operacional do projeto.

Vejamos a seguir alguns detalhes do **processo de tailoring**, que envolve quatro etapas:

- selecionar a abordagem inicial;
- realizar o *tailoring* da organização;
- realizar o *tailoring* do projeto;
- implementar melhorias contínuas.

Detalhes das etapas do processo de tailoring (PMBOK 7)

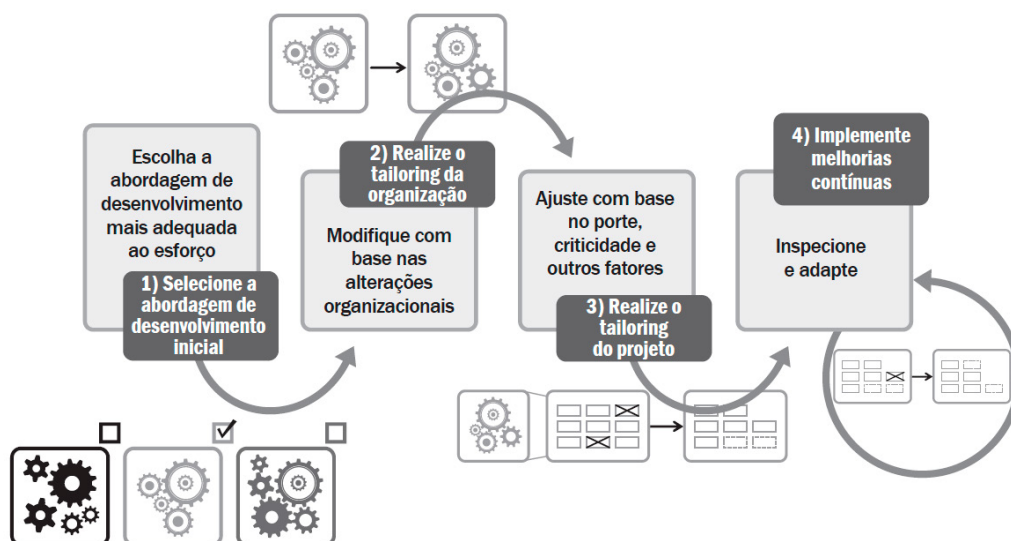

Letra d.

012. (CESPE/CEBRASPE/TJ-RJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANALISTA DE PROJETOS/2021) De acordo com o PMBOK 7, a definição de expectativas para datas, recursos e resultados esperados ao longo de várias iterações de um projeto é estabelecida pelo plano de

- a) engajamento das partes interessadas.
- b) gerenciamento de qualidade.
- c) gerenciamento do cronograma.
- d) controle de mudanças.
- e) liberação.



O **Plano de Liberação (Release plan)** define as expectativas de datas, características e/ou resultados que devem ser entregues ao longo de várias iterações.

Letra e.

013. (CESPE/CEBRASPE/TJ-RJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANALISTA DE NEGÓCIOS/2021) De acordo com o PMBOK 7, o planejamento organizacional impacta os projetos, que são priorizados com base em riscos, em financiamentos e em outras considerações, a exemplo de projeto, programa e portfólio. A esse respeito, assinale a opção correta.

- a) Os portfólios são agrupados em um programa que engloba os projetos com objetivos estratégicos.
- b) Os projetos individuais estão sempre associados a programas que são gerenciados de forma coordenada para apoiar o portfólio.

- c) Portfólio refere-se a projetos, programas, carteiras subsidiárias e operações gerenciadas como um grupo para atingir os objetivos estratégicos.
- d) Portfólios, programas e projetos são interdependentes, não havendo relação direta entre eles.
- e) Projetos e portfólios são diretamente relacionados ao plano estratégico da organização por meio do seu programa.



Veja o que destaca o PMBOK 7 sobre o termo **Portfólio**: refere-se a **projetos, programas, subportfólios e operações gerenciadas em grupo para alcançar objetivos estratégicos**.

- **Programa**: é um grupo relacionado de projetos, subprogramas e atividades de programa gerenciados de forma coordenada para a obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente;
- **Projeto**: é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único.

Letra c.

014. (CEBRASPE/CESPE/DPE RO/ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA/ADMINISTRAÇÃO/2022)

No estudo a respeito da gestão de projetos, é importante conhecer as diferenças entre projetos e processos.

Nesse contexto, é correto considerar como atividade associada a projetos

I – a construção de um novo aeroporto.

II – o levantamento de requisitos para um website.

III – a operação de uma usina nuclear.

IV – a construção de um submarino.

V – o fornecimento de energia elétrica por meio de produção fotovoltaica.

Estão certos apenas os itens

- a) II e V.
- b) III e IV.
- c) I, II e IV.
- d) I, II, III e V.
- e) I, III, IV e V.



Quando uma empresa **faz sempre as mesmas tarefas** (como em uma linha de montagem de automóveis populares, a operação de uma usina nuclear, o fornecimento de energia elétrica por meio de produção fotovoltaica) ela está realizando **processos**.

Quando uma empresa faz sempre **trabalhos diferentes, de acordo com cada pedido** (imagine uma empresa que tenha como atividade montar palco de *shows*, realizar a construção de um aeroporto ou levantar requisitos para um website) ela trabalha com **projetos**.

Segundo o PMBOK 7 (2021), **projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único**. Desse modo, **podemos estabelecer que os projetos geram produtos ÚNICOS e que, ao final do projeto a atividade da empresa acaba e ela parte para outro projeto, ou seja, vai fazer outro produto**. Nesse contexto, é correto considerar como atividade associada a projetos:

- I – a construção de um novo aeroporto;
- II – o levantamento de requisitos para um website;
- IV – a construção de um submarino.

Assim, **estão certos apenas os itens: I, II e IV**. A letra C é a resposta!

Letra c.

015. (CEBRASPE/CESPE/IBAMA/ANALISTA ADMINISTRATIVO/2022) Julgue o item seguinte, que se refere à administração geral.

Os métodos ágeis na gestão de projetos referem-se à capacidade de responder às mudanças que ocorrem durante o desenvolvimento dos projetos.



O uso de métodos ágeis na gestão de projetos possibilita maior agilidade, interação e entregas com prazos curtos, contribuindo para responder às diversas mudanças que ocorrem durante o desenvolvimento dos projetos.

Certo.


016. (CEBRASPE/CESPE/FUNPRES-P-EXE/ANALISTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR/TECNOLOGIA/2022) A respeito do gerenciamento de projetos de TI, julgue o item subsequente, tendo como referência o PMBOK.

Um projeto deve ter início, meio e fim, não podendo configurar um processo contínuo.



O guia PMBOK define **projeto** como sendo um **esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo**.

Segundo o Project Management Institute (PMI), um projeto tem um **objetivo bem definido**, um resultado ou um produto esperado, e é feito por meio de uma série de tarefas **independentes**, isto é, **não** repetitivas.

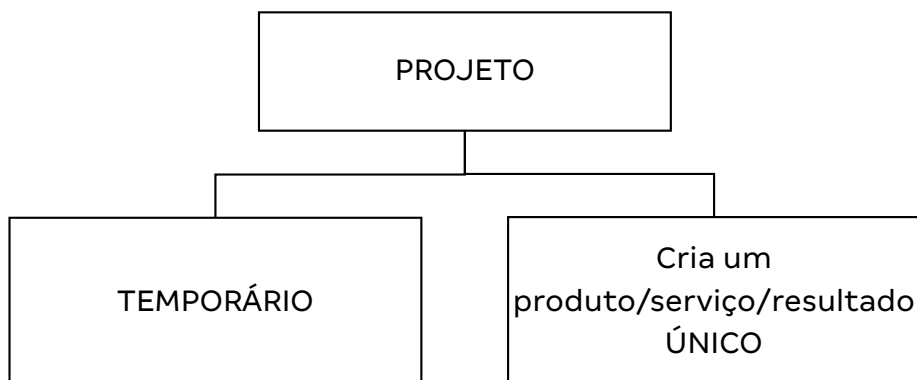

Fonte: Elaboração própria.

O projeto possui uma vida finita, isso indica que tem **um início e um término definidos**. O término é alcançado quando os objetivos do projeto são atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixar de existir.

Certo.

017. (IDIB/CREMEPE/ANALISTA SUPERIOR/ADMINISTRADOR/2021) Estão entre as principais características definidoras do entendimento contemporâneo sobre projeto

- a) ser algo temporário e resultar em algo exclusivo.
- b) ser contínuo e cíclico.
- c) possuir início, meio e fim bem estabelecidos e foco em governança.
- d) ser cíclico e focado no cliente.



O guia PMBOK define **projeto** como sendo um **esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo**.

Um projeto deve ter **início, meio e fim**, **não** podendo configurar um processo contínuo e cíclico. Assim, temos:

- a) Certa. **Ser algo temporário e resultar em algo exclusivo.**
- b) Errada. **Ser contínuo e cíclico.**
- c) Errada. Possuir início, meio e fim bem estabelecidos e **foco em governança.**
- d) Errada. **Ser cíclico e focado no cliente.**

Conforme visto, a letra A é a resposta!

Letra a.

018. (CESPE/EMAP/ESPECIALISTA PORTUÁRIO/ENGENHARIA CIVIL/2018) Julgue o item subsequente, relativo à gestão de projetos e às ferramentas computacionais atualmente disponíveis para auxiliar e facilitar o gerenciamento das rotinas de trabalho.

A estrutura analítica de projeto (EAP) é uma representação visual da estrutura do projeto, na qual se apresentam, de forma hierárquica, todas as entregas, subdividindo-se os produtos e o trabalho em componentes, para facilitar o gerenciamento das atividades do projeto.



A **WBS (Work Breakdown Structure)**, também conhecida como **estrutura analítica do projeto (EAP)**, é a decomposição **hierárquica** orientada à **entrega do trabalho**.

Pode ser entendida como a subdivisão das entregas e do trabalho a ser executado pela equipe envolvida no projeto, até sua menor divisão, denominada “pacotes de trabalho”.

Os componentes que formam a EAP auxiliam as partes interessadas em visualizar e comunicar as entregas do projeto. Ao definir o produto pode-se monitorar e controlar o trabalho planejado contido nos componentes de nível mais baixo da EAP, denominados **pacotes de trabalho** (*work packages*).

A EAP auxilia também a retornar, ou melhor, a redefinir o escopo, ou seja, a estabelecer quais são as atividades que, quando ordenadas, podem ser agendadas. Inclui aqui também a determinação de quais recursos materiais e humanos serão necessários, portanto, a estimativa de custos e quais são as áreas críticas de qualidade e os riscos envolvidos.

Ao construir uma EAP deve-se ter em mente o produto a ser entregue, o que é requerido e necessário a ser providenciado, quais são os componentes que contribuem para caracterizar o final do projeto. Um produto de um projeto é qualquer resultado ou item, mensurável, tangível ou um efeito verificável, que deve ser originado como parte do projeto. O requerido e necessário é “o que” será entregue ao longo da vida do projeto. Os componentes caracterizam subdivisões dos produtos principais a serem entregues.

Em resumo, é a mais importante ferramenta de planejamento, é o insumo fundamental para a resposta de todas as perguntas que temos de responder para o planejamento, facilita a definição de responsabilidades e estabelece a base de referência para controle.

Certo.

019. (CESPE/PGE-PE/ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PROCURADORIA/2019/ADAPTADA) A respeito da elaboração de projeto e do termo de abertura de projeto, julgue o item a seguir. O termo de abertura do Projeto é o documento em que consta a autorização para a realização do projeto.



O **Termo de Abertura do Projeto** permite que se tenha limites de projeto bem definidos, **a criação de um registro formal do projeto**, e uma maneira direta da direção executiva aceitar e se comprometer formalmente com o projeto. Esse termo **dá ao gerente do**

projeto a autoridade necessária para planejar e executar o projeto, aplicando recursos organizacionais às atividades do projeto.

Segundo PMBOK7(2021) o **Termo de Abertura do Projeto** é o documento que autoriza formalmente a existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto.

Certo.

020. (CESPE/PGE-PE/ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PROCURADORIA/2019/ADAPTADA) A respeito da elaboração de projeto e do termo de abertura de projeto, julgue o item a seguir. Em regra, o termo de abertura do projeto apresenta um detalhamento dos produtos entregáveis, isto é, que serão entregues pelo projeto.



A **estrutura analítica de projeto (EAP)** é uma representação visual da estrutura do projeto, **na qual se apresentam, de forma hierárquica, todas as entregas**, subdividindo-se os produtos e o trabalho em componentes, para facilitar o gerenciamento das atividades do projeto. Assim, conforme visto, é a **estrutura analítica de projeto (EAP)** que demonstra os produtos entregáveis e não o termo de abertura.

O **Termo de Abertura do Projeto** permite que se tenha limites de projeto bem definidos, **a criação de um registro formal do projeto**, e uma maneira direta da direção executiva aceitar e se comprometer formalmente com o projeto. Esse termo dá ao gerente do projeto a autoridade necessária para **planejar e executar o projeto**, aplicando recursos organizacionais às atividades do projeto.

Errado.

021. (CESPE/PGE-PE/ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PROCURADORIA/2019/ADAPTADA) A respeito da elaboração de projeto e do termo de abertura de projeto, julgue o item a seguir. A estrutura analítica do projeto (EAP) deve estar descrita no termo de abertura do projeto.



O **termo de abertura do projeto** é o documento que autoriza formalmente a existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto (PMBOK7,2021).

A **estrutura analítica de projeto (EAP)** é uma representação visual da estrutura do projeto, **na qual se apresentam, de forma hierárquica, todas as entregas**, subdividindo-se os produtos e o trabalho em componentes, para facilitar o gerenciamento das atividades do projeto.

A **estrutura analítica de projeto (EAP)** não é definida no termo de abertura do projeto.

Errado.

022. (INÉDITA/2025) A respeito de artefatos de estratégia do PMBOK7, julgue o item a seguir.
O business case é uma proposta de valor de um projeto apresentado.



O **business case** é uma proposta de valor de um projeto apresentado, que pode incluir benefícios financeiros e não financeiros.

Segundo PMBOK 7, um documento de *business case* geralmente fornece a justificativa de negócios e uma projeção do valor de negócio previsto de um projeto. O formato deste *business case* varia com base na abordagem de desenvolvimento e no ciclo de vida escolhido. Os exemplos incluem documentos de *business case* com estimativas detalhadas de retorno sobre o investimento ou um *startup canvas* enxuto (*lean*), que descreve elementos de alto nível como problema, solução, fluxos de receita e estruturas de custo. Esses documentos de negócios demonstram como os resultados do projeto se alinham aos objetivos de negócio da organização.

Certo.

023. (INÉDITA/2025) Com relação ao PMBOK 7, julgue o item subsequente.
Ao comprimir o cronograma, é importante determinar a natureza das dependências entre as atividades.



Ao comprimir o **cronograma**, é importante determinar a natureza das **dependências** entre as atividades. Algumas atividades não podem ser colocadas em paralelismo devido à natureza do trabalho, outras podem.

Os **quatro tipos de dependências** são:

Dependência obrigatória	Uma relação contratualmente exigida ou inerente à natureza do trabalho. Este tipo de dependência geralmente não pode ser modificado.
Dependência arbitrada	Um relacionamento que se baseia nas práticas recomendadas ou nas preferências do projeto. Esse tipo de dependência pode ser modificável.
Dependência externa	Um relacionamento entre atividades de projeto e atividades “não projetadas”. Este tipo de dependência geralmente não pode ser modificado.
Dependência interna	Um relacionamento entre uma ou mais atividades do projeto. Esse tipo de dependência pode ser modificável.

Certo.

024. (INÉDITA/2025) Com relação ao PMBOK 7, julgue o item subsequente.

As **estimativas absolutas** são informações específicas e usam números reais.



As **estimativas absolutas** são informações específicas e usam números reais. Uma estimativa absoluta de esforço pode ser apresentada como 120 horas de trabalho. Uma pessoa trabalhando em tempo integral poderia realizar o trabalho em 15 dias úteis, considerando-se 8 horas de produtividade por dia útil.

Embora as estimativas absolutas sejam específicas, as **estimativas relativas** são mostradas em comparação com outras estimativas. As estimativas relativas só têm significado dentro de um determinado contexto.

Certo.

025. (FCC/ALESE/ANALISTA LEGISLATIVO/ADMINISTRAÇÃO/2018) Algumas características são fundamentais para diferenciar uma atividade ordinária desempenhada no âmbito organizacional, de outra caracterizada como um projeto, entre elas a

- a) valoração, com a fixação de indicadores mensuráveis.
- b) amplitude, englobando todos os setores da organização.
- c) prioridade, não cabendo, uma vez iniciada, a suspensão.
- d) complexidade, pressupondo o envolvimento de especialistas externos.
- e) temporalidade, com início e fim definidos.



Não são todas as atividades executadas no âmbito de uma estrutura organizacional que podem ser caracterizadas como um projeto. Algumas características são necessárias para que determinado esforço ou ação configure efetivamente um projeto, entre as quais, a: **temporalidade**, dado que todo o projeto tem um início e um fim definidos.

Um conceito interessante para projeto é o citado por Vargas (2003), que destaca o **projeto** como um **empreendimento ou evento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas, dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade**”.

- Evento **NÃO REPETITIVO**: algo que não faz parte da rotina da empresa. É algo novo para as pessoas que o realizarão. Exemplo: Filme “Tempos Modernos” de Charles Chaplin;
- **SEQUÊNCIA** clara e lógica de **EVENTOS**: é composto de atividades lógicas encadeadas que permitem acompanhamento e controle durante a execução;
- Com **INÍCIO, MEIO e FIM**: possuem um ciclo de vida bem definido (se for uma atividade sem um fim definido, não é um projeto, mas uma rotina de trabalho);

- Atingir um **OBJETIVO** claro e definido: possui metas e resultados a serem atingidos em sua finalização;
- Conduzido por **PESSOAS**: sem o homem não existe projeto;
- Parâmetros pré-definidos de **TEMPO, CUSTO, RECURSOS envolvidos e QUALIDADE**: são restrições de projeto que devem ser identificadas e mapeadas no decorrer do plano de projeto.

Letra e.

026. (CESPE/EMAP/ESPECIALISTA PORTUÁRIO/ENGENHARIA CIVIL/2018) Julgue o item subsequente, relativo à gestão de projetos e às ferramentas computacionais atualmente disponíveis para auxiliar e facilitar o gerenciamento das rotinas de trabalho.

A estrutura analítica de projeto (EAP) é uma representação visual da estrutura do projeto, na qual se apresentam, de forma hierárquica, todas as entregas, subdividindo-se os produtos e o trabalho em componentes, para facilitar o gerenciamento das atividades do projeto.



A **WBS (Work Breakdown Structure)**, também conhecida como **estrutura analítica do projeto (EAP)**, é a decomposição **hierárquica** orientada à **entrega do trabalho**.

Pode ser entendida como a subdivisão das entregas e do trabalho a ser executado pela equipe envolvida no projeto, até sua menor divisão, denominada “pacotes de trabalho”.

Os componentes que formam a EAP auxiliam as partes interessadas em visualizar e comunicar as entregas do projeto. Ao definir o produto pode-se monitorar e controlar o trabalho planejado contido nos componentes de nível mais baixo da EAP, denominados **pacotes de trabalho** (*work packages*).

A EAP auxilia também a retornar, ou melhor, a redefinir o escopo, ou seja, a estabelecer quais são as atividades que, quando ordenadas, podem ser agendadas. Inclui aqui também a determinação de quais recursos materiais e humanos serão necessários, portanto, a estimativa de custos e quais são as áreas críticas de qualidade e os riscos envolvidos.

Ao construir uma EAP deve-se ter em mente o produto a ser entregue, o que é requerido e necessário a ser providenciado, quais são os componentes que contribuem para caracterizar o final do projeto. Um produto de um projeto é qualquer resultado ou item, mensurável, tangível ou um efeito verificável, que deve ser originado como parte do projeto. O requerido e necessário é “o que” será entregue ao longo da vida do projeto. Os componentes caracterizam subdivisões dos produtos principais a serem entregues.

Em resumo, é a mais importante ferramenta de planejamento, é o insumo fundamental para a resposta de todas as perguntas que temos de responder para o planejamento, facilita a definição de responsabilidades e estabelece a base de referência para controle.

Certo.

027. (FCC/TRT 3ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/INFORMÁTICA/2014) É um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um término definidos. O término é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir que esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o projeto for encerrado, ou quando o mesmo não for mais necessário.

De acordo com o PMBOK, o texto acima é definição de

- a) estimativa.
- b) serviço.
- c) planejamento.
- d) projeto.
- e) processo.



De acordo com o PMBOK (7ª edição) um **PROJETO é um esforço temporário (possui um início e um final bem definidos) empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.**

- O fator **temporário** significa que todos os projetos **possuem um início e um final DEFINIDOS**. O término é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir que esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o projeto for encerrado, ou quando o mesmo não for mais necessário;
- Cada projeto cria um produto, serviço ou resultado **EXCLUSIVO**. Embora elementos repetitivos possam estar presentes em algumas entregas do projeto, essa repetição não muda a singularidade fundamental do trabalho do projeto. Como exemplo, prédios de escritórios são construídos com os materiais idênticos ou similares ou pela mesma equipe, mas cada um é exclusivo – com diferentes projetos, circunstâncias, fornecedores etc.

Importante! Um projeto gera um e somente um produto, serviço ou resultado!

Letra d.

028. (CESGRANRIO/BNDES/ANALISTA DE SUPORTE/2008) Segundo o PMBOK, NÃO é característica de um projeto:

- a) possuir início e fim definidos.
- b) desenvolver-se em etapas e continuar por incrementos.
- c) ser contínuo e repetitivo.
- d) criar serviços únicos.
- e) criar produtos únicos.



Conforme visto, um **projeto** é “um **empreendimento ou evento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade**”.

Sendo assim, trata-se de um evento **NÃO REPETITIVO** (algo que não faz parte da rotina da empresa), com **INÍCIO, MEIO e FIM** (possuem um ciclo de vida bem definido).

Letra c.

029. (ESAF/SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/DESENVOLVIMENTO SIST. INFORMAÇÃO/2008)

O conjunto de atividades necessárias à criação de um serviço exclusivo, até uma data limite, representa

- a) uma implementação
- b) uma operação
- c) um programa
- d) um projeto
- e) uma instrução



Observe como a definição de PROJETO, já destacada nesta aula, é MUITO COBRADA EM PROVA! **Projeto** é um esforço **temporário** empreendido para criar um **produto, serviço** ou **resultado exclusivo**.

Letra d.

030. (INÉDITA/2025) Os projetos são frequentemente utilizados como forma de atingir o plano estratégico de uma organização.



Conforme destaca PMBOK (2013), **os projetos são frequentemente utilizados como um meio de direta ou indiretamente alcançar os objetivos do plano estratégico de uma organização.**

Os projetos são normalmente autorizados como resultado de uma ou mais das seguintes considerações estratégicas:

- **Demanda de mercado** (por exemplo, uma companhia automobilística autoriza um projeto para a fabricação de carros energeticamente eficientes em resposta à escassez de gasolina);

- **Oportunidade/necessidade estratégica de negócios** (por exemplo, uma empresa de treinamento autoriza um projeto para criar um novo curso para aumentar sua receita);
- **Necessidade de natureza social** (por exemplo, uma organização não governamental de um país em desenvolvimento autoriza um projeto para fornecer sistemas de água potável, latrinas e educação sanitária às comunidades vítimas de altos índices de doenças contagiosas);
- **Consideração ambiental** (por exemplo, uma companhia de serviços públicos autoriza um projeto para criar um novo serviço de compartilhamento de carros elétricos para reduzir a poluição);
- **Solicitação de cliente** (por exemplo, uma companhia de energia elétrica autoriza um projeto de construção de uma nova subestação para atender a um novo parque industrial);
- **Avanço tecnológico** (por exemplo, uma empresa de produtos eletrônicos autoriza um novo projeto para desenvolver um laptop mais veloz, mais barato e menor em decorrência dos avanços em memória computacional e tecnologia eletrônica); e
- **Requisito legal** (por exemplo, um fabricante de produtos químicos autoriza um projeto para estabelecer diretrizes para o manuseio correto de um novo material tóxico).

Certo.

031. (CESPE/ABIN/ANALISTA DE SUPORTE/2010) O item subsequente é relativo aos elementos funcionais e estruturais que constituem a gestão de projetos e o modelo proposto pelo Project Management Institute (PMI).

Ao se criar uma EAP, realiza-se a subdivisão das principais entregas do projeto e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.



Perfeito, é justamente essa a funcionalidade de uma **EAP** (ou **WBS**, em inglês)!

Certo.

032. (CESPE/SERPRO/ANALISTA/2005) Analise a afirmativa a seguir: operações são empreendimentos temporários que têm por fim produzir um resultado único dentro de restrições de tempo e custo. Projetos diferem de operações principalmente no que se refere ao caráter repetitivo dos resultados produzidos e à inexistência de um prazo de encerramento.



Os conceitos estão **invertidos** no enunciado e a assertiva é **FALSA**!

- **Operação:** uma função organizacional que realiza a execução **CONTÍNUA** de atividades que produzem o mesmo produto ou fornecem um serviço repetitivo. **As operações são contínuas e repetitivas e mantêm a organização funcionando!** Exemplos: operações de produção, operações de fabricação e operações de contabilidade;
- **Projeto:** um esforço **TEMPORÁRIO** empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Exemplo: desenvolvimento de um novo modelo de veículo.

Um **projeto** é diferente de um trabalho operacional (**Operação**). E projetos podem resultar em novas operações.

Errado.

033. (INÉDITA/2025) Julgue o item subsequente, relativo ao PMBOK 7.

Dependendo da organização, em geral, cada projeto tem um patrocinador.



Isso mesmo! **Dependendo da organização, em geral, cada projeto tem um patrocinador.** PMBOK 7 destaca que o patrocinador do projeto atua como líder de decisões que estão fora da autoridade e do poder da posição do gerente e da equipe do projeto. O envolvimento e a supervisão ativos de um patrocinador do projeto apoiam o gerente do projeto, a equipe do projeto e, por fim, conduzem aos resultados do projeto. O patrocinador também vincula a equipe do projeto à estratégia e à visão geral no nível executivo da organização.

Certo.

034. (INÉDITA/2025) No contexto do Guia PMBOK® – Sétima Edição, o escritório de gerenciamento de projeto (EGP) representa uma estrutura de gerenciamento que padroniza os processos de governança relacionados ao projeto e facilita o compartilhamento de recursos, ferramentas, metodologias e técnicas.



Escritório de gerenciamento de projetos (EGP) ou Project Management Office (PMO) é uma estrutura de gerenciamento que padroniza os processos de governança relacionados com o projeto e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas.

Certo.

035. (INÉDITA/2025) Julgue o item subsequente, relativo ao PMBOK 7.

Estrutura analítica de produto é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar as entregas exigidas.



A **estrutura analítica de produto (Product Breakdown Structure)** é uma estrutura hierárquica que reflete os componentes e as entregas de um produto.

A **estrutura analítica do projeto (EAP) / Work Breakdown Structure (WBS)** é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar as entregas exigidas.

Errado.

036. (INÉDITA/2025) Na abordagem de desenvolvimento iterativa o escopo, o tempo e o custo do projeto são determinados nas fases iniciais do ciclo de vida.



A **abordagem de desenvolvimento iterativa** é focada em uma implementação inicial simplificada, e que segue pela elaboração progressiva com acréscimos ao conjunto de funcionalidades até que a entrega final esteja completa.

Na **abordagem de desenvolvimento preditiva** o escopo, o tempo e o custo do projeto são determinados nas fases iniciais do ciclo de vida.

Errado.

037. (INÉDITA/2025) Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para cumprir os requisitos definidos.



Gerenciamento de projetos é a **aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para cumprir os requisitos definidos**. Busca orientar o trabalho do projeto para entregar os resultados pretendidos. As equipes de projeto podem alcançar os resultados usando uma ampla gama de abordagens (como **preditiva, híbrida e adaptativa**).

Certo.

REFERÊNCIAS

EPP. *Curso de introdução ao gerenciamento de projetos*. Prodabel. 2014.

HELDMAN, K. *Gerência de projetos – Guia para o exame oficial do PMI*. 5. ed. 2009.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. (2007). *Manual de elaboração Plano Plurianual 2008-2011*. Brasília: MP.

MULCAHY'S, R. *Preparatório para o exame de PMP. Alinhado ao Guia PMBOK*. 5. ed. 2013.

NOCÊRA, R. de J. *Gerenciamento de projetos*. Teoria e prática. 2009.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. *Padrão de gerenciamento de projetos e guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK)*. 7. ed. 2021.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. *Guia PMBOK®: Um guia para o conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos*. 6. ed. Pennsylvania: PMI, 2017.

VARGAS, R. V. *Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais competitivos*. Rio de Janeiro: Brasport, 2009.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

